


Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Ressourcennamen	Vorgang	Nachfolge	2. Qtl, 2025				3. Qtl, 2025			4. Qtl, 2025			1. Qtl, 2026			2. Qtl, 2026
								Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr
1	<b>UKD Haus 046 / DSA</b>																				
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					

15	<b>LP 8</b>	<b>138 Tag</b>	<b>Mit 10.09.25</b>	<b>Fre 27.03.26</b>				
16	Aufmaß vor Ort durch Firma	3 Tage	Mit 10.09.25	Fre 12.09.25	Bieter	13	17	
17	Metallbau Erstellung Werkplanung	10 Tage	Mon 15.09.25	Fre 26.09.25	Bieter	16	18	
18	Technische Klärung	10 Tage	Mon 29.09.25	Mon 13.10.25	Bieter;BuT;EIP	17	19	
19	Bestellzeiten	20 Tage	Die 14.10.25	Don 13.11.25	Bieter	18	20	
20	Montage an Innentüren für Bau mit ePZ	5 Tage?	Fre 14.11.25	Fre 21.11.25	Bieter	19	21	
21	Montage an Außentüren SR3	10 Tage	Mon 24.11.25	Fre 05.12.25	Bieter	20	22	
22	Montage an Flurtüren mit SR3	15 Tage	Mon 08.12.25	Fre 26.12.25	Bieter	21	23	
23	5.OG Montage an Innentüren ePZ	5 Tage	Mon 29.12.25	Fre 02.01.26	Bieter	22	24	
24	3.OG Montage an Innentüren ePZ	5 Tage	Mon 05.01.26	Fre 09.01.26	Bieter	23	25	
25	2.OG Montage an Innentüren ePZ	5 Tage	Mon 12.01.26	Fre 16.01.26	Bieter	24	26	
26	1.OG Montage an Innentüren ePZ	5 Tage	Mon 19.01.26	Fre 23.01.26	Bieter	25	27	
27	EG Montage an Innentüren ePZ	5 Tage	Mon 26.01.26	Fre 30.01.26	Bieter	26	28	
28	UG Montage an Innentüren ePZ	5 Tage	Mon 02.02.26	Fre 06.02.26	Bieter	27	29	
29	Aufzüge mit SR3	5 Tage	Mon 09.02.26	Fre 13.02.26	Bieter	28	30	
30	4.OG Montage an Innentüren ePZ	5 Tage	Mon 16.02.26	Fre 20.02.26	Bieter	29	32	
31								
32	Programmierung IBN	10 Tage	Mon 23.02.26	Fre 06.03.26		30	33	
33	Übergabe, Abnahmen Dokumentation	15 Tage	Mon 09.03.26	Fre 27.03.26		32		

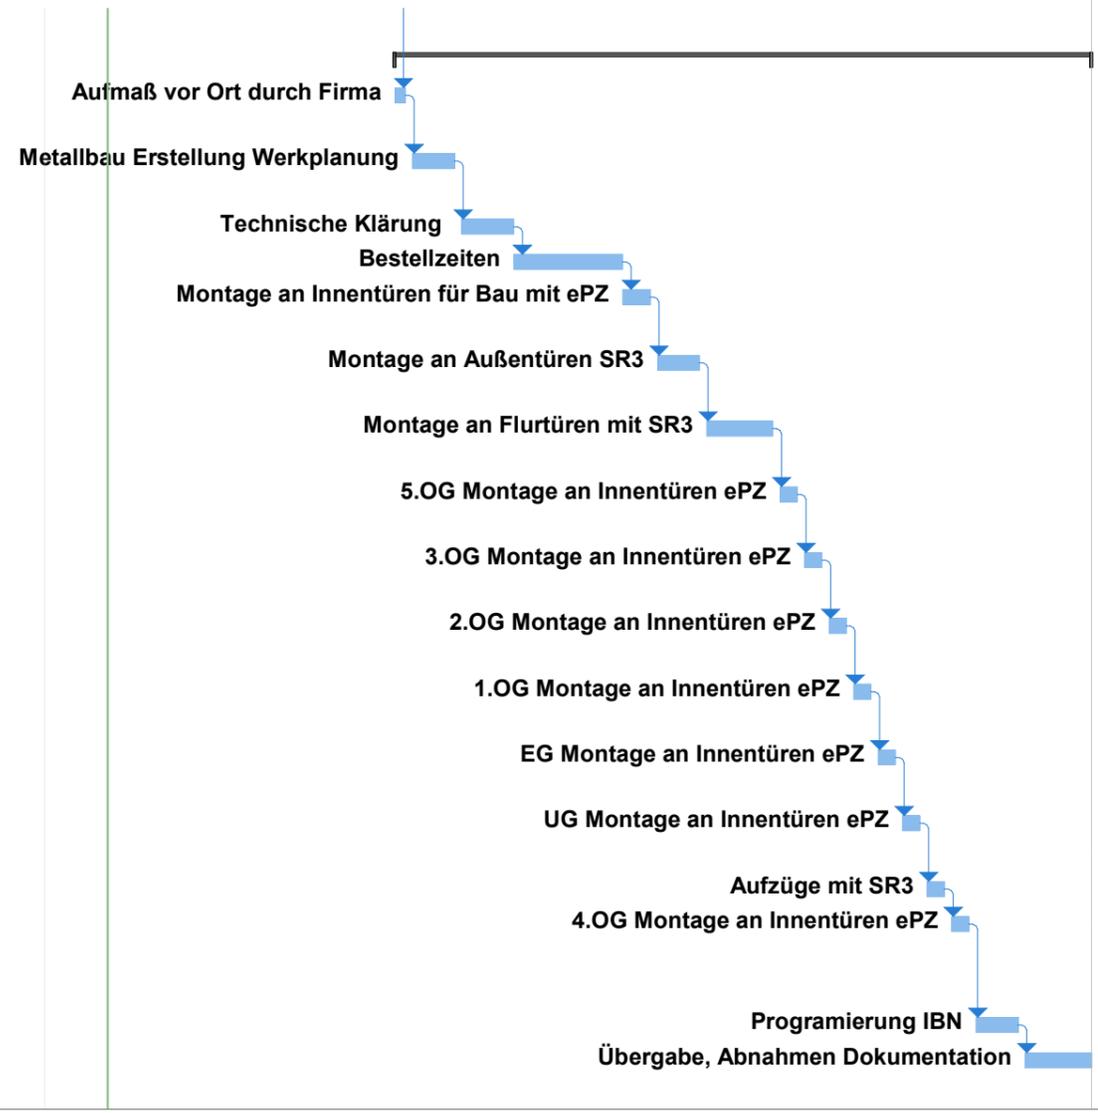

Projekt: msproj11 Datum: Fre 20.06.25	Vorgang		Projektsammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Stichtag	
	Unterbrechung		Externe Vorgänge		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		In Arbeit	
	Meilenstein		Externer Meilenstein		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Manueller Fortschritt	
	Sammelvorgang		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende			
