


Nr.	Vorgang/Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgang
1	Bauanlaufberatung	0 Tage	Mon 26.05.25	Mon 26.05.25	
2	Vorbereitende Maßnahmen	20 Tage	Die 01.04.25	Mon 28.04.25	
6	1. Bauabschnitt Zwischenbau alle Etagen	17 Tage	Mon 02.06.25	Die 24.06.25	
16	2. Bauabschnitt KG und Zwischenbau KG	12 Tage	Mon 16.06.25	Die 01.07.25	
32	3. Bauabschnitt EG Zwischenbau Fenster	12 Tage	Mon 23.06.25	Die 08.07.25	
48	4. Bauabschnitt OG Zwischenbau, Empfang	12 Tage	Mon 07.07.25	Die 22.07.25	
63	5. Bauabschnitt DG Zwischenbau	12 Tage	Don 17.07.25	Fre 01.08.25	
80	6. Bauabschnitt EG Flügel 1	13 Tage	Mon 28.07.25	Mit 13.08.25	
100	7. Bauabschnitt OG Flügel 1	16 Tage	Fre 08.08.25	Fre 29.08.25	
101	IT Verkabelung entfernen	1 Tag	Fre 08.08.25	Fre 08.08.25	
102	Schutzmaßnahmen	1 Tag	Fre 08.08.25	Fre 08.08.25	101E
103	Möbel abdecken/ verräumen	1 Tag	Fre 08.08.25	Fre 08.08.25	101E
104	Abbruch/ Öffnung der Decken	1 Tag	Mon 11.08.25	Mon 11.08.25	103
105	Rückenbau E-Installation	3 Tage	Die 12.08.25	Don 14.08.25	104
106	Heizkörper Demontage	5 Tage	Die 12.08.25	Mon 18.08.25	104
107	Neuverkabelung E-Installation	8 Tage	Fre 15.08.25	Die 26.08.25	105
108	Neueinbau der Heizkörper	8 Tage	Mon 18.08.25	Mit 27.08.25	104E
109	Fenster Demontage	8 Tage	Die 12.08.25	Don 21.08.25	104
110	Fenster Einbau	8 Tage	Die 12.08.25	Don 21.08.25	104
111	Anarbeiten Fenster, Reparatur	10 Tage	Die 12.08.25	Mon 25.08.25	104
112	Innentüren Demontage	3 Tage	Die 12.08.25	Don 14.08.25	104
113	Innentüren verbreitern (Beh.-Maßnahme)	2 Tage	Die 12.08.25	Mit 13.08.25	104
114	Innentüren einbauen (Beh.-Maßnahme)	3 Tage	Don 14.08.25	Mon 18.08.25	113
115	WC-Herren abbrechen (Beh.-Maßnahme)	2 Tage	Die 12.08.25	Mit 13.08.25	104
116	Sanitärinst.-grob (Beh.-Maßnahme)	1 Tag	Don 14.08.25	Don 14.08.25	115
117	Innentüre Demontage (Beh.-Maßnahme)	1 Tag	Fre 15.08.25	Fre 15.08.25	116
118	Innentüre verbreitern (Beh.-Maßnahme)	1 Tag	Mon 18.08.25	Mon 18.08.25	117
119	Innentüre einbauen (Beh.-Maßnahme)	1 Tag	Die 19.08.25	Die 19.08.25	118
120	Trockenbau/ Fliesenarbeiten (Beh.-Maßnahme)	4 Tage	Mit 20.08.25	Mon 25.08.25	119
121	Sanitär-Feininstallation (Beh.-Maßnahmen)	1 Tag	Die 26.08.25	Die 26.08.25	120
122	Bauzwischenreinigung	1 Tag	Mit 27.08.25	Mit 27.08.25	121
123	Bauzwischenreinigung	1 Tag	Don 28.08.25	Don 28.08.25	108
124	Feininstallation Elektro	1 Tag	Fre 29.08.25	Fre 29.08.25	123
125	Möbel wieder einräumen	1 Tag	Fre 29.08.25	Fre 29.08.25	123
126	IT Verkabelung installieren	1 Tag	Fre 29.08.25	Fre 29.08.25	123
127	7. Bauabschnitt abgeschlossen	0 Tage	Fre 29.08.25	Fre 29.08.25	125
128	8. Bauabschnitt DG Flügel 1	15 Tage	Die 26.08.25	Mon 15.09.25	
129	IT Verkabelung entfernen	1 Tag	Die 26.08.25	Die 26.08.25	
130	Schutzmaßnahmen	1 Tag	Die 26.08.25	Die 26.08.25	129E
131	Möbel abdecken/ verräumen	1 Tag	Die 26.08.25	Die 26.08.25	129E
132	Abbruch/ Öffnung der Decken	1 Tag	Mit 27.08.25	Mit 27.08.25	131
133	Rückenbau E-Installation	3 Tage	Don 28.08.25	Mon 01.09.25	132
134	Heizkörper Demontage	5 Tage	Don 28.08.25	Mit 03.09.25	132
135	Fassadenpaneele demontieren/zwischenlagern	6 Tage	Don 28.08.25	Don 04.09.25	132
136	Fenster Demontage	9 Tage	Don 28.08.25	Die 09.09.25	132
137	Neuverkabelung E-Installation	5 Tage	Die 02.09.25	Mon 08.09.25	133
138	Neueinbau der Heizkörper	8 Tage	Die 02.09.25	Don 11.09.25	133
139	Fenster Einbau	8 Tage	Die 02.09.25	Don 11.09.25	133
140	Innentüren Demontage	1 Tag	Die 02.09.25	Die 02.09.25	133
141	Innentüren einbauen	1 Tag	Mit 03.09.25	Mit 03.09.25	140
142	Anarbeiten Fenster, Reparatur	11 Tage	Don 28.08.25	Don 11.09.25	132
143	Bauzwischenreinigung	1 Tag	Fre 12.09.25	Fre 12.09.25	142
144	Feininstallation Elektro	1 Tag	Mon 15.09.25	Mon 15.09.25	143
145	Möbel wieder einräumen	1 Tag	Mon 15.09.25	Mon 15.09.25	143
146	IT Verkabelung installieren	1 Tag	Mon 15.09.25	Mon 15.09.25	143
147	8. Bauabschnitt abgeschlossen	0 Tage	Mon 15.09.25	Mon 15.09.25	145
148	9. Bauabschnitt Außenfassade Flügel 1 / Zwischenbau	44 Tage	Fre 29.08.25	Mit 29.10.25	
149	Gerüst aufbauen	10 Tage	Fre 29.08.25	Don 11.09.25	139E
150	Alte Dämmung entfernen	10 Tage	Fre 12.09.25	Don 25.09.25	149
151	Fassade reinigen	7 Tage	Fre 19.09.25	Mon 29.09.25	150E
152	Neue Dämmung aufbringen	10 Tage	Die 30.09.25	Mon 13.10.25	151
153	Fensterbretter einbauen	10 Tage	Die 30.09.25	Mon 13.10.25	151
154	Fassaden Putz und Anstrich	10 Tage	Die 14.10.25	Mon 27.10.25	153
155	Fassadenpaneele wieder anbringen	3 Tage	Don 23.10.25	Mon 27.10.25	154E
156	Gerüst demontieren	2 Tage	Die 28.10.25	Mit 29.10.25	154
157	9. Bauabschnitt abgeschlossen	0 Tage	Mit 29.10.25	Mit 29.10.25	156
158	10. Bauabschnitt DG Flügel 2	15 Tage	Don 11.09.25	Mit 01.10.25	
177	11. Bauabschnitt OG Flügel 2	15 Tage	Mon 29.09.25	Fre 17.10.25	
196	12. Bauabschnitt EG Flügel 2	15 Tage	Mon 13.10.25	Fre 31.10.25	
215	13. Bauabschnitt Decken/Zwischenbau in allen Etagen	35 Tage	Don 02.10.25	Mit 19.11.25	
238	14. Bauabschnitt Außenfassade Flügel 2	44 Tage	Mon 13.10.25	Don 11.12.25	



Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1		Bauanlaufberatung	0 Tage	Mon 26.05.25	Mon 26.05.25	
2		Vorbereitende Maßnahmen	20 Tage	Die 01.04.25	Mon 28.04.25	
6		1. Bauabschnitt Zwischenbau alle Etagen	17 Tage	Mon 02.06.25	Die 24.06.25	
16		2. Bauabschnitt KG und Zwischenbau KG	12 Tage	Mon 16.06.25	Die 01.07.25	
32		3. Bauabschnitt EG Zwischenbau Fenster	12 Tage	Mon 23.06.25	Die 08.07.25	
48		4. Bauabschnitt OG Zwischenbau, Empfang	12 Tage	Mon 07.07.25	Die 22.07.25	
63		5. Bauabschnitt DG Zwischenbau	12 Tage	Don 17.07.25	Fre 01.08.25	
80		6. Bauabschnitt EG Flügel 1	13 Tage	Mon 28.07.25	Mit 13.08.25	
100		7. Bauabschnitt OG Flügel 1	16 Tage	Fre 08.08.25	Fre 29.08.25	
128		8. Bauabschnitt DG Flügel 1	15 Tage	Die 26.08.25	Mon 15.09.25	
148		9. Bauabschnitt Außenfassade Flügel 1 / Zwischenbau	44 Tage	Fre 29.08.25	Mit 29.10.25	
158		10. Bauabschnitt DG Flügel 2	15 Tage	Don 11.09.25	Mit 01.10.25	
159	IT	IT Verkabelung entfernen	1 Tag	Don 11.09.25	Don 11.09.25	
160	Bauhelfer	Schutzmaßnahmen	1 Tag	Don 11.09.25	Don 11.09.25	159E
161	Möbel	Möbel abdecken/ verräumen	1 Tag	Don 11.09.25	Don 11.09.25	159E
162	Bauhelfer	Abbruch/ Öffnung der Decken	1 Tag	Fre 12.09.25	Fre 12.09.25	161
163	Bauhelfer	Rückenbau E-Installation	3 Tage	Mon 15.09.25	Mit 17.09.25	162
164	Bauhelfer	Heizkörper Demontage	8 Tage	Mon 15.09.25	Mit 24.09.25	162
165	Bauhelfer	Fassadenpaneele demontieren/zwischenlagern	6 Tage	Mon 15.09.25	Mon 22.09.25	162
166	Bauhelfer	Fenster Demontage	9 Tage	Mon 15.09.25	Don 25.09.25	162
167	Bauhelfer	Neuverkabelung E-Installation	5 Tage	Don 18.09.25	Mit 24.09.25	163
168	Bauhelfer	Neueinbau der Heizkörper	8 Tage	Don 18.09.25	Mon 29.09.25	163
169	Bauhelfer	Fenster Einbau	8 Tage	Don 18.09.25	Mon 29.09.25	163
170	Bauhelfer	Anarbeiten Fenster, Reparatur	11 Tage	Mon 15.09.25	Mon 29.09.25	162
171	Bauhelfer	Innentüren Obentürschließer ergänzen	1 Tag	Don 25.09.25	Don 25.09.25	170E
172	Bauhelfer	Bauzwischenreinigung	1 Tag	Die 30.09.25	Die 30.09.25	168
173	Bauhelfer	Feininstallation Elektro	1 Tag	Mit 01.10.25	Mit 01.10.25	172
174	Bauhelfer	Möbel wieder einräumen	1 Tag	Mit 01.10.25	Mit 01.10.25	172
175	Bauhelfer	IT Verkabelung installieren	1 Tag	Mit 01.10.25	Mit 01.10.25	172
176	Milestone	10. Bauabschnitt abgeschlossen	0 Tage	Mit 01.10.25	Mit 01.10.25	174
177		11. Bauabschnitt OG Flügel 2	15 Tage	Mon 29.09.25	Fre 17.10.25	
178	IT	IT Verkabelung entfernen	1 Tag	Mon 29.09.25	Mon 29.09.25	
179	Bauhelfer	Schutzmaßnahmen	1 Tag	Mon 29.09.25	Mon 29.09.25	178E
180	Möbel	Möbel abdecken/ verräumen	1 Tag	Mon 29.09.25	Mon 29.09.25	178E
181	Bauhelfer	Abbruch/ Öffnung der Decken	1 Tag	Die 30.09.25	Die 30.09.25	180
182	Bauhelfer	Rückenbau E-Installation	3 Tage	Mit 01.10.25	Fre 03.10.25	181
183	Bauhelfer	Heizkörper Demontage	8 Tage	Mit 01.10.25	Fre 10.10.25	181
184	Bauhelfer	Neuverkabelung E-Installation	8 Tage	Mon 06.10.25	Mit 15.10.25	182
185	Bauhelfer	Neueinbau der Heizkörper	8 Tage	Mon 06.10.25	Mit 15.10.25	182
186	Bauhelfer	Fenster Demontage	9 Tage	Mit 01.10.25	Mon 13.10.25	181
187	Bauhelfer	Fenster Einbau	9 Tage	Mit 01.10.25	Mon 13.10.25	181
188	Bauhelfer	Innentüren Demontage	1 Tag	Mit 01.10.25	Mit 01.10.25	181
189	Bauhelfer	Innentüren einbauen	1 Tag	Don 02.10.25	Don 02.10.25	188
190	Bauhelfer	Anarbeiten Fenster, Reparatur	10 Tage	Mit 01.10.25	Die 14.10.25	181
191	Bauhelfer	Bauzwischenreinigung	1 Tag	Don 16.10.25	Don 16.10.25	185
192	Bauhelfer	Feininstallation Elektro	1 Tag	Fre 17.10.25	Fre 17.10.25	191
193	Bauhelfer	Möbel wieder einräumen	1 Tag	Fre 17.10.25	Fre 17.10.25	191
194	Bauhelfer	IT Verkabelung installieren	1 Tag	Fre 17.10.25	Fre 17.10.25	191
195	Milestone	11. Bauabschnitt abgeschlossen	0 Tage	Fre 17.10.25	Fre 17.10.25	193
196		12. Bauabschnitt EG Flügel 2	15 Tage	Mon 13.10.25	Fre 31.10.25	
197	IT	IT Verkabelung entfernen	1 Tag	Mon 13.10.25	Mon 13.10.25	
198	Bauhelfer	Schutzmaßnahmen	1 Tag	Mon 13.10.25	Mon 13.10.25	197E
199	Möbel	Möbel abdecken/ verräumen	1 Tag	Mon 13.10.25	Mon 13.10.25	197E
200	Bauhelfer	Abbruch/ Öffnung der Decken	1 Tag	Die 14.10.25	Die 14.10.25	199
201	Bauhelfer	Rückenbau E-Installation	3 Tage	Mit 15.10.25	Fre 17.10.25	200
202	Bauhelfer	Heizkörper Demontage	5 Tage	Mit 15.10.25	Die 21.10.25	200
203	Bauhelfer	Neuverkabelung E-Installation	8 Tage	Mon 20.10.25	Mit 29.10.25	201
204	Bauhelfer	Neueinbau der Heizkörper	8 Tage	Mon 20.10.25	Mit 29.10.25	201
205	Bauhelfer	Fenster Demontage	9 Tage	Mit 15.10.25	Mon 27.10.25	200
206	Bauhelfer	Fenster Einbau	9 Tage	Mit 15.10.25	Mon 27.10.25	200
207	Bauhelfer	Innentüren Demontage	1 Tag	Mit 15.10.25	Mit 15.10.25	200
208	Bauhelfer	Innentüren einbauen	1 Tag	Don 16.10.25	Don 16.10.25	207
209	Bauhelfer	Anarbeiten Fenster, Reparatur	10 Tage	Mit 15.10.25	Die 28.10.25	200
210	Bauhelfer	Bauzwischenreinigung	1 Tag	Don 30.10.25	Don 30.10.25	204
211	Bauhelfer	Feininstallation Elektro	1 Tag	Fre 31.10.25	Fre 31.10.25	210
212	Bauhelfer	Möbel wieder einräumen	1 Tag	Fre 31.10.25	Fre 31.10.25	210
213	Bauhelfer	IT Verkabelung	1 Tag	Fre 31.10.25	Fre 31.10.25	210
214	Milestone	12. Bauabschnitt abgeschlossen	0 Tage	Fre 31.10.25	Fre 31.10.25	212
215		13. Bauabschnitt Decken/Zwischenbau in allen Etagen	35 Tage	Don 02.10.25	Mit 19.11.25	
238		14. Bauabschnitt Außenfassade Flügel 2	44 Tage	Mon 13.10.25	Don 11.12.25	

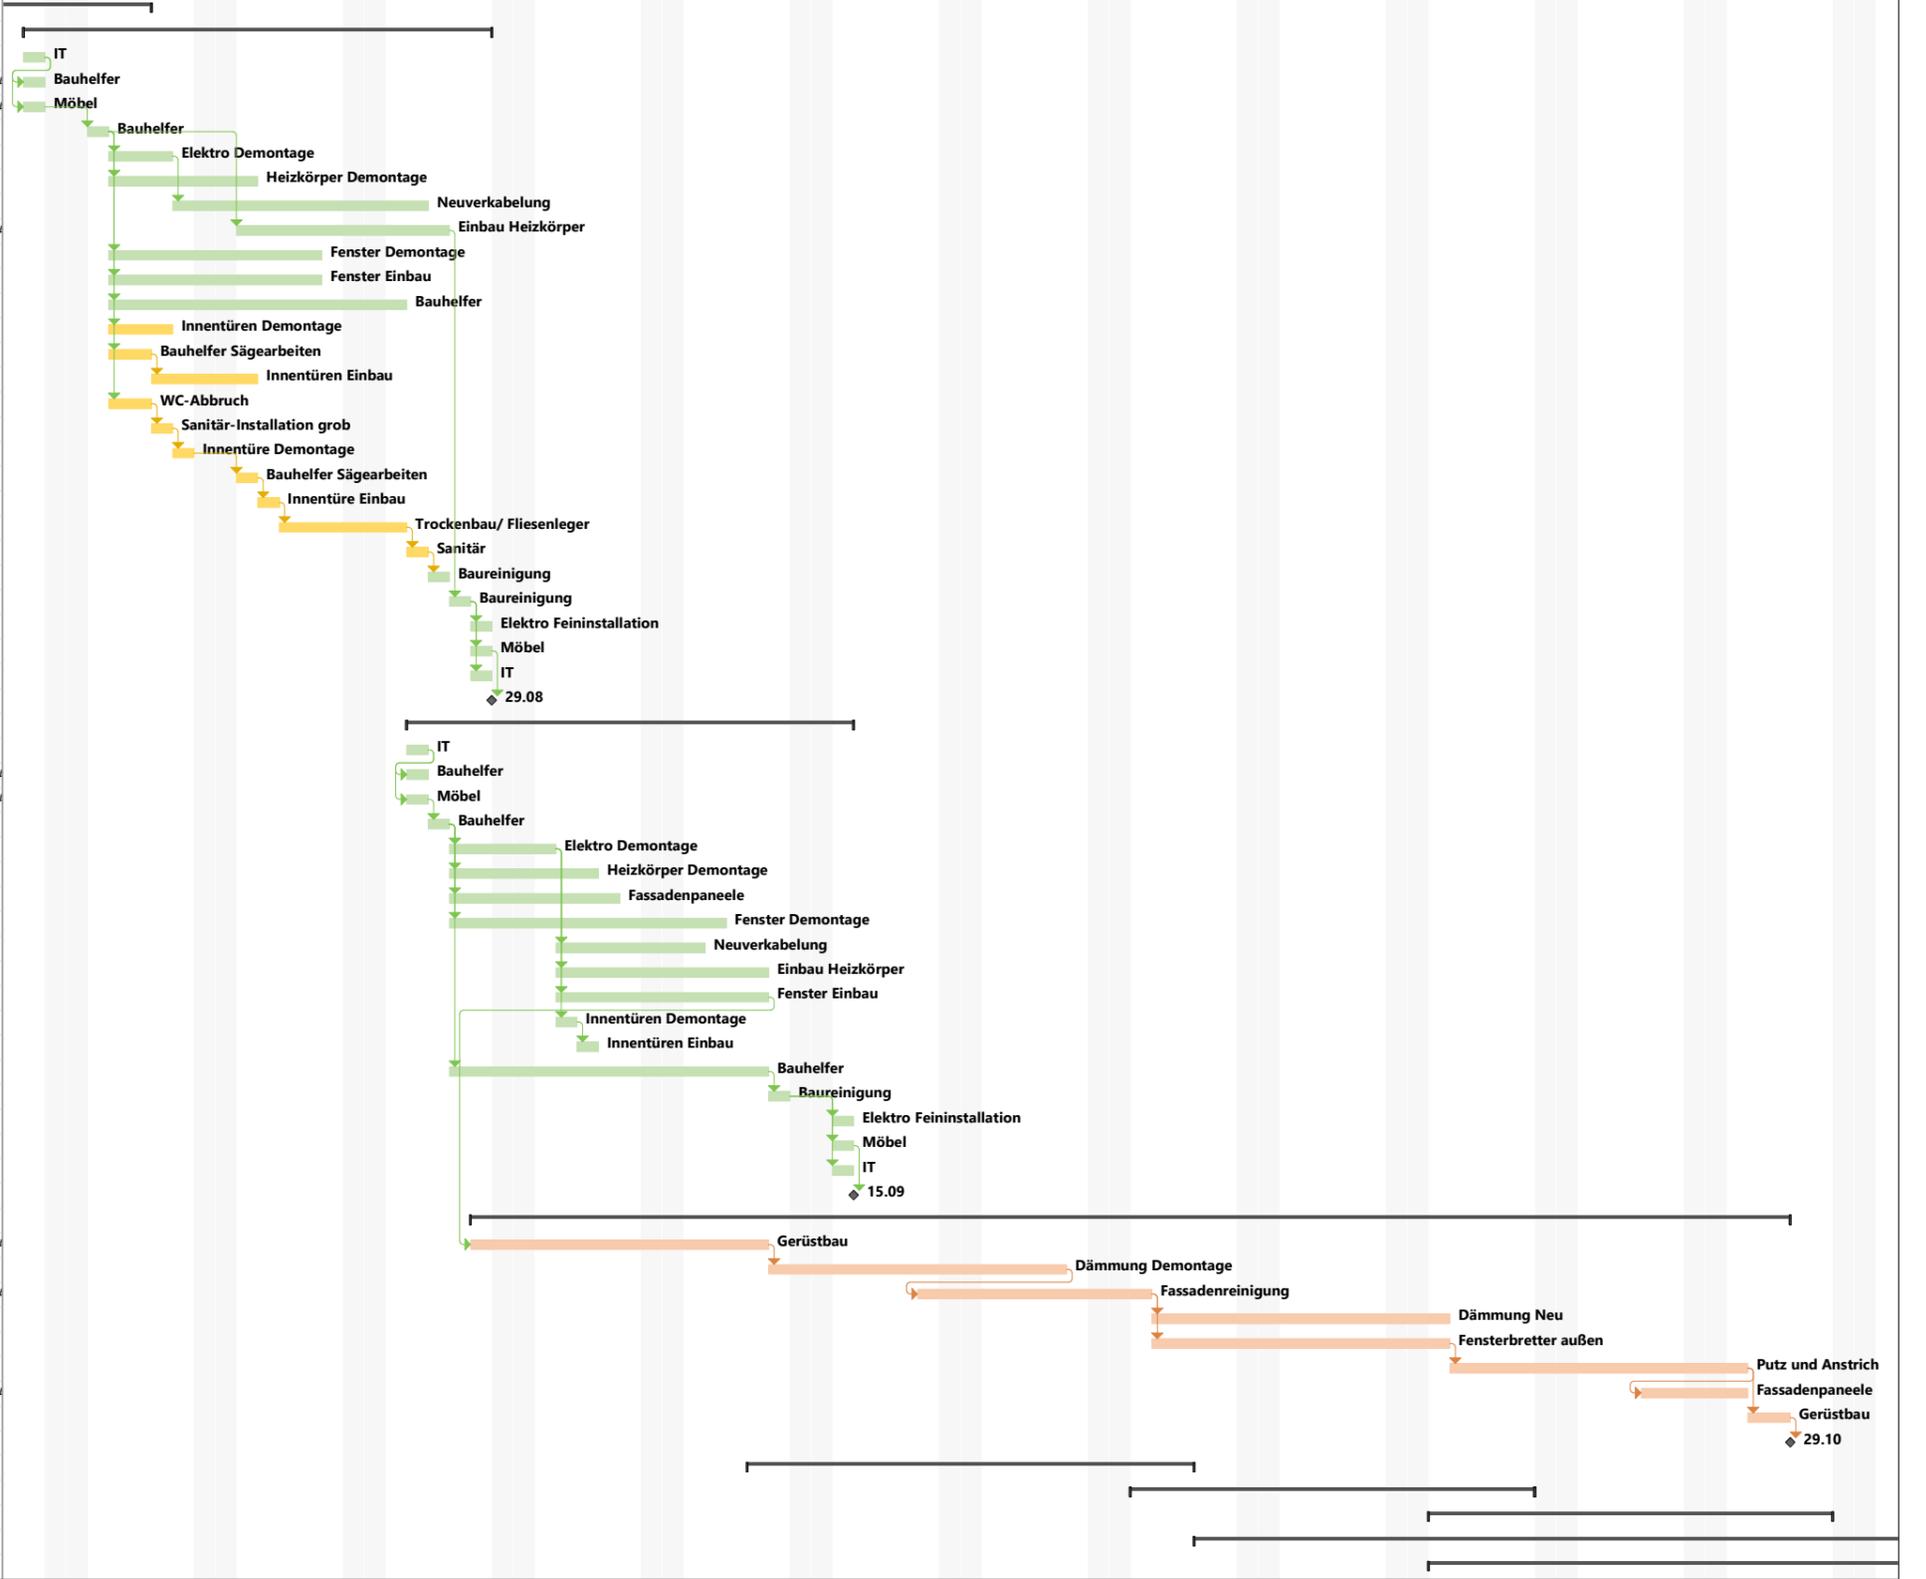
