


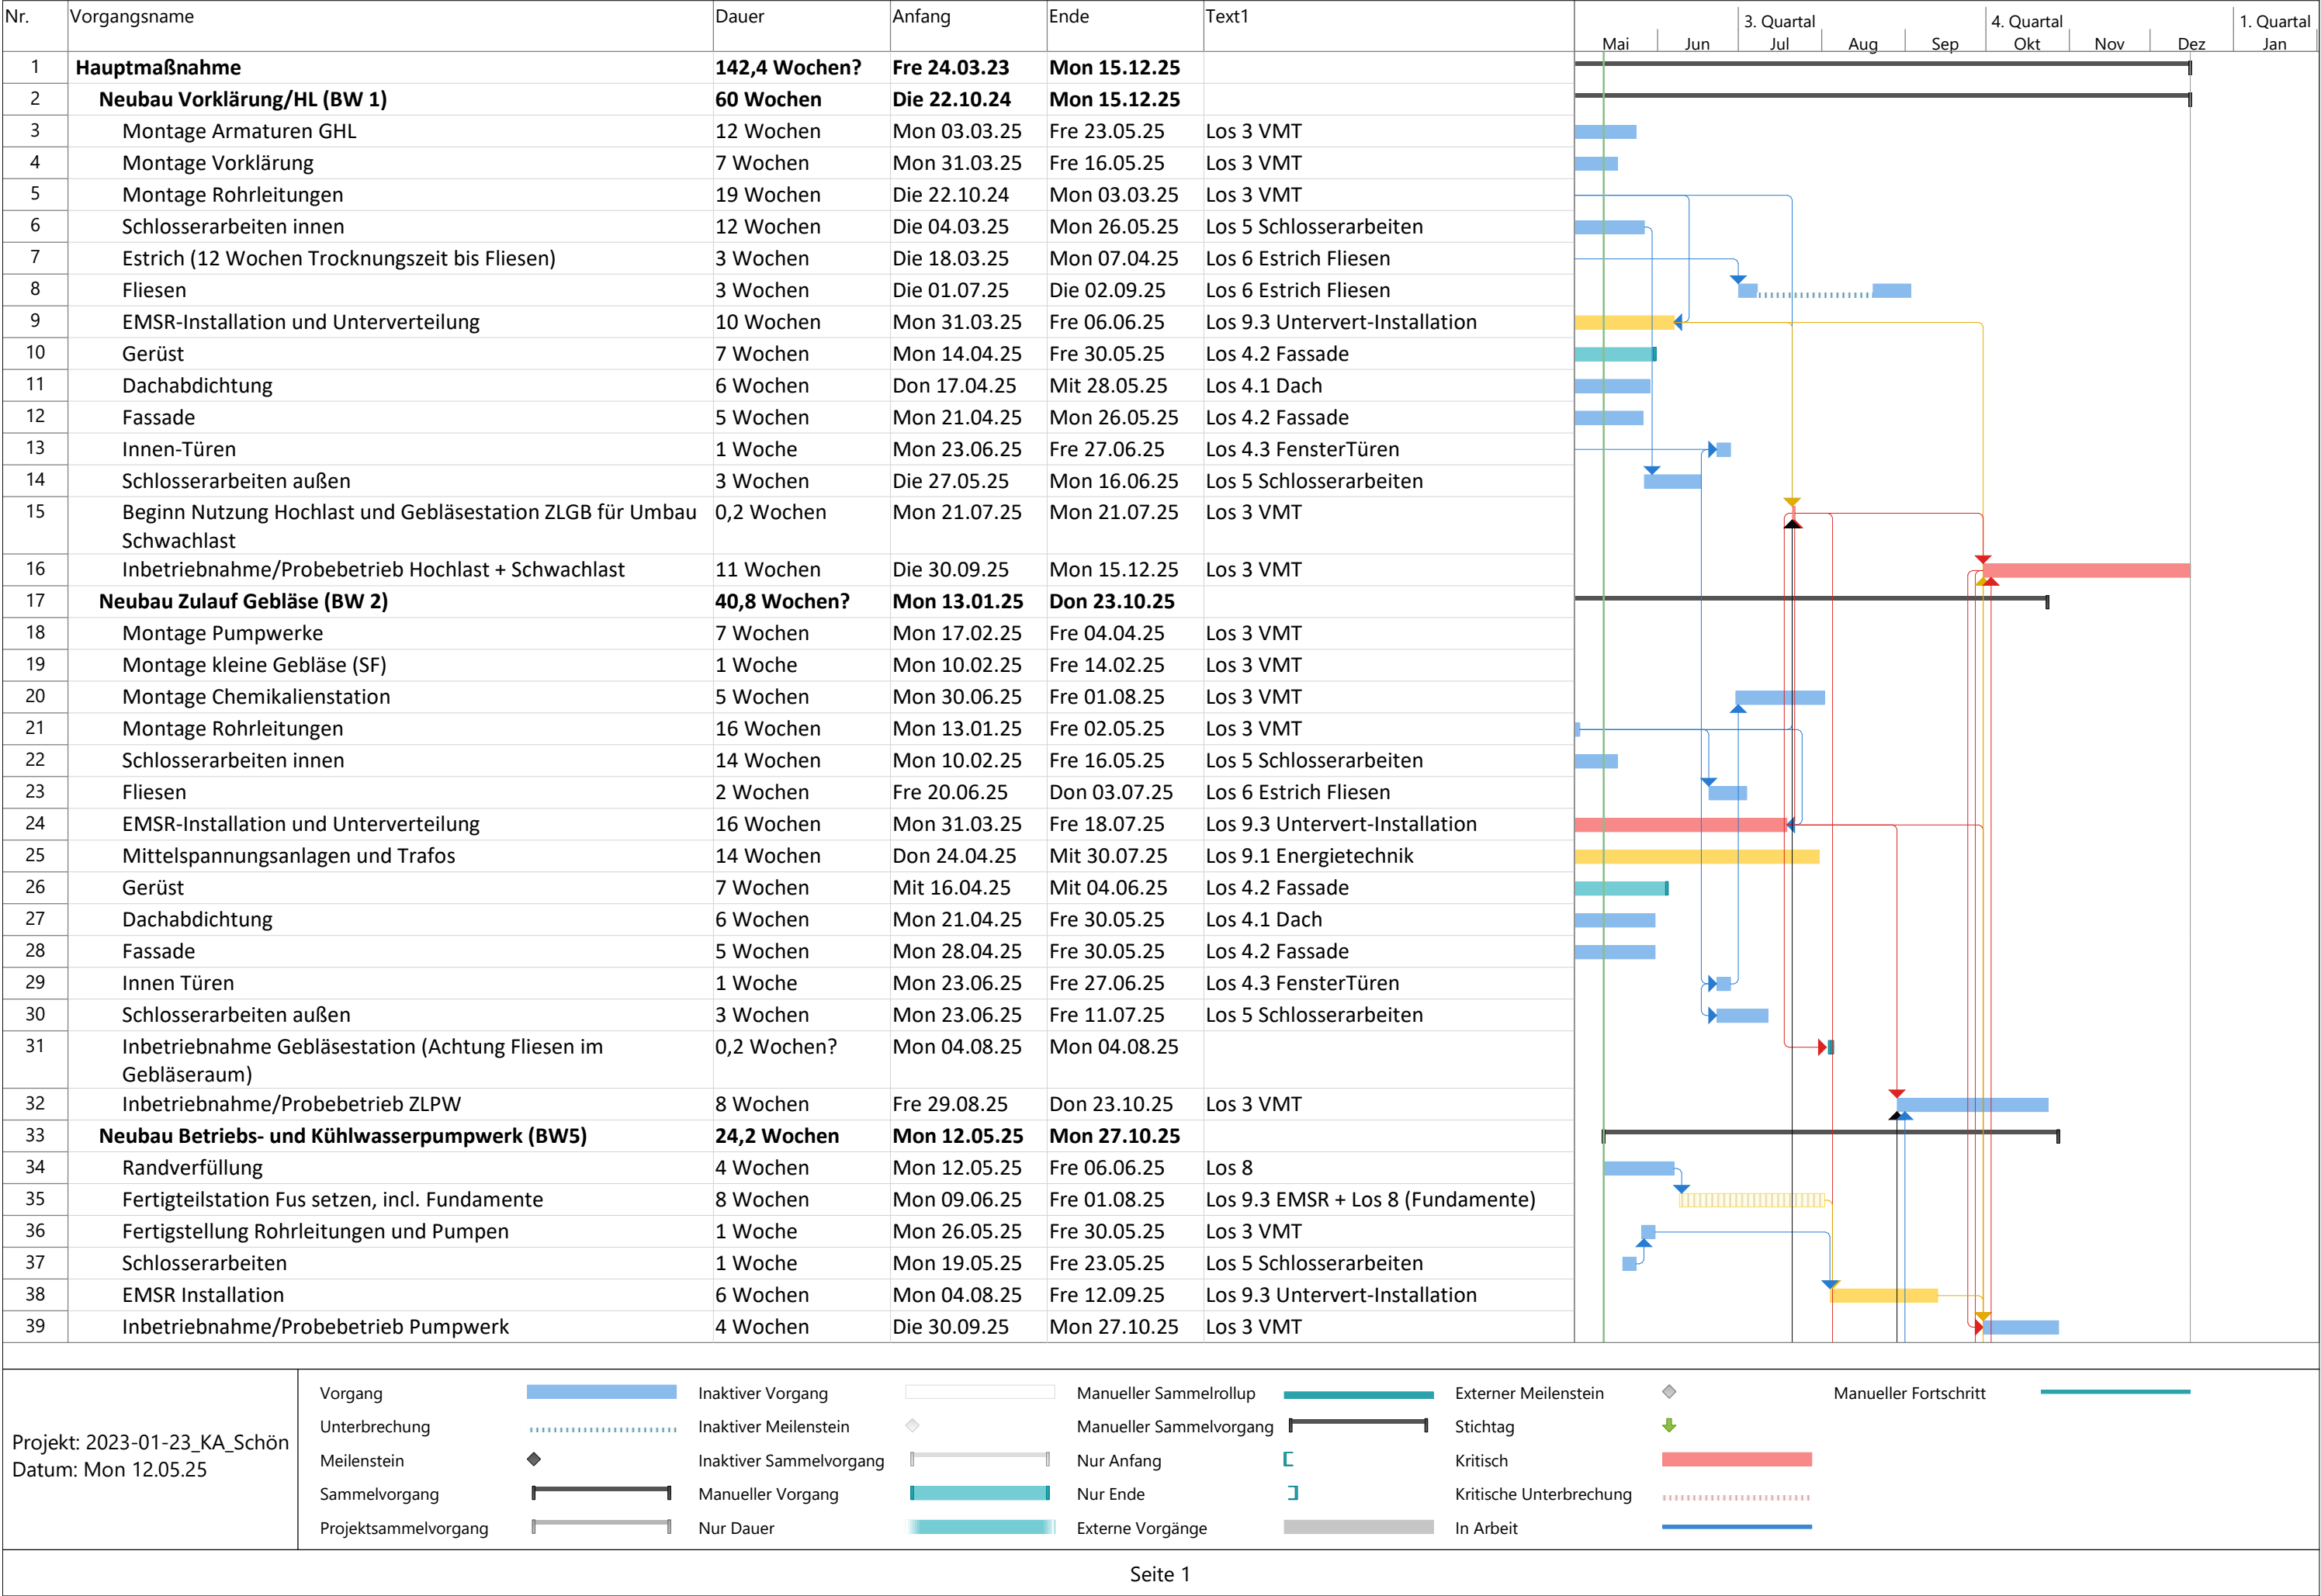

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Text1	Gantt-Diagramm											
						Mai	Jun	3. Quartal		Aug	Sep	4. Quartal		Nov	Dez	1. Quartal	
40	Umbau Mittelspannung Bestand (Werkstattgebäude)	13 Wochen	Mon 12.05.25	Fre 08.08.25													
41	Mittelspannung Bestand Umschluss auf Provisorium	3 Wochen	Mon 31.03.25	Fre 18.04.25	Los 9.1 Energietechnik												
42	Mittelspannung Bestand umbauen	10 Wochen	Mon 12.05.25	Fre 18.07.25	Los 9.1 Energietechnik												
43	Erneuerung Prozessleitsystem Bestand (Betriebsgebäude)	31 Wochen	Mon 24.02.25	Fre 26.09.25													
44	PLS Werkplanung und Bestellzeit	9 Wochen	Mon 24.02.25	Fre 25.04.25	Los 9.2 MSR												
45	PLS Erneuerung	22 Wochen	Mon 28.04.25	Fre 26.09.25	Los 9.2 MSR												
46	erdverlegte Rohrleitungen (Neubaufeld)	120,2 Wochen	Fre 24.03.23	Fre 11.07.25													
47	Mittelspannung +Niederspannung von Werkstatt zu BW 2	2 Wochen	Mon 07.04.25	Fre 18.04.25	Los 8 und 9.1												
48	Regenentwässerung BW 1 und BW 2 [165m] (sukzessive)	17 Wochen	Mon 17.03.25	Fre 11.07.25	Los 8 erdverl. Leit.												
49	GFK DN 700 Vorklärung Bestand > BW1 [70m]	6 Wochen	Mon 31.03.25	Fre 09.05.25	Los 8 erdverl. Leit.												
50	GFK DN 700 Sandfang > Vorklärbecken Bestand [10m]	1 Woche	Mon 24.03.25	Fre 28.03.25	Los 8 erdverl. Leit.												
51	Leitungspaket BW5 > BW2 [50m]	3 Wochen	Mon 03.03.25	Fre 21.03.25	Los 8 erdverl. Leit.												
52	Luftleitung DA90 BW2 > Sandfang [25m]	1 Woche	Fre 24.03.23	Don 30.03.23	Los 8 erdverl. Leit.												
53	Betriebswasser DA 140 [30m]	1 Woche	Mon 10.03.25	Fre 14.03.25	Los 8 erdverl. Leit.												
54	Primärschlamm DA 140 [30m]	1,4 Wochen	Mon 10.03.25	Die 18.03.25	Los 8 erdverl. Leit.												
55	Leerrohr und Kabelschächte BW5 x BW2 [75m]	3 Wochen	Mon 12.05.25	Fre 30.05.25	Los 8 erdverl. Leit.												
56	Leerrohr und Kabelschacht Beton BW5 [25m]	2 Wochen	Mon 02.06.25	Fre 13.06.25	Los 8 erdverl. Leit.												
57	Straßen und Landschaftsbau	12 Wochen	Mon 14.07.25	Fre 03.10.25													
58	Straßenentwässerung	4 Wochen	Mon 14.07.25	Fre 08.08.25	Los 7 Straßen + Landschaftsbau												
59	Straßen und Wegebau	10 Wochen	Mon 14.07.25	Fre 19.09.25	Los 7 Straßen + Landschaftsbau												
60	Landschaftsbau	10 Wochen	Mon 14.07.25	Fre 19.09.25	Los 7 Straßen + Landschaftsbau												
61	Mulde vor Winkelstützmauer	2 Wochen	Mon 15.09.25	Fre 26.09.25	Los 7												
62	Neubau Schlammstapelbehälter (Maschinenhaus)	66,6 Wochen	Mit 24.04.24	Fre 01.08.25													
63	Werkplanung und Bestellzeit	50 Wochen	Mit 24.04.24	Die 08.04.25	AZV Hunning												
64	Provisorium AZV	1 Woche	Mon 19.05.25	Fre 23.05.25	AZV Hunning												
65	Neubau Maschinentechnik	2 Wochen	Mon 19.05.25	Fre 30.05.25	AZV Hunning												
66	EMSR Anbindung an Bestand	1 Woche	Mon 02.06.25	Fre 06.06.25	Los9.2MSR+Los9.3Inst												
67	Inbetriebnahme Probebetrieb	8 Wochen	Mon 09.06.25	Fre 01.08.25	AZV Hunning												
68	Umbau BHKW und Heizungssystem (Maschinenhaus)	38 Wochen	Mon 10.03.25	Fre 28.11.25													
69	Rückbau 1 St. BHKWs	2 Wochen	Mon 05.05.25	Fre 16.05.25	Los 3 VMT												
70	Installation 1 St. BHKW 200 kW el. (Anschluss an Bestandsheizung)	6 Wochen	Mon 19.05.25	Fre 27.06.25	Los 3 VMT												
71	EMSR Anbindung BHKW	2 Wochen	Mon 30.06.25	Fre 11.07.25	Los9.2MSR+Los9.3Inst												
72	Inbetriebnahme/Probebetrieb BHKW	8 Wochen	Mon 14.07.25	Fre 05.09.25	Los 3 VMT												
73	Umbau BHKW und Heizungssystem (Maschinenhaus)	38 Wochen	Mon 10.03.25	Fre 28.11.25													
74	Werkplanung/ Bestellzeit	20 Wochen	Mon 10.03.25	Fre 25.07.25	Los 3 VMT												
75	Rückbau 2 St. BHKWs	2 Wochen	Mon 28.07.25	Fre 08.08.25	Los 3 VMT												
76	Installation 1 St. BHKW 160 kW el. (Anschluss an Bestandsheizung)	6 Wochen	Mon 11.08.25	Fre 19.09.25	Los 3 VMT												
77	EMSR Anbindung BHKW	2 Wochen	Mon 22.09.25	Fre 03.10.25	Los9.2MSR+Los9.3Inst												
78	Inbetriebnahme/Probebetrieb BHKW	8 Wochen	Mon 06.10.25	Fre 28.11.25	Los 3 VMT												

Projekt: 2023-01-23_KA_Schön Datum: Mon 12.05.25	Vorgang		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelrollup		Externer Meilenstein		Manueller Fortschritt	
	Unterbrechung		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang		Stichtag			
	Meilenstein		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang		Kritisch			
	Sammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Ende		Kritische Unterbrechung			
	Projektsammelvorgang		Nur Dauer		Externe Vorgänge		In Arbeit			
Seite 2										

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Text1												
						Mai	Jun	3. Quartal Jul	Aug	Sep	4. Quartal Okt	Nov	Dez	1. Quartal Jan			
79	Umbau Heizungssystem Anbindung BG2	13 Wochen	Mon 03.02.25	Fre 02.05.25		1											
80	TGA-Heizung	4 Wochen	Mon 03.02.25	Fre 28.02.25	Los 10 TGA												
81	EMSR Anbindung Heizung	7 Wochen	Mon 03.03.25	Fre 18.04.25	Los9.2MSR+Los9.3Inst												
82	Inbetriebnahme/ Probetrieb	2 Wochen	Mon 21.04.25	Fre 02.05.25	Los 10 TGA												
83	Umbau Faulschlammeindickung (Maschinenhaus)	60 Wochen	Mon 25.03.24	Fre 16.05.25													
84	Werkplanung und Bestellzeit	32 Wochen	Mon 25.03.24	Fre 01.11.24	Los 3 VMT												
85	Umbau Maschinentechnik	4 Wochen	Mon 27.01.25	Fre 21.02.25	Los 3 VMT												
86	EMSR Anbindung an Bestand	4 Wochen	Mon 24.02.25	Fre 21.03.25	Los9.2MSR+Los9.3Inst												
87	Inbetriebnahme Probetrieb	8 Wochen	Mon 24.03.25	Fre 16.05.25	Los 3 VMT												
88	Umbau Gebläsestation (Maschinenhaus)	5 Wochen	Don 01.05.25	Mit 04.06.25													
89	Umbau Gebläse	4 Wochen	Don 01.05.25	Mit 28.05.25	Los 3 VMT												
90	EMSR-Umbindung	5 Wochen	Don 01.05.25	Mit 04.06.25	Los9.2MSR+Los9.3Inst												
91	Umbau Schlamm-speicher	2 Wochen	Mon 16.06.25	Fre 27.06.25													
92	Umbau Schlamm-speicher	1 Woche	Mon 16.06.25	Fre 20.06.25	Los 3 VMT												
93	EMSR Anbindung an Bestand Begleitheizung	1 Woche	Mon 23.06.25	Fre 27.06.25	Los9.2MSR+Los9.3Inst												
94	Umbau Belebungs-becken 1	4 Wochen	Mon 05.05.25	Fre 30.05.25													
95	Umbau RLS-Pumpen, Rlt,	4 Wochen	Mon 05.05.25	Fre 30.05.25	Los 3 VMT abhängig von Elektro												
96	Umbau Belebungs-becken 2 und 4 (SL)	8 Wochen	Die 05.08.25	Mon 29.09.25													
97	Umbau Schwachlaststufe mit RLS-PW gem. Umbaukonzept	4 Wochen	Die 05.08.25	Mon 01.09.25	Los 3 VMT												
98	Anbindung EMSR	4 Wochen	Die 02.09.25	Mon 29.09.25	Los9.2MSR+Los9.3Inst												
99	Umbau Vorklä-rung zu Havariespeicher	5 Wochen	Die 14.10.25	Mon 17.11.25													
100	Verschluss Durchbruch (Betonbau)	1 Woche	Die 14.10.25	Mon 20.10.25	voraussichtl. Los 2												
101	Umbau Maschinentechnik	4 Wochen	Die 21.10.25	Mon 17.11.25	Los 3 VMT												
102	EMSR Anbindung an Bestand	4 Wochen	Die 21.10.25	Mon 17.11.25	Los9.2MSR+Los9.3Inst												
103	Umbau Chemikalienstation am BB1	7 Wochen	Die 02.09.25	Mon 20.10.25													
104	Rückbau Harnstoffdosierung	1 Woche	Die 02.09.25	Mon 08.09.25	Los 3 VMT												
105	Installation Ameisensäuredosierung	2 Wochen	Die 09.09.25	Mon 22.09.25	Los 3 VMT												
106	EMSR Anbindung an Bestand	2 Wochen	Die 09.09.25	Mon 22.09.25	Los9.2MSR+Los9.3Inst												
107	Probetrieb	4 Wochen	Die 23.09.25	Mon 20.10.25	Los 3 VMT												
108	Umbau Rechenhaus und Sandfang	35,8 Wochen	Mon 20.01.25	Don 25.09.25													
109	Umbau Sandfangrinne	4 Wochen	Mon 03.03.25	Fre 28.03.25	Los 3 VMT												
110	Umbau Maschinentechnik Rechen	4 Wochen	Mon 20.01.25	Fre 14.02.25	Los 3 VMT + Los9.2 + 9.3												
111	Umbau Zulaufsituation	2 Wochen	Fre 15.08.25	Don 28.08.25	Los 3 VMT												
112	Probetrieb	4 Wochen	Fre 29.08.25	Don 25.09.25	Los 3 VMT												
113	Umbau Fällmittelstation am BB1	38 Wochen	Die 17.09.24	Mon 09.06.25													
114	Werkplanung und Bestellzeit	28 Wochen	Die 17.09.24	Mon 31.03.25	Los 3 VMT												
115	Umbau Fällmittelstation VMT	4 Wochen	Die 01.04.25	Mon 28.04.25	Los 3 VMT												
116	EMSR Umbindung im Bestand	4 Wochen	Die 01.04.25	Mon 28.04.25	Los9.2MSR+Los9.3Inst												
117	Probetrieb	6 Wochen	Die 29.04.25	Mon 09.06.25	Los 3 VMT												

Projekt: 2023-01-23_KA_Schön
Datum: Mon 12.05.25

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

Kritisch

Kritische Unterbrechung

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Seite 3
