


Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2024			2025			2026													
					1. Qtl, 2024	2. Qtl, 2024	3. Qtl, 2024	1. Qtl, 2025	2. Qtl, 2025	3. Qtl, 2025	1. Qtl, 2026	2. Qtl, 2026	3. Qtl, 2026											
					Jan	Feb	Marz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Marz	Apr	Mai	Jun	Jul	
1	Planung	965 Tage	Mon 16.08.21	Mit 21.05.25																				
64	Ausführung VGM + HB-Maßnahme	937 Tage	Mon 19.09.22	Fre 12.06.26																				
65	vorgezogene Maßnahmen	255 Tage	Mon 19.09.22	Fre 08.09.23																				
75	Hauptbaumaßnahme	663 Tage	Fre 06.10.23	Fre 12.06.26																				12.06
76	Neubau	653 Tage	Fre 06.10.23	Fre 29.05.26																				
77	Vorlage Baugenehmigung	1 Tag	Fre 06.10.23	Fre 06.10.23																				
78	SpezTB-Ausführung	50 Tage	Mon 09.10.23	Fre 15.12.23																				
79	BE-Einrichtung	19 Tage	Mon 04.03.24	Don 28.03.24																				
81	VGM 2.1 Medien/Anschluss Gastank	5 Tage	Mon 18.03.24	Fre 22.03.24																				
82	Rückbau SPH-Fassade	10 Tage	Mon 04.03.24	Fre 15.03.24																				
83	NB: Rohbau	165 Tage	Mon 18.03.24	Die 05.11.24																				
100	Technikräume herrichten	20 Tage	Mon 07.10.24	Mon 04.11.24																				
101	Blitzschutz/Erdung	10 Tage	Mon 15.04.24	Don 06.06.24																				
102	WP/Einbauteile Aufzugsbau	130 Tage	Mon 24.06.24	Don 09.01.25																				
103	Montage Aufzugsbau	20 Tage	Don 09.01.25	Mit 05.02.25																				
104	VGM 2.2 Medien/GL Innenhof	20 Tage	Mit 06.11.24	Mit 04.12.24																				
105	NB: Aufbau Fassadengerüst	15 Tage	Mon 23.09.24	Mon 14.10.24																				
106	NB: Flachdacharbeiten	60 Tage	Mon 30.09.24	Mit 08.01.25																				
107	NB: WP/Fertigung Kunststofffenster/Alutüren	50 Tage	Mon 16.09.24	Mit 27.11.24																				
108	NB: Montage Kunststofffenster /SoSchu	30 Tage	Don 28.11.24	Mit 22.01.25																				
109	NB: WP/Fertigung Betonfertigteile	60 Tage	Mon 30.09.24	Mit 08.01.25																				
110	NB: Fassade-Vorsatzschale/Betonfertigt.	60 Tage	Don 09.01.25	Mit 02.04.25																				
111	NB: Fassadenputz/Maler	40 Tage	Don 13.03.25	Die 13.05.25																				
112	NB: Fassadengerüst Rückbau	5 Tage	Mit 14.05.25	Die 20.05.25																				
113	NB: WP/Fertigung PR-Fassade	80 Tage	Mon 07.10.24	Die 11.02.25																				
114	NB: Montage PR-Fassade/SoSchu	30 Tage	Mit 12.02.25	Die 25.03.25																				
115	NB: Trockenbauwände roh	25 Tage	Don 19.12.24	Mit 05.02.25																				
116	NB: TGA WP/Lieferzeiten	60 Tage	Mon 16.09.24	Mit 11.12.24																				
117	NB: WP Fachräume	30 Tage	Mon 21.10.24	Mit 04.12.24																				
118	NB: TGA-Rohinstallation	160 Tage	Mit 04.12.24	Don 07.08.25																				
119	NB: Schlosser Montage Technischeinhausung Dach	30 Tage	Mon 12.05.25	Mit 25.06.25																				
120	NB: TB-Wände schließen, Decken	65 Tage	Fre 11.07.25	Fre 10.10.25																				
121	NB: Innenputz	50 Tage	Don 23.01.25	Mon 25.08.25																				
122	NB: WP/Fertigung Geländer/Treppe	60 Tage	Mon 07.10.24	Die 14.01.25																				
123	NB: Schlosser Geländer/Treppe	30 Tage	Mit 15.01.25	Die 25.02.25																				
124	NB: WP/Fertigung	60 Tage	Fre 20.06.25	Fre 12.09.25																				
125	NB: Metallbau-Flurtüren	30 Tage	Fre 12.09.25	Fre 24.10.25																				
126	NB: WP/Fertigung Innentüren	60 Tage	Fre 20.06.25	Fre 12.09.25																				
127	NB: Innentüren	30 Tage	Fre 12.09.25	Fre 24.10.25																				
128	NB: Estrich	70 Tage	Fre 26.09.25	Mon 19.01.26																				
129	NB: Malerarbeiten	40 Tage	Die 09.12.25	Mon 16.02.26																				
130	NB: Bodenbeläge	30 Tage	Die 09.12.25	Mon 02.02.26																				
131	NB: Plattenbeläge Flure/TH	30 Tage	Sam 29.11.25	Don 22.01.26																				
132	NB: Wandfliesen	20 Tage	Die 09.12.25	Mon 19.01.26																				
133	NB: Bodenfliesen Räume	20 Tage	Die 13.01.26	Mon 09.02.26																				
134	NB: WC-Trennwände	15 Tage	Die 10.02.26	Mon 02.03.26																				
135	WP/Fertigung	50 Tage	Mon 13.10.25	Mon 05.01.26																				
136	Einbaumöbel/FR-Ausstattung	15 Tage	Fre 09.01.26	Don 29.01.26																				
137	NB: TGA- Feininstallation	50 Tage	Fre 30.01.26	Mon 13.04.26																				
138	NB: Beschilderung	10 Tage	Fre 23.01.26	Don 05.02.26																				
139	NB: techn. Inbetriebnahme	40 Tage	Fre 27.03.26	Fre 29.05.26																				
140	NB: Feinreinigung	15 Tage	Die 21.04.26	Die 12.05.26																				
141	Altbau	512 Tage	Mit 03.04.24	Don 07.05.26																				
142	Sachverständiger Artenschutz	1 Tag	Mit 03.04.24	Mit 03.04.24																				
143	AB: Schadstoffentsorgung	15 Tage	Die 14.05.24	Mon 03.06.24																				

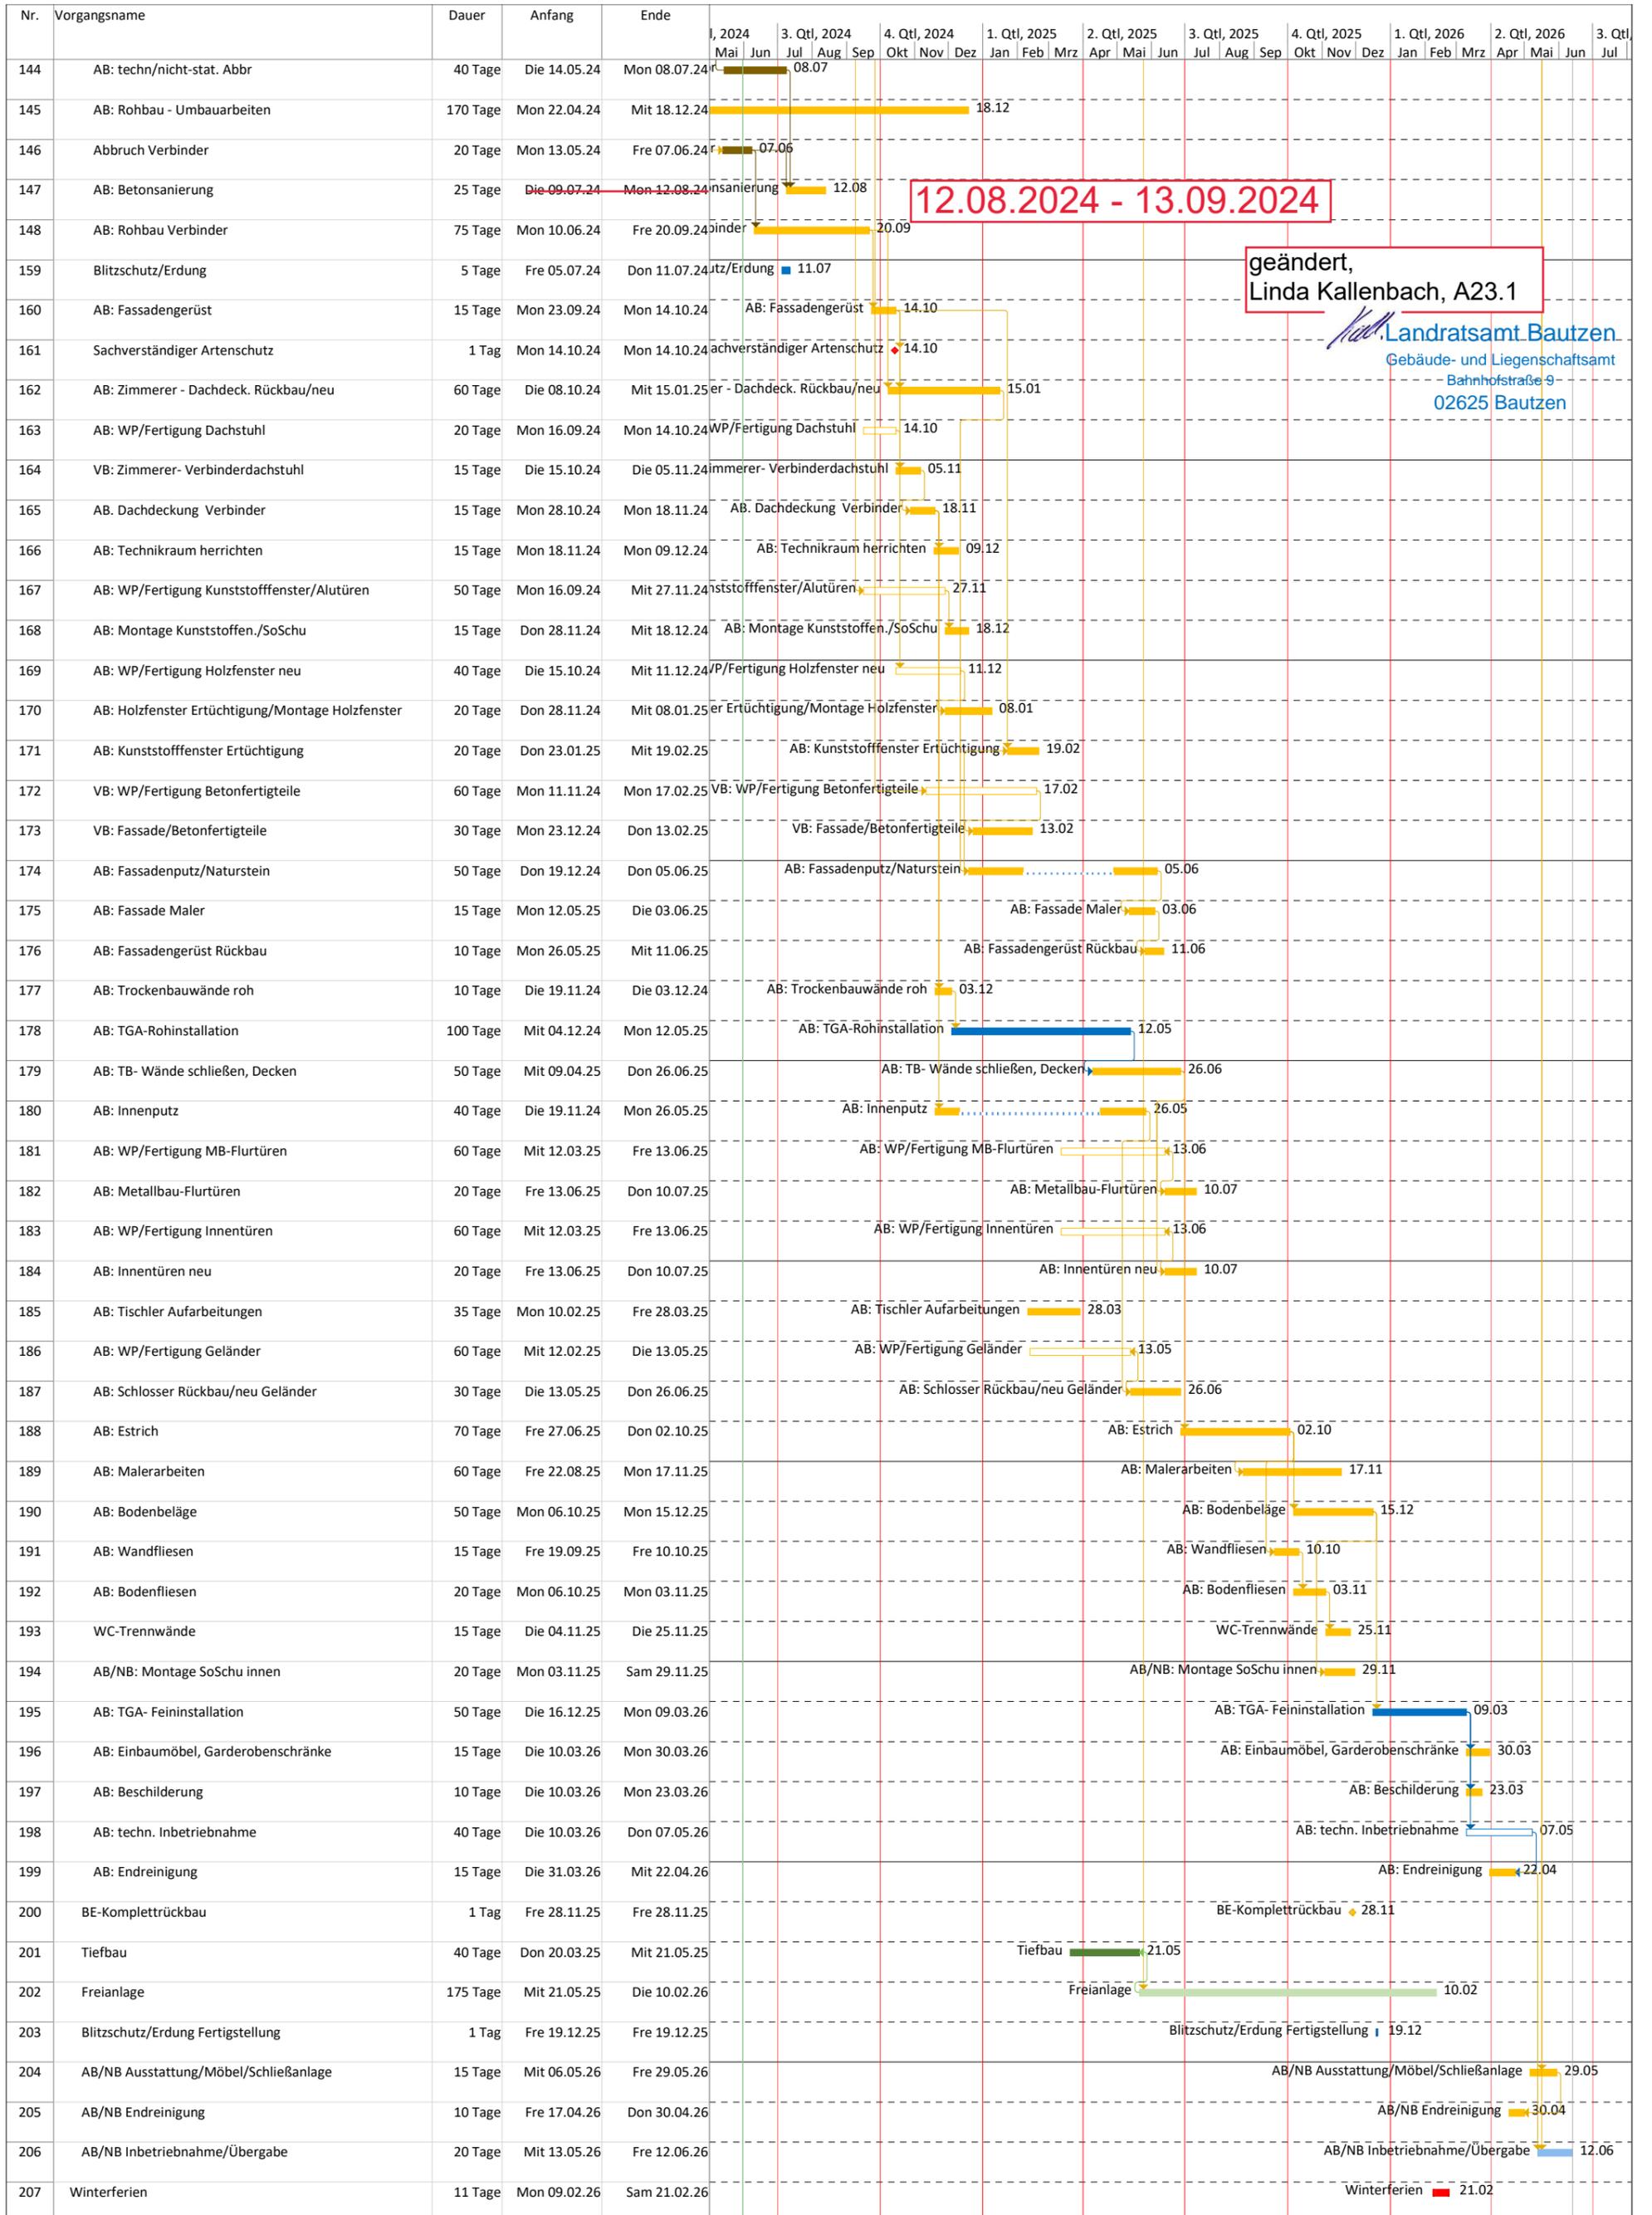

12.08.2024 - 13.09.2024

geändert,  
Linda Kallenbach, A23.1

Landratsamt Bautzen  
Gebäude- und Liegenschaftsamt  
Bahnhofstraße 9  
02625 Bautzen
