


Projekt Bauherr

3010 IPK Phytokammern IPK

Projektstart Erstellungsdatum

Gatersleben
Deutschland
16.12.2024 20.08.2025

| NR. | VORGANGSNAME | ANFANG | STICHTAG | DAUER |
|----------|--|------------|------------|----------|
| | | | | |
| 1 | Stufe A: bis zur Entwurfsplanung (LP 1-3) | 16.12.2024 | 07.05.2025 | 102 Tage |
| 2 | Stufe B: bis zur Vergabe (LP 5-7) | 07.05.2025 | 17.10.2025 | 117 Tage |
| 3 | Planung Kalte | 16.06.2025 | 19.12.2025 | 134 Tage |
| 4 | Stufe C: Objektüberwachung | 17.10.2025 | 22.09.2026 | 242 Tage |
| 4.1 | Vorbereitung & Lieferzeiten | 17.10.2025 | 29.05.2026 | 160 Tage |
| 4.1.1 | Technische Abstimmung | 17.10.2025 | 12.12.2025 | 40 Tage |
| 4.1.2 | Probebohrung Bodenplatte | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 1 Tag |
| 4.1.3 | Lieferzeit Kammern | 12.12.2025 | 29.05.2026 | 120 Tage |
| 4.1.4 | Lieferzeit Schränke | 12.12.2025 | 01.05.2026 | 100 Tage |
| 4.1.5 | Phytokammernhaus 1 leerräumen (Beginn Stillstandszeit) | 02.02.2026 | 14.02.2026 | 10 Tage |
| 4.2 | Baubeginn | 09.02.2026 | 09.02.2026 | 0 Tage |
| 4.3 | Rückbau + Rohbau | 09.02.2026 | 23.04.2026 | 53 Tage |
| 4.3.1 | GA ausprogrammieren | 09.02.2026 | 14.02.2026 | 5 Tage |
| 4.3.2 | Datenverteiler aufräumen | 16.02.2026 | 21.02.2026 | 5 Tage |
| 4.3.3 | ELT trennen/zurückbauen | 23.02.2026 | 26.02.2026 | 3 Tage |
| 4.3.4 | Pflanzenbeleuchtung Kammer 6 demontieren und lagern | 26.02.2026 | 28.02.2026 | 2 Tage |
| 4.3.5 | HLS trennen/zurückbauen | 16.02.2026 | 20.02.2026 | 4 Tage |
| 4.3.6 | Schränke demontieren & entsorgen | 26.02.2026 | 28.02.2026 | 2 Tage |
| 4.3.7 | Bodenbearbeitung | 02.03.2026 | 18.04.2026 | 35 Tage |
| 4.3.7.1 | Bodenplatte öffnen + Aushub | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 3 Tage |
| 4.3.7.2 | Schmutzwasserleitung einbringen | 05.03.2026 | 07.03.2026 | 2 Tage |
| 4.3.7.3 | Verfüllung + Bodenplatte herrichten | 09.03.2026 | 14.03.2026 | 5 Tage |
| 4.3.7.4 | Trocknungszeit (Beton) | 16.03.2026 | 18.04.2026 | 25 Tage |
| 4.3.8 | Kammern inkl. Technik demontieren | 16.03.2026 | 09.04.2026 | 18 Tage |
| 4.3.9 | Treppe demontieren | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 1 Tag |
| 4.3.10 | Heizkörper demontieren | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 1 Tag |
| 4.3.11 | Aufräumen und Reinigung | 09.04.2026 | 11.04.2026 | 2 Tage |
| 4.3.12 | Bodenbeschichtung | 13.04.2026 | 23.04.2026 | 8 Tage |
| 4.3.12.1 | Schleifen | 13.04.2026 | 18.04.2026 | 5 Tage |
| 4.3.12.2 | Grundierung + Beschichtung + trocknen | 20.04.2026 | 23.04.2026 | 3 Tage |
| 4.4 | Fertigstellung Boden | 23.04.2026 | 23.04.2026 | 0 Tage |
| 4.5 | Ausbau | 23.04.2026 | 25.07.2026 | 67 Tage |
| 4.5.1 | Treppe remontieren | 23.04.2026 | 24.04.2026 | 1 Tag |
| 4.5.2 | Schränke aufstellen | 01.05.2026 | 06.05.2026 | 3 Tage |
| 4.5.3 | ELT+EDV Leitungen verlegen | 23.04.2026 | 14.05.2026 | 15 Tage |

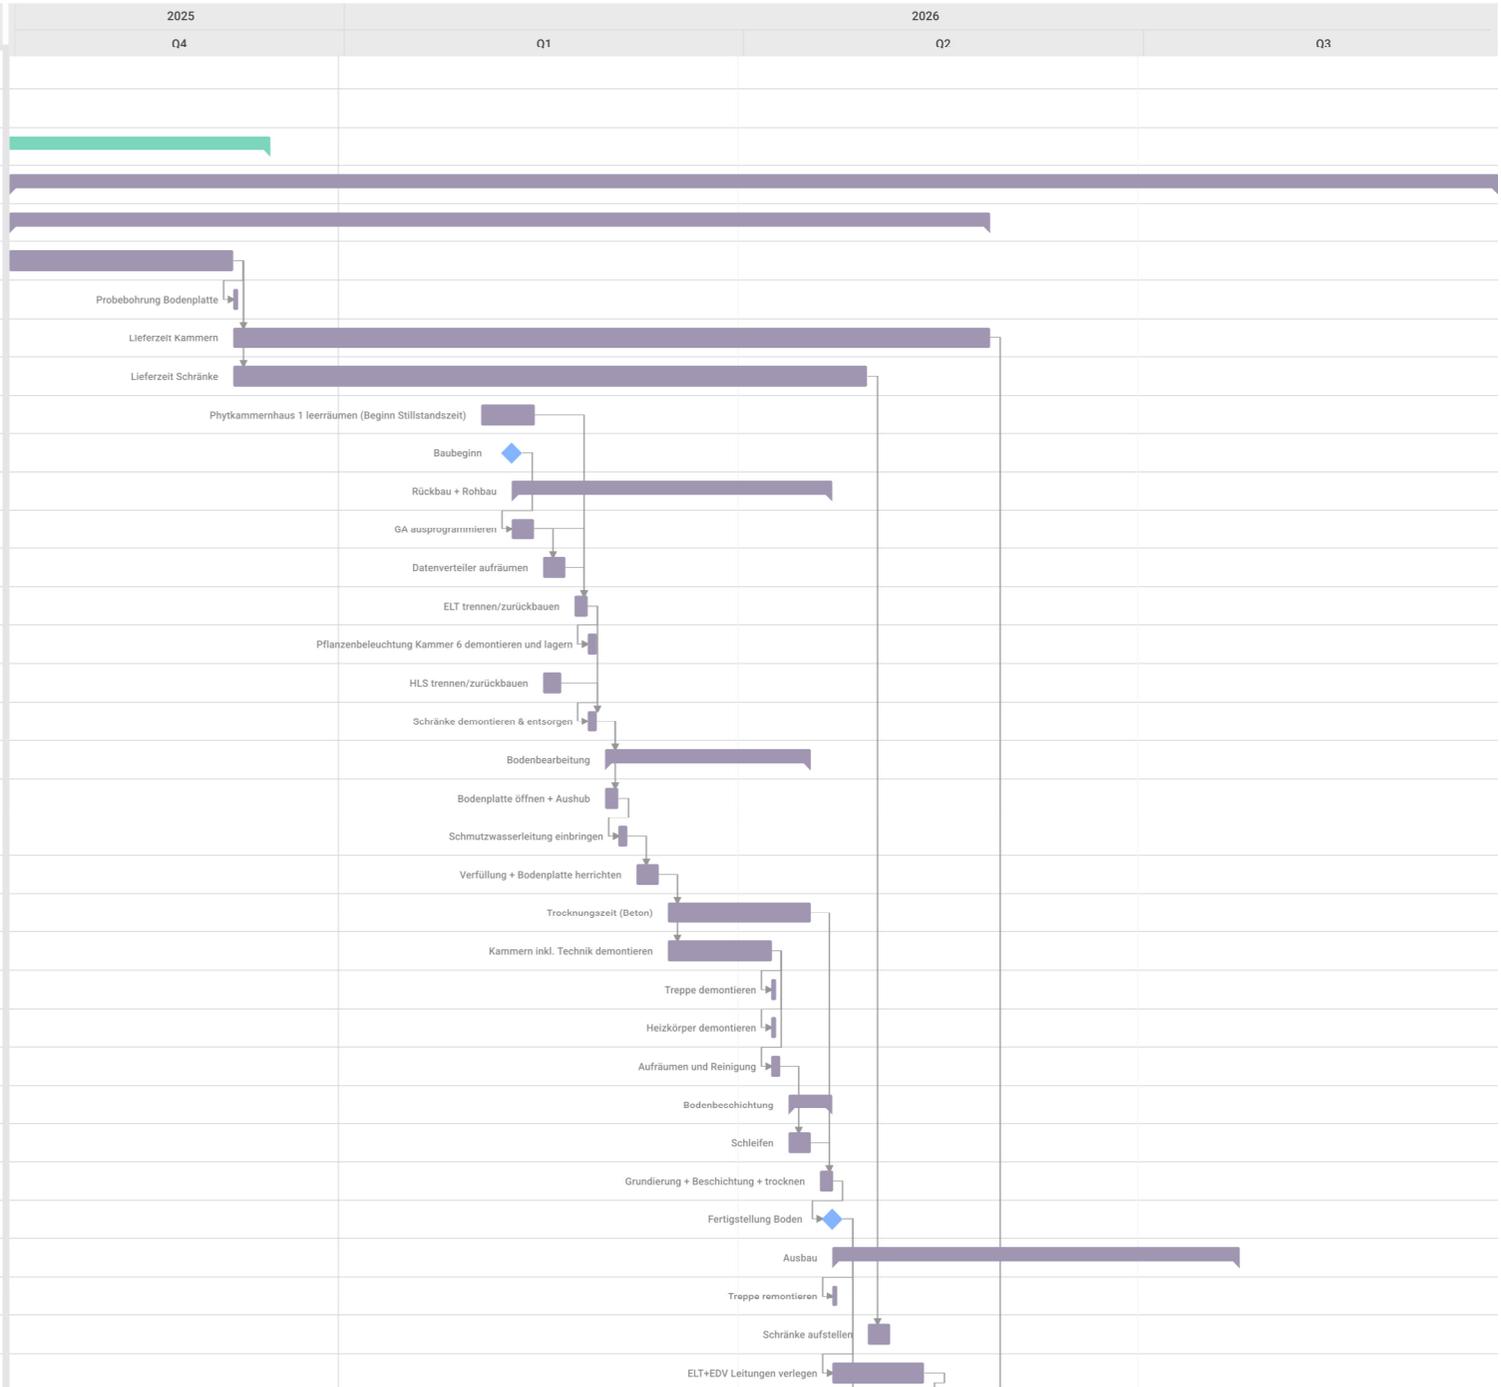



| | | | | |
|----------|--|------------|------------|----------|
| 4.5.4 | Allgemeine Beleuchtung herrichten | 14.05.2026 | 21.05.2026 | 5 Tage |
| 4.5.5 | Schränke anschließen ELT | 21.05.2026 | 23.05.2026 | 2 Tage |
| 4.5.6 | HLS Leitungstrassen verlegen | 23.04.2026 | 21.05.2026 | 20 Tage |
| 4.5.7 | Ausgussbecken herrichten | 21.05.2026 | 23.05.2026 | 2 Tage |
| 4.5.8 | Schränke anschließen HLS | 25.05.2026 | 27.05.2026 | 2 Tage |
| 4.5.9 | Kammern inkl. Technik aufbauen | 29.05.2026 | 10.07.2026 | 30 Tage |
| 4.5.10 | Kammern anschließen ELT | 10.07.2026 | 17.07.2026 | 5 Tage |
| 4.5.11 | Kammern anschließen HLS | 10.07.2026 | 25.07.2026 | 11 Tage |
| 4.5.12 | Büroraum | 25.05.2026 | 04.06.2026 | 8 Tage |
| 4.5.12.1 | ELT Demontage | 25.05.2026 | 27.05.2026 | 2 Tage |
| 4.5.12.2 | Malerarbeiten | 27.05.2026 | 30.05.2026 | 3 Tage |
| 4.5.12.3 | ELT Montage | 01.06.2026 | 04.06.2026 | 3 Tage |
| 4.5.12.4 | Heizkörper Montage | 01.06.2026 | 02.06.2026 | 1 Tag |
| 4.6 | Inbetriebnahme | 27.07.2026 | 22.09.2026 | 41 Tage |
| 4.6.1 | Kommunikation Schränke und GA-M einrichten | 27.07.2026 | 01.08.2026 | 5 Tage |
| 4.6.2 | Testbetrieb Schränke | 03.08.2026 | 05.08.2026 | 2 Tage |
| 4.6.3 | Kommunikation Kammern und GA-M einrichten | 03.08.2026 | 22.08.2026 | 15 Tage |
| 4.6.4 | Testbetrieb Kammern | 07.09.2026 | 15.09.2026 | 6 Tage |
| 4.6.5 | Puffer für bundesweite Feiertage | 15.09.2026 | 22.09.2026 | 5 Tage |
| 4.7 | Abnahme | 22.09.2026 | 22.09.2026 | 0 Tage |
| 5 | Ausführung Kälte | 16.01.2026 | 10.07.2026 | 125 Tage |

