


# BAP Neubau

SLG\_Beucha\_2025\_04\_17

Nr.	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	Okt '24   Nov '24   Dez '24   Jan '25   Feb '25													
1	Start-Bauarbeiten	0 Tage	Mon 30.09.24	Mon 30.09.24		171;2;3	30.09													
2	<b>Bauarbeiten gesamt</b>	<b>542 Tage?</b>	<b>Mon 30.09.24</b>	<b>Mon 14.12.26 1</b>			[Gantt bar from 30.09.24 to 14.12.26]													
3	<b>Baustelleneinrichtung</b>	<b>90 Tage</b>	<b>Mon 30.09.24</b>	<b>Mon 17.02.25 1</b>			[Gantt bar from 30.09.24 to 17.02.25]													
11	<b>Abbruch- und Entsorgungsarbeiten</b>	<b>49 Tage</b>	<b>Mon 11.11.24</b>	<b>Mit 29.01.25 4;7;8;9</b>			[Gantt bar from 11.11.24 to 29.01.25]													
17	<b>Erdbau</b>	<b>79 Tage</b>	<b>Fre 24.01.25</b>	<b>Mon 19.05.25 15</b>			[Gantt bar from 24.01.25 to 19.05.25]													
18	Kranstellplatz herstellen	5 Tage	Fre 24.01.25	Don 30.01.25	15	10EA+5 Tage	[Gantt bar from 24.01.25 to 30.01.25]													
19	Aushub Baugrube Neubau	10 Tage	Fre 24.01.25	Don 06.02.25	15	35;30;43;29;39	[Gantt bar from 24.01.25 to 06.02.25]													
20	Aushub Altbau/Trockenlegung	15 Tage	Don 23.01.25	Don 13.02.25			[Gantt bar from 23.01.25 to 13.02.25]													
25	Auffüllen/Trockenlegung	9 Tage	Die 20.05.25	Mon 02.06.25			[Gantt bar from 20.05.25 to 02.06.25]													
29	Kabelschutzrohr	3 Tage	Fre 07.02.25	Die 11.02.25	19	31	[Gantt bar from 07.02.25 to 11.02.25]													
30	Übergabeschacht K03 setzen	2 Tage	Fre 07.02.25	Mon 10.02.25	19	31;37	[Gantt bar from 07.02.25 to 10.02.25]													
31	Grundleitungen Neubau SW	5 Tage	Mit 12.02.25	Die 18.02.25	30;29	32	[Gantt bar from 12.02.25 to 18.02.25]													
32	Grundleitungen Neubau RW	5 Tage	Mit 19.02.25	Die 25.02.25	31	35	[Gantt bar from 19.02.25 to 25.02.25]													
33	Überganbeschacht an Kanal	3 Tage	Fre 24.01.25	Die 28.01.25			[Gantt bar from 24.01.25 to 28.01.25]													
34	Unterfangung Westseite	20 Tage	Fre 24.01.25	Don 20.02.25	21	172AA;54	[Gantt bar from 24.01.25 to 20.02.25]													
35	Auffüllung/Planum Streifenfundamente/Aufzugunterfal	5 Tage	Mit 26.02.25	Die 04.03.25	19;32	55;56	[Gantt bar from 26.02.25 to 04.03.25]													
36	Auffüllung/Planum Bodenplatte/Verdickung	5 Tage	Mit 12.03.25	Die 18.03.25	55	57;44;41	[Gantt bar from 12.03.25 to 18.03.25]													
37	Grundleitung allgemein	10 Tage	Die 11.02.25	Mon 24.02.25	30	41	[Gantt bar from 11.02.25 to 24.02.25]													
38	<b>Wasserhaltung</b>	<b>69 Tage</b>	<b>Don 06.02.25</b>	<b>Mon 19.05.25 41</b>			[Gantt bar from 06.02.25 to 19.05.25]													
39	Beginn	0 Tage	Don 06.02.25	Don 06.02.25	19		[Milestone diamond at 06.02.25]													
40	Ende	0 Tage	Mon 19.05.25	Mon 19.05.25	28		[Milestone diamond at 19.05.25]													
41	Ende Erdbau	0 Tage	Mon 19.05.25	Mon 19.05.25	36;37;38		[Milestone diamond at 19.05.25]													
42	<b>Trafo</b>	<b>5 Tage</b>	<b>Mon 02.06.25</b>	<b>Fre 06.06.25</b>			[Gantt bar from 02.06.25 to 06.06.25]													
43	<b>Neubau BA2</b>	<b>369 Tage?</b>	<b>Fre 21.02.25</b>	<b>Fre 21.08.26 19</b>			[Gantt bar from 21.02.25 to 21.08.26]													
44	<b>Gerüstbau</b>	<b>158 Tage</b>	<b>Fre 25.04.25</b>	<b>Mit 10.12.25 36;60</b>		<b>315</b>	[Gantt bar from 25.04.25 to 10.12.25]													
45	1.EG	1 Tag	Fre 25.04.25	Fre 25.04.25	61	67	[Gantt bar from 25.04.25 to 25.04.25]													
46	2.EG	1 Tag	Mon 19.05.25	Mon 19.05.25	67	70	[Gantt bar from 19.05.25 to 19.05.25]													
47	3.EG	1 Tag	Don 05.06.25	Don 05.06.25	69		[Gantt bar from 05.06.25 to 05.06.25]													
48	Abrüsten Achse 2, 6, 8	1 Tag	Mon 16.06.25	Mon 16.06.25	71		[Gantt bar from 16.06.25 to 16.06.25]													
49	Achse A und E rüsten EG	1 Tag	Don 07.08.25	Don 07.08.25	79	80	[Gantt bar from 07.08.25 to 07.08.25]													
50	Achse A und E rüsten 1.OG	1 Tag	Die 19.08.25	Die 19.08.25	81	82	[Gantt bar from 19.08.25 to 19.08.25]													
51	Achse A und E rüsten 2.OG	1 Tag	Fre 29.08.25	Fre 29.08.25	83	84	[Gantt bar from 29.08.25 to 29.08.25]													
52	Abbau im Zuge der Fassadenarbei	5 Tage	Don 04.12.25	Mit 10.12.25	86;88		[Gantt bar from 04.12.25 to 10.12.25]													
53	<b>Rohbau</b>	<b>76 Tage</b>	<b>Fre 21.02.25</b>	<b>Fre 13.06.25</b>		<b>10AA-5 Tage</b>	[Gantt bar from 21.02.25 to 13.06.25]													
54	Gr.Bestand Betonrahmenfundam	2 Tage	Fre 21.02.25	Mon 24.02.25	34	56	[Gantt bar from 21.02.25 to 24.02.25]													
55	Streifenfundamente/Aufzugunter	5 Tage	Mit 05.03.25	Die 11.03.25	35	36	[Gantt bar from 05.03.25 to 11.03.25]													
56	neue Wandscheibe Altbau	25 Tage	Mon 31.03.25	Mit 07.05.25	54;35	64;203EA+10 Tage;2!	[Gantt bar from 31.03.25 to 07.05.25]													

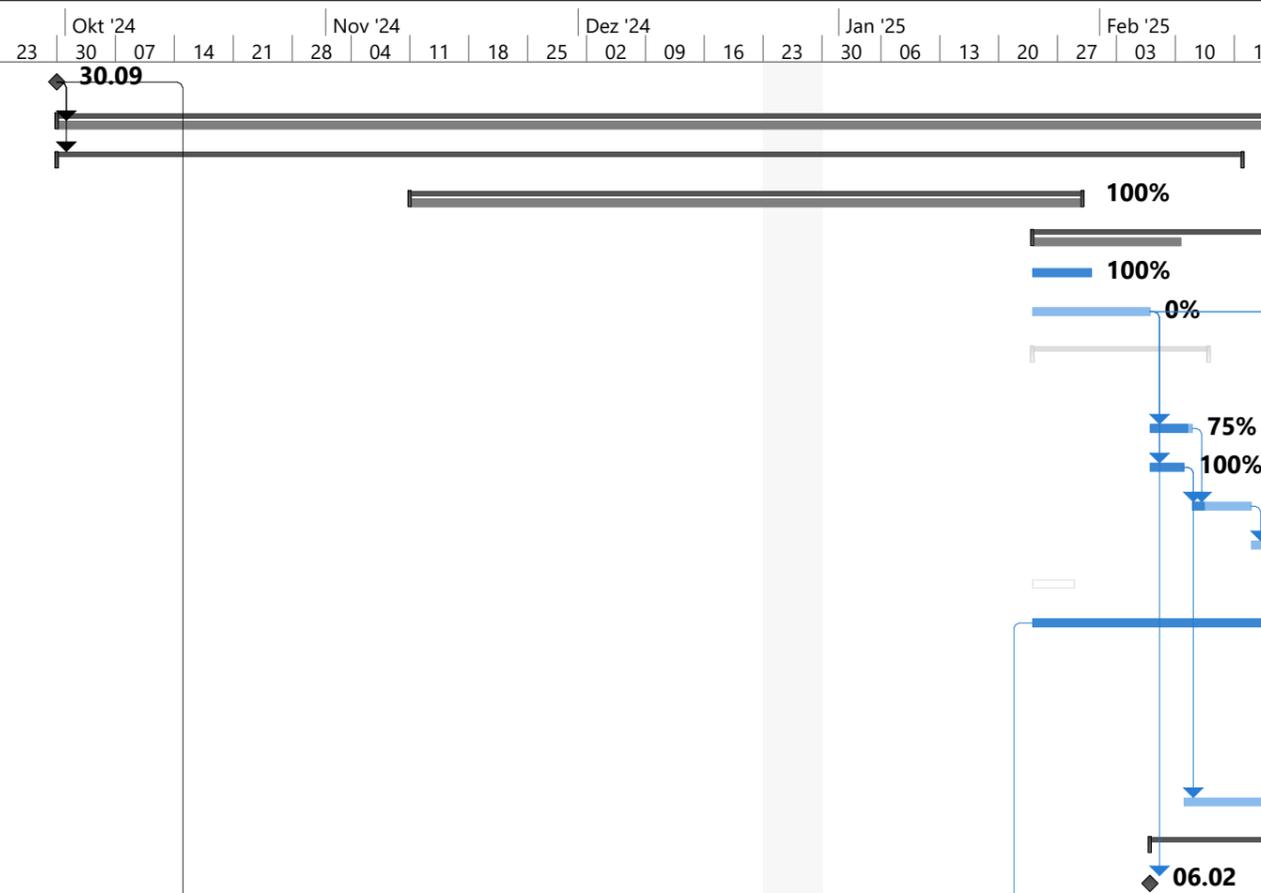

Kritisch		Vorgang in Arbeit		Geplant		Sammelvorgang		Inaktiver Vorgang	
Kritische Unterbrechung		Manueller Vorgang		Geplante Unterbrechung		Manueller Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein	
Kritisch in Arbeit		Nur Anfang		Geplanter Meilenstein		Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang	
Vorgang		Nur Ende		Meilenstein		Externe Vorgänge		Stichtag	
Unterbrechung		Nur Dauer		Sammelvorgang in Arbeit		Externer Meilenstein			

# BAP Neubau

SLG\_Beucha\_2025\_04\_17

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	Okt '24			Nov '24			Dez '24			Jan '25			Feb '25					
							23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20
57	Sauberkeitsschicht Bodenplatte	2 Tage	Mit 19.03.25	Don 20.03.25	36	59																		
58	Erdung	1 Tag	Die 25.03.25	Die 25.03.25	59AA+2 Tage																			
59	Bodenplatte, E	10 Tage	Fre 21.03.25	Don 03.04.25	57	60;63;58AA+2 Tage																		
60	Stb EG Wände/Stützen/Sockel	8 Tage	Fre 04.04.25	Die 15.04.25	59	61;64;44																		
61	Decke/UZ über EG	5 Tage	Mit 16.04.25	Don 24.04.25	60	62;64;66;45																		
62	FT-Treppen EG	2 Tage	Fre 25.04.25	Mon 28.04.25	61	64																		
63	Brückenstützen	2 Tage	Fre 04.04.25	Mon 07.04.25	59	64																		
64	Brücke	15 Tage	Don 08.05.25	Mit 28.05.25	60;61;62;63;56	65																		
65	Brücke Sockel	10 Tage	Fre 30.05.25	Fre 13.06.25	64	71																		
66	1. OG Wände	10 Tage	Fre 25.04.25	Fre 09.05.25	61	67																		
67	Decke über 1. OG	5 Tage	Mon 12.05.25	Fre 16.05.25	66;45	68;69;46																		
68	FT-Treppen 1. OG	2 Tage	Mon 19.05.25	Die 20.05.25	67	69																		
69	2. OG Wände	10 Tage	Mit 21.05.25	Mit 04.06.25	67;68	70;47																		
70	Decke über 2. OG	5 Tage	Don 05.06.25	Don 12.06.25	69;46	71																		
71	Ende Rohbau	0 Tage	Fre 13.06.25	Fre 13.06.25	70;65	48																		
72	<b>Fertigteilmontage</b>																							
73	Freigabe Prüfstatiker	1 Tag	Mit 30.04.25	Mit 30.04.25		74																		
74	Bestellvorgang	60 Tage	Fre 02.05.25	Mon 28.07.25	73	75;78																		
75	<b>Stahlbau</b>	<b>12 Tage</b>	<b>Die 29.07.25</b>	<b>Mit 13.08.25</b>	<b>74</b>																			
76	Montage EG Stützen/Unterzüge	2 Tage	Die 29.07.25	Mit 30.07.25		79;80																		
77	Montage 1. OG Stützen/Unterzüge	2 Tage	Die 12.08.25	Mit 13.08.25	80																			
78	<b>Massivholzbau</b>	<b>37 Tage</b>	<b>Don 31.07.25</b>	<b>Fre 19.09.25</b>	<b>74</b>																			
79	Montage EG/Wände/Stützen/Unt	5 Tage	Don 31.07.25	Mit 06.08.25	76	80;49																		
80	Decke über EG	2 Tage	Fre 08.08.25	Mon 11.08.25	76;79;49	77;81																		
81	Montage 1. OG/Wände/Stützen/	5 Tage	Die 12.08.25	Mon 18.08.25	80	50;82																		
82	Decke über 1. OG	2 Tage	Mit 20.08.25	Don 21.08.25	50;81	83																		
83	Montage DG/Wände/Stützen/Unt	5 Tage	Fre 22.08.25	Don 28.08.25	82	51;84																		
84	Montage Dach Sparren/Kehlba	15 Tage	Mon 01.09.25	Fre 19.09.25	51;83	86;85																		
85	Ende Fertigteilmontage	0 Tage	Fre 19.09.25	Fre 19.09.25	84	88																		
86	Dach	50 Tage	Mon 22.09.25	Mit 03.12.25	84	91EA-30 Tage;52;87E																		
87	PV-Anlage	15 Tage	Don 20.11.25	Mit 10.12.25	86EA-10 Tage																			
88	Fenster/Türen Außenhülle	10 Tage	Mon 22.09.25	Mon 06.10.25	85	97;52																		
89	<b>Außenbereiche Gebäude</b>	<b>60 Tage</b>	<b>Mon 22.09.25</b>	<b>Mit 17.12.25</b>																				
90	Geländer	10 Tage	Mon 22.09.25	Die 07.10.25	91AE-10 Tage	96																		
91	Laubengang	15 Tage	Die 21.10.25	Die 11.11.25	86EA-30 Tage	92;90AE-10 Tage																		
92	Terrasse Achse 1-6	20 Tage	Mit 12.11.25	Mit 10.12.25	91	95;93;94																		
93	Loggia Achse 3-4	5 Tage	Don 11.12.25	Mit 17.12.25	92																			
94	Loggia Achse 11-12	5 Tage	Don 11.12.25	Mit 17.12.25	92																			
95	Lager	5 Tage	Don 11.12.25	Mit 17.12.25	92																			

Kritisch		Vorgang in Arbeit		Geplant		Sammelvorgang		Inaktiver Vorgang	
Kritische Unterbrechung		Manueller Vorgang		Geplante Unterbrechung		Manueller Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein	
Kritisch in Arbeit		Nur Anfang		Geplanter Meilenstein		Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang	
Vorgang		Nur Ende		Meilenstein		Externe Vorgänge		Stichtag	
Unterbrechung		Nur Dauer		Sammelvorgang in Arbeit		Externer Meilenstein			



