















I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Haltepunkt	Verantwortlich	Beteiligte	Dauer	Anfang	1984 1984
1		Terminplan I-58 Antonienstraße (Adler - Klingenstraße)				2091 Tage	Don 13.04.23	
2		Planungsvorbereitung				590 Tage	Don 13.04.23	
3		Beschluss SG zum Projektstart	HP	SG Infra-K		0 Tage	Don 13.04.23	
4		Projektstart technische Planung				222 Tage	Don 21.03.24	
5		Auftaktveranstaltung		GPL	TPL	1 Tag	Don 21.03.24	
6		Auswertung Phase Null - Bestandssanierung		Orga-Team Phase Null		24 Tage	Fre 22.03.24	
7		Planung Grobstruktur Teilprojekte		TPL		40 Tage	Fre 22.03.24	
30		Planung Grobstruktur Gesamtprojekt		GPL		71 Tage	Fre 24.05.24	
31		Zusammenfassung Grundbedarf				56 Tage	Fre 24.05.24	
32		Auftakt Grobstruktur				1 Tag	Fre 24.05.24	
33		Finalisierung Bedarfe TP				10 Tage	Mon 27.05.24	
34		Zusammenfassung der TP Grundbedarfe		GPL	TPL	20 Tage	Mon 10.06.24	
35		Erstellung Gesamtprojektumgriff inkl. Phase Null		GPL	TPL	5 Tage	Mon 08.07.24	
36		Erstellung Aufgabenstellung für gemeinsame Vermessung		GPL	TPL	20 Tage	Mon 15.07.24	














I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Haltepunkt	Verantwortlich	Beteiligte	Dauer	Anfang	1984 1984
37		Zusammenfassung Stakeholder/Abhängigkeiten				20 Tage	Mon 15.07.24	
38		Erstellen Auflagen- bzw. Abwägungsmatrix		GPL	TPL	20 Tage	Mon 15.07.24	
39		Zusammenstellen benötigter Verfahren und Beschlüsse inkl. zeitlicher Einordnung		GPL	TPL	20 Tage	Mon 15.07.24	
40		Zusammenfassung Zeitbedarf/Erstellung Steuerungsterminplan		GPL	TPL;Pro	5 Tage	Fre 24.05.24	
41		Zusammenfassung Finanzbedarf und Entscheidung zum Vergabeverfahren				71 Tage	Fre 24.05.24	
42		Dokumentation Prüfergebnisse Förderfähigkeit		GPL	TPL	5 Tage	Fre 24.05.24	
43		Zusammenstellung voraussichtliche Gesamtkosten/Förderfähigkeit und Übergabe an Vergabestelle		GPL	TPL	5 Tage	Fre 31.05.24	
44		Entscheidung zu erforderlichen Vergabeverfahren Planung und Bau		Vergabestelle	GPL	15 Tage	Mon 12.08.24	
45		Finalisierung Grobstruktur		GPL	TPL	100 Tage	Mon 02.09.24	
46		Finalisierung Projektauftrag und Vorstellung in der SG Infra-K		GPL	TPL;SG Infra-K	0 Tage	Mon 10.02.25	
47		Bestätigung Projektauftrag/Projektumgriff		SG Infra-K	GPL	1 Tag	Mon 10.02.25	
48		Budgetfreigabe LP 1 und 2				28 Tage	Die 11.02.25	
49		Kommunalw Wasserwerke Leipzig GmbH		TPL LWW		1 Tag	Die 11.02.25	















I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Haltepunkt	Verantwortlich	Beteiligte	Dauer	Anfang	1984 1984
50		Netz Leipzig GmbH		TPL NL		1 Tag	Die 11.02.25	
51		Vergabe Planungsleistung (VGV/Sekt VO)		Vergabestelle	GPL;TPL	130 Tage	Mit 12.02.25	
52		Vergabe und Durchführung Vermessung		GPL	TPL VTA;TPL	80 Tage	Die 11.02.25	
53		Abschluss Projektstart	HP			0 Tage	Die 19.08.25	
54		LP 1+2 Grundlagenermittlung + Vorplanung				376 Tage	Mit 20.08.25	
55		Planungsanlaufberatung		GPL	TPL;Planer	5 Tage	Mit 20.08.25	
56		LP 1 - Grundlagenermittlung				20 Tage	Mit 27.08.25	
57		Koordiniertes Baugrundgutachten		GPL	TPL	80 Tage	Mit 24.09.25	
58		LP 2 - Vorplanung				371 Tage	Mit 27.08.25	
94		Abschluss LP 1+2 Grundlagenermittlung + Vorplanung	HP			0 Tage	Fre 18.12.26	
95		LP 3 Entwurfsplanung				396 Tage	Mon 21.12.26	
96		Entwurfsplanung				241 Tage	Mon 21.12.26	
97		TP Stadt Leipzig				175 Tage	Mon 21.12.26	
98		technische Entwurfsplanung erstellen		TPL VTA	Planer	160 Tage	Mon 21.12.26	















I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Haltepunkt	Verantwortlich	Beteiligte	Dauer	Anfang	1984 1984
99		Fachplanungen mit Abhängigkeiten zum stabilen Lageplan erstellen (z.B. Umwelt, LSA, Schall, Beleuchtung, ...)		TPL VTA	Planer	100 Tage	Mit 17.03.27	
100		Vorlage Leseexemplar Entwurfsplanung inkl. Kostenberechnung, Verkehrskonzept und Bauphasen-/		TPL VTA	Planer	0 Tage	Mon 09.08.27	
101		Prüflauf Leseexemplar Entwurfsplanung		TPL VTA	VTA	15 Tage	Die 10.08.27	
102		TP LVB				175 Tage	Mon 21.12.26	
103		technische Entwurfsplanung erstellen		TPL LVB	Planer	160 Tage	Mon 21.12.26	
104		Fachplanungen mit Abhängigkeiten zum stabilen Lageplan erstellen (z.B. Umwelt, Baugrund, LSA, Schall, Beleuchtung, Fahrleitung, Gleis, ...)		TPL LVB	Planer	100 Tage	Mit 17.03.27	
105		Vorlage Leseexemplar Entwurfsplanung inkl. Kostenberechnung, Verkehrskonzept und Bauphasen-/		TPL LVB	Planer	0 Tage	Mon 09.08.27	
106		Prüflauf Leseexemplar Entwurfsplanung		TPL LVB	LVB	15 Tage	Die 10.08.27	
107		TP LWW				175 Tage	Mon 21.12.26	
112		TP NL				175 Tage	Mon 21.12.26	
117		GP				115 Tage	Die 16.03.27	
118		Übergabe Leseexemplar EP				0 Tage	Die 03.08.27	
119		Vorlage stabiler Lageplan		TPL VTA; TPL LVB	Planer	0 Tage	Die 16.03.27	















I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Haltepunkt	Verantwortlich	Beteiligte	Dauer	Anfang	1984 1984
120		Vorlage Koordinierter Leitungsplan		VTA 66.22	Leitung	0 Tage	Mon 09.08.27	
121		Vorlage Bauablaufplanung inkl. Verkehrskonzeption		GPL	TPL;Pla	0 Tage	Mon 09.08.27	
122		Vorlage Entwurfsplanungen TP		GPL	TPL;Pla	0 Tage	Mon 30.08.27	
123		Entwurfsplanungsworkshop				51 Tage	Mon 06.09.27	
124		Auftaktveranstaltung WS EP		GPL	Stakehc	0 Tage	Mon 06.09.27	
125		Übergabe koordinierte Stellungnahme an GPL		GPL	Stakehc	20 Tage	Die 07.09.27	
126		Auswertung Feedback und Vorbereitung 2. Termin		GPL	TPL;Pla	10 Tage	Die 05.10.27	
127		Auswertungs- und Beschlussveranstaltung		GPL	Stakehc	1 Tag	Die 19.10.27	
128		technische Entwurfsplanung LP3 finalisieren		GPL	TPL;Pla	20 Tage	Mit 20.10.27	
129		Bestätigung EP in der Projektkonferenz Dezernat VI		TPL VTA	GPL;TPL	0 Tage	Mit 01.12.27	
130		Finanzierung				296 Tage	Mit 17.03.27	
158		Abschluss LP3 - Vorlage Bau- und Finanzierungsbeschluss Ratsversammlung	HP	VTA	TPL VTA	0 Tage	Mon 15.05.28	
159		Bürgerinformation		AG Kommunikation	GPL;TPL	40 Tage	Die 16.05.28	
160		LP 4 Genehmigungsplanung				415 Tage	Die 16.05.28	

I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Haltepunkt	Verantwortlich	Beteiligte	Dauer	Anfang	1984 1984
161		TP Stadt Leipzig				285 Tage	Die 16.05.28	
162		Fördermittelantrag				135 Tage	Die 16.05.28	
167		Genehmigungsplanung				285 Tage	Die 16.05.28	
168		Abstimmung Stakeholder auf Basis EP		TPL VTA	Stakeholder	40 Tage	Die 16.05.28	
169		Einreichung Entwurfsplanung		TPL VTA	Stakeholder	0 Tage	Mit 12.07.28	
170		Genehmigungsverfahren (denkmalschutzrechtliche-, wasserschutzrechtliche-, ... -Genehmigung)		Stakeholder	TPL VTA	60 Tage	Don 13.07.28	
171		Information Fachausschuss Stadtentwicklung Bau zur Stellungnahme Planfeststellungsverfahren der LVB		VTA 66	TPL VTA	10 Tage	Fre 22.06.29	
172		TP LVB				415 Tage	Die 16.05.28	
173		Fördermittelantrag				415 Tage	Die 16.05.28	
178		Planfeststellungsverfahren				415 Tage	Die 16.05.28	
179		Erstellung Genehmigungsplanung		Planer	TPL LVB	60 Tage	Die 16.05.28	
180		Vorlage Leseexemplar Genehmigungsplanung		Planer	TPL LVB	0 Tage	Mit 09.08.28	
181		Prüflauf Leseexemplar Genehmigungsplanung		TPL LVB	LVB	15 Tage	Don 10.08.28	
182		Abstimmung Genehmigung (LD-S)		TPL LVB	LD-S	20 Tage	Don 31.08.28	

I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Haltepunkt	Verantwortlich	Beteiligte	Dauer	Anfang	1984 1984
183		Finalisierung Genehmigungsplanung		Planer	TPL LVB	20 Tage	Don 28.09.28	
184		Antragstellung auf Baurecht		TPL LVB		0 Tage	Don 26.10.28	
185		Anhörungsverfahren (Planfeststellung)		LD-S	Stakeho LVB	280 Tage	Fre 27.10.28	
186		Vorlage Planfeststellungsbeschluss		LD-S	TPL LVB	0 Tage	Die 11.12.29	
187		Bestandskraft Planfeststellung		LD-S	TPL LVB	20 Tage	Mit 12.12.29	
188		TP LWW				180 Tage	Die 16.05.28	
193		TP NL				180 Tage	Die 16.05.28	
198		Abschluss LP 4 Genehmigungsplanung - Vorlage Genehmigungen	HP			0 Tage	Fre 11.01.30	
199		LP 5 Ausführungsplanung				180 Tage	Fre 31.08.29	
200		TP Stadt Leipzig				140 Tage	Fre 31.08.29	
201		Erstellung Ausführungsplanung		Planer	TPL VTA	110 Tage	Fre 31.08.29	
202		Vorlage Leseexemplar Ausführungsplanung		Planer	TPL VTA	0 Tage	Fre 08.02.30	
203		Prüflauf Leseexemplar Ausführungsplanung		TPL VTA	VTA	15 Tage	Mon 11.02.30	
204		Finalisierung Ausführungsplanung		Planer	TPL VTA	15 Tage	Mon 04.03.30	















I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Haltepunkt	Verantwortlich	Beteiligte	Dauer	Anfang	1984 1984
205		Erarbeitung Koordinierungsverträge		VTA 66.22	Stakehc	20 Tage	Mon 11.02.30	
206		Vorlage Koordinierungsverträge		VTA 66.22	Stakehc	0 Tage	Fre 08.03.30	
207		Unterschriftenlauf Koordinierungsverträge		VTA 66.22	Stakehc	10 Tage	Mon 11.03.30	
208		Finalisierung bilateraler Kostenteilungsvereinbarung		TPL VTA	TPL LVB	20 Tage	Mon 11.02.30	
209		Unterschriftenlauf bilateraler Kostenteilungsvereinbarung		TPL VTA	TPL LVB	10 Tage	Mon 11.03.30	
210		TP LVB				180 Tage	Fre 31.08.29	
211		Erstellung Ausführungsplanung		Planer	TPL LVB	110 Tage	Fre 31.08.29	
212		Vorlage Leseexemplar Ausführungsplanung		Planer	TPL LVB	0 Tage	Fre 08.02.30	
213		Prüflauf Leseexemplar Ausführungsplanung		TPL LVB	LVB	15 Tage	Mon 11.02.30	
214		Finalisierung Ausführungsplanung		Planer	TPL LVB	15 Tage	Mon 04.03.30	
215		Finalisierung bilateraler Kostenteilungsvereinbarungen		TPL LVB	Stakehc	20 Tage	Mon 11.02.30	
216		Unterschriftenlauf bilateraler Kostenteilungsvereinbarungen		TPL LVB	Stakehc	10 Tage	Mon 11.03.30	
217		Beantragung Zustimmung TAB		TPL LVB	Planer	0 Tage	Fre 22.03.30	
218		Bearbeitung TAB		TAB	TPL LVB	40 Tage	Mon 25.03.30	




I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Haltepunkt	Verantwortlich	Beteiligte	Dauer	Anfang	1984
219		Vorlage Zustimmung TAB				0 Tage	Mit 22.05.30	1984
220		TP LWW				180 Tage	Fre 31.08.29	
229		TP NL				140 Tage	Fre 31.08.29	
236		GP				70 Tage	Mon 11.02.30	
243		Abschluss LP 5 Ausführungsplanung - Vorlage Verträge aller Partner	HP			0 Tage	Mit 22.05.30	
244		LP 6 Vorbereitung der Vergabe				120 Tage	Don 23.05.30	
245		TP Stadt Leipzig				100 Tage	Don 23.05.30	
246		Erstellung Vergabeunterlagen		Planer	TPL	60 Tage	Don 23.05.30	
247		Prüflauf Vergabeunterlagen		VTA 66.30	TPL	30 Tage	Mon 19.08.30	
248		Finalisierung Vergabeunterlagen		Planer	TPL	10 Tage	Mon 30.09.30	
249		Vorlage Vergabeunterlagen				0 Tage	Mon 14.10.30	
250		TP LVB				100 Tage	Don 23.05.30	
255		TP LWW				100 Tage	Don 23.05.30	
260		TP NL				100 Tage	Don 23.05.30	


I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Haltepunkt	Verantwortlich	Beteiligte	Dauer	Anfang	1984 1984
265		GP				120 Tage	Don 23.05.30	
266		Bauleistungen				60 Tage	Mon 19.08.30	
271		Ingenieurleistungen Baudurchführung				10 Tage	Don 23.05.30	
274		Abschluss LP 6 Vorbereitung Vergabe	HP			0 Tage	Die 12.11.30	
275		LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe				164 Tage	Mit 13.11.30	
276		Direktvergabe Bauleistungen/Beistellung Material/Rahmenverträge/Vergabe an Tochterfirmen		Vergabestelle	TPL	45 Tage	Fre 04.04.31	
277		Zuschlag Direktvergabe		Vergabestelle		0 Tage	Don 12.06.31	
278		Vergabe von Ingenieurleistungen Baudurchführung (VGV/Sekt VO)		Vergabestelle	GPL;TPL	130 Tage	Die 03.12.30	
279		Zuschlag Ingenieurleistungen		Vergabestelle		0 Tage	Don 12.06.31	
280		Vergabe von Bauleistungen nach VOB (gemeinsame Leistungen oberhalb EU Schwellenwert)				144 Tage	Mit 13.11.30	
291		Vergabe von Versicherungsleistungen		TPL LVB	TPL	20 Tage	Fre 13.06.31	
292		Zuschlag Versicherungsleistung		LVB		0 Tage	Don 10.07.31	
293		Abschluss LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe	HP			0 Tage	Don 12.06.31	
294		LP 8 Bauausführung				40 Tage	Fre 13.06.31	


I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Haltepunkt	Verantwortlich	Beteiligte	Dauer	Anfang	1984 1984
295		Bauvorbereitungszeit				40 Tage	Fre 13.06.31	
296		Bürgerinformation		AG Kommunikation	GPL;TPL	20 Tage	Fre 13.06.31	
297		Baubeginn erfolgt	HP			0 Tage	Don 07.08.31	


I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

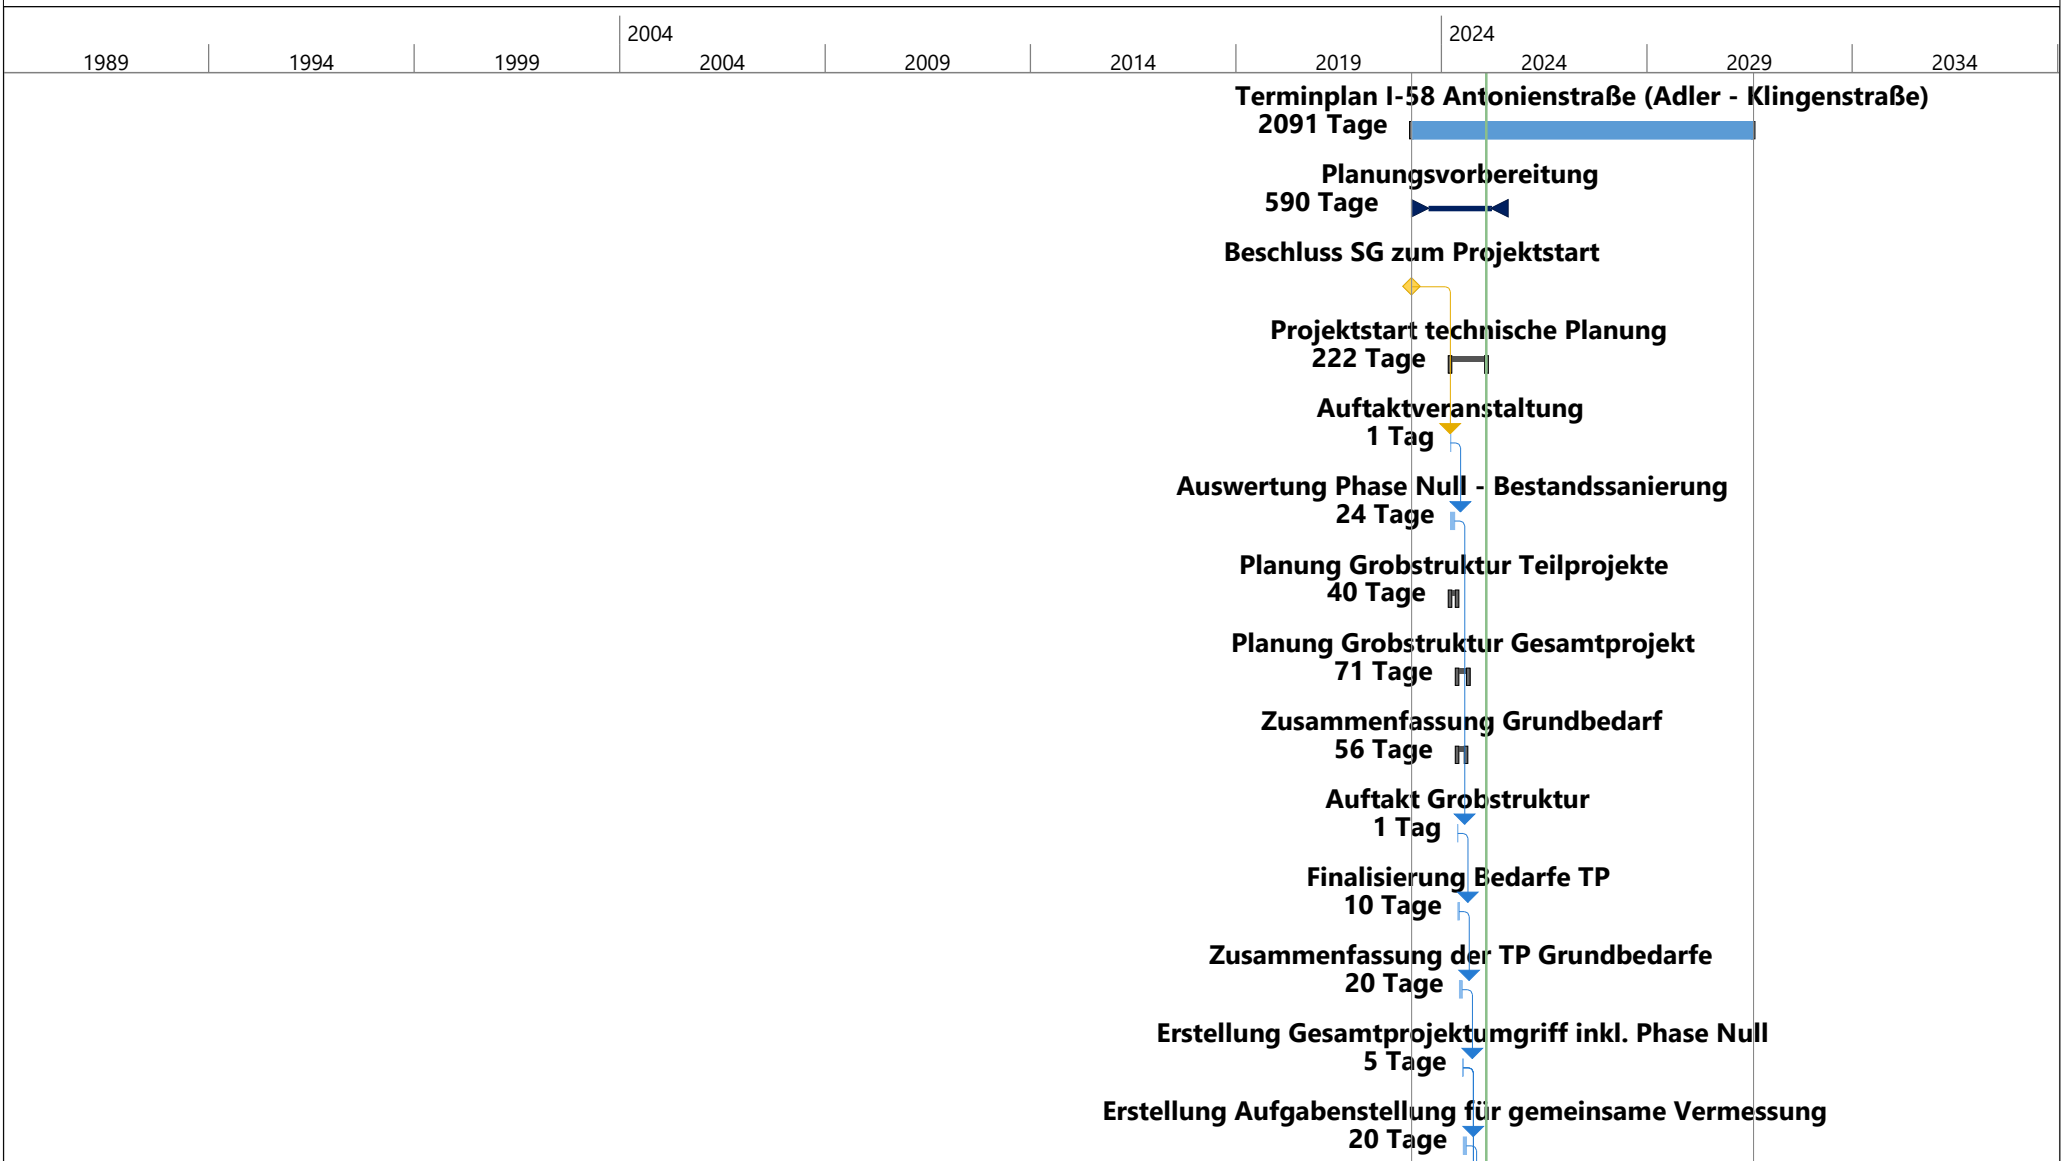


I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

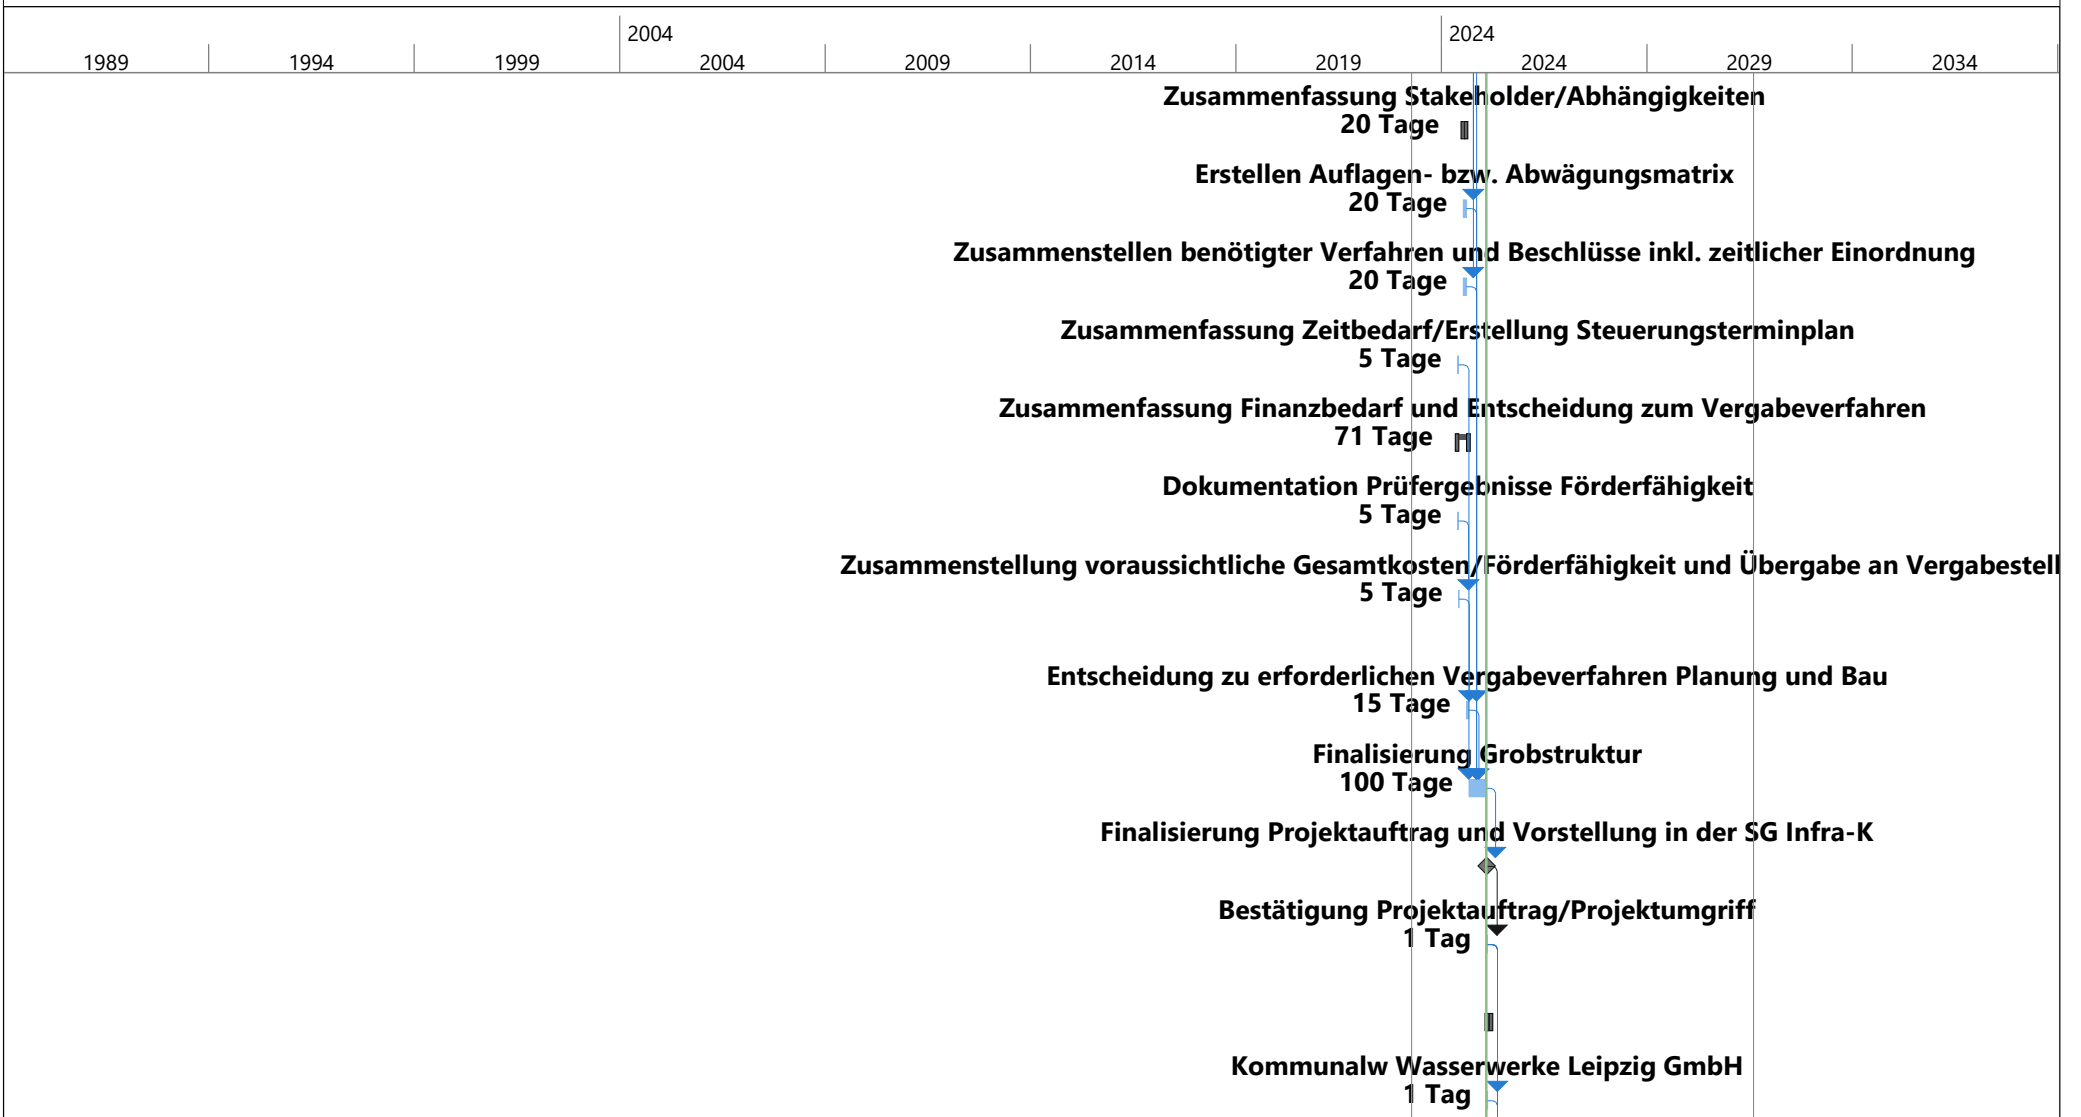


I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

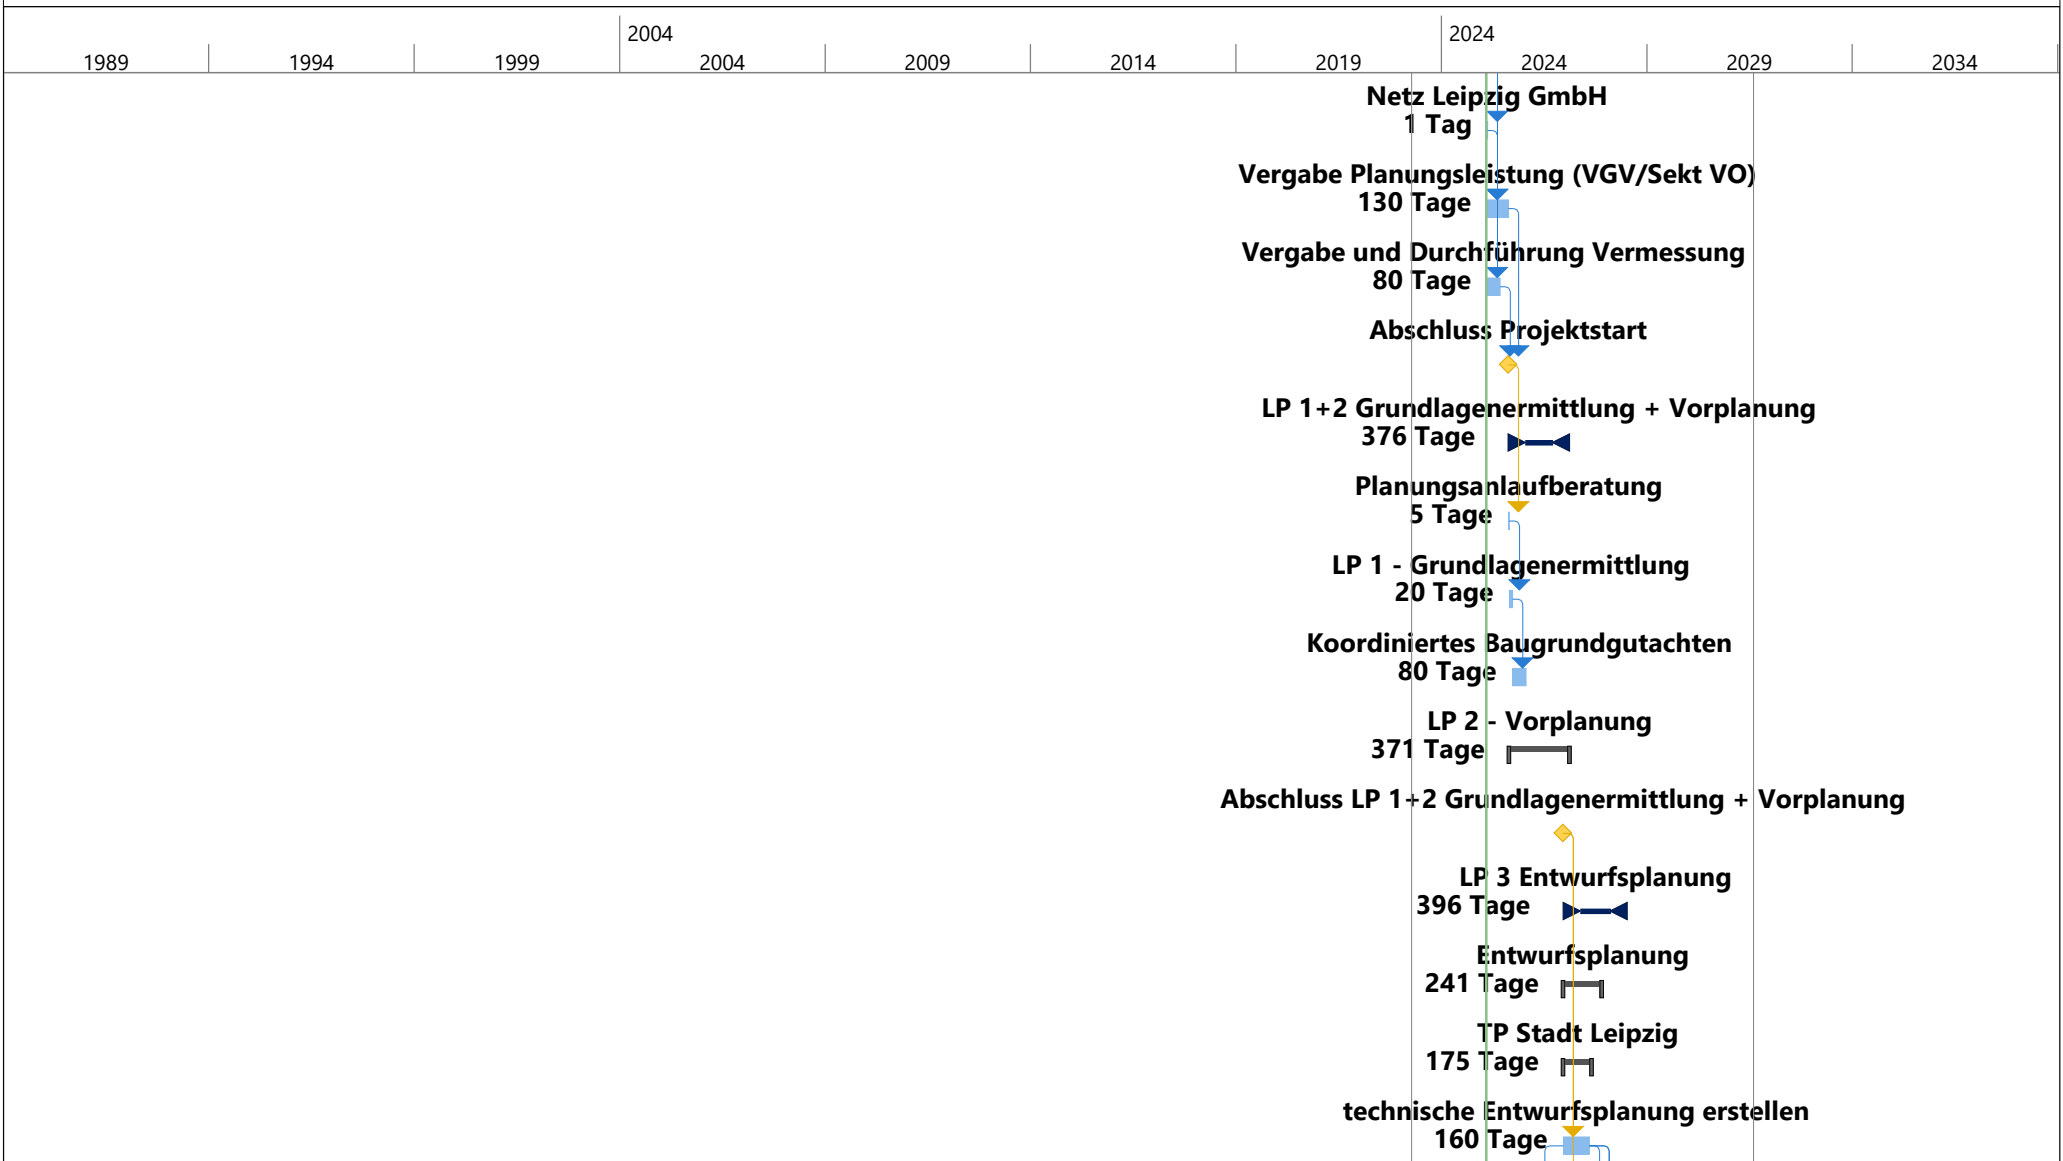


I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

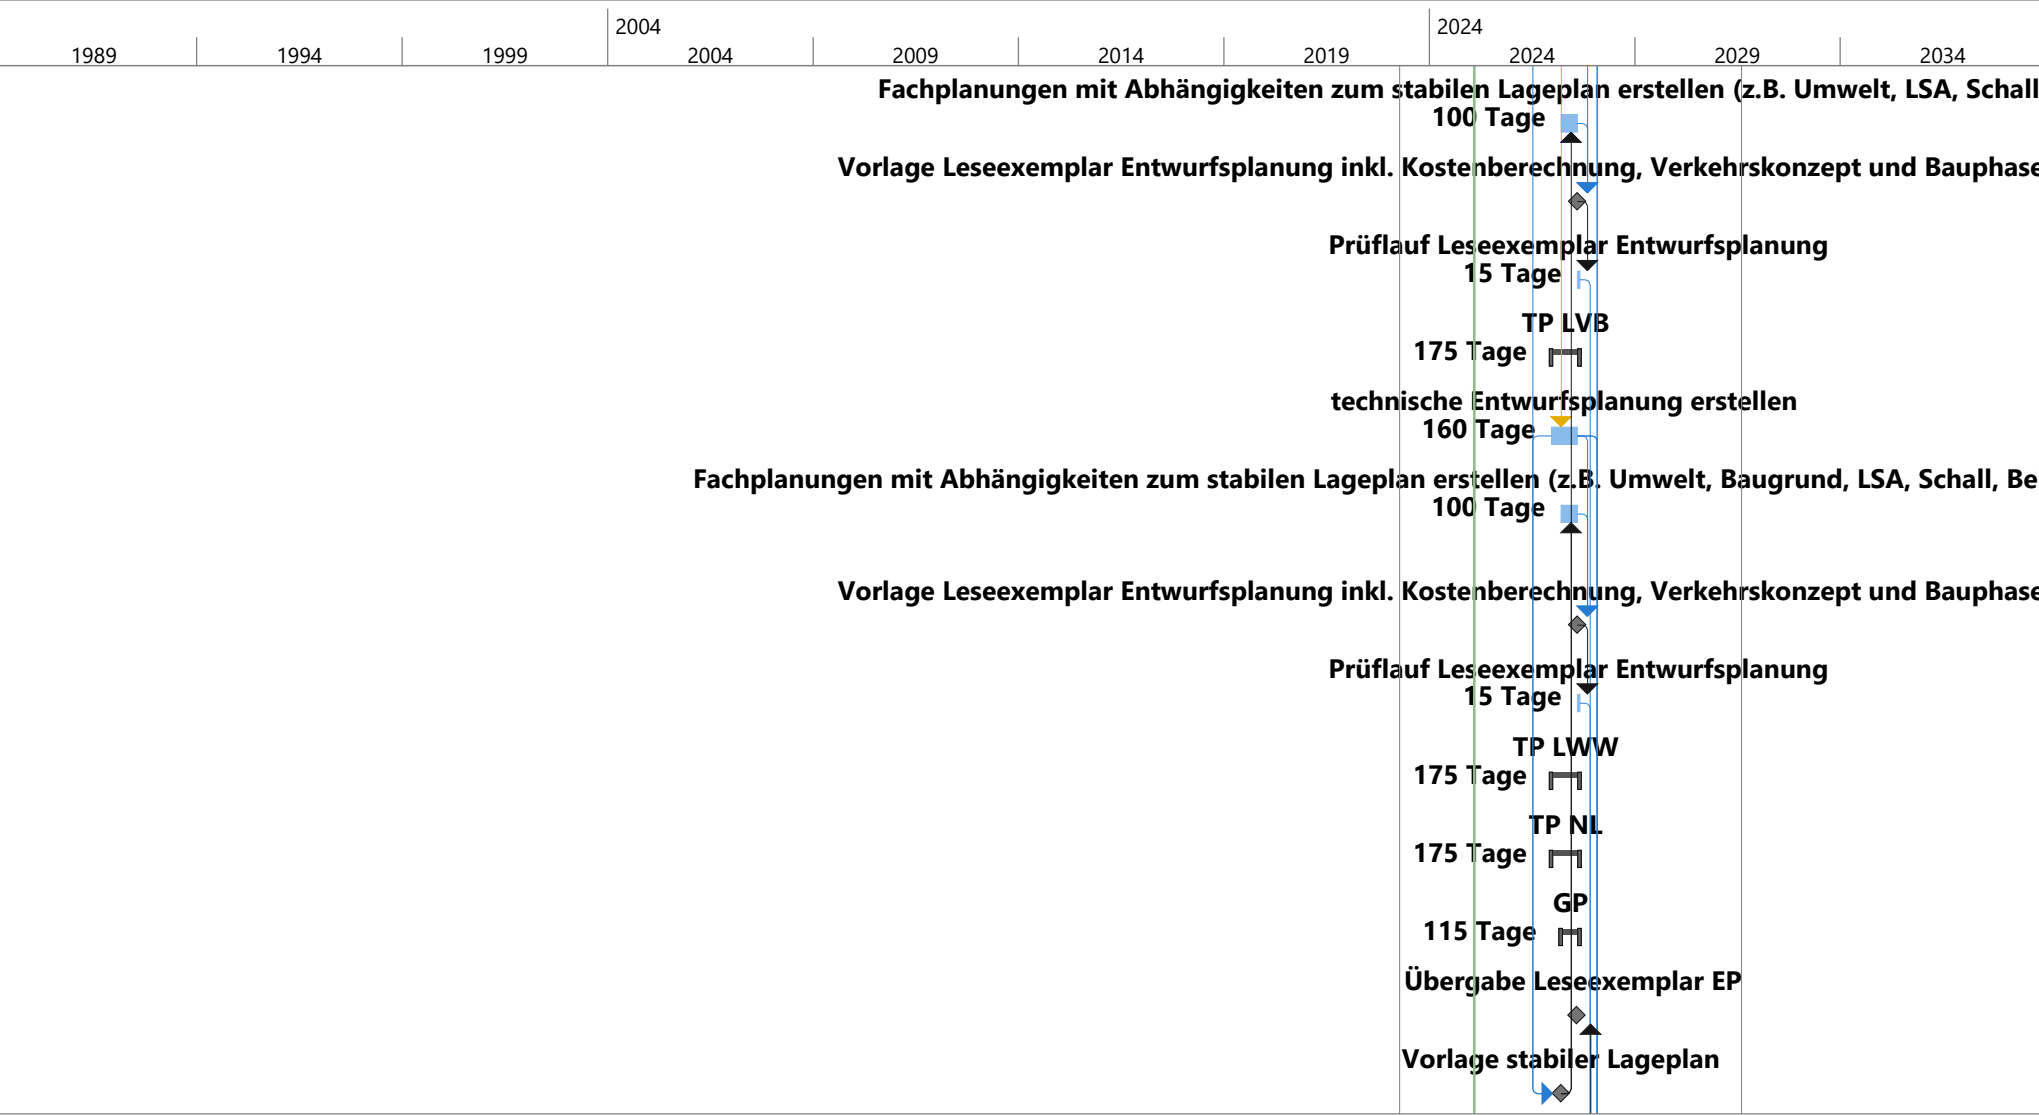


I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

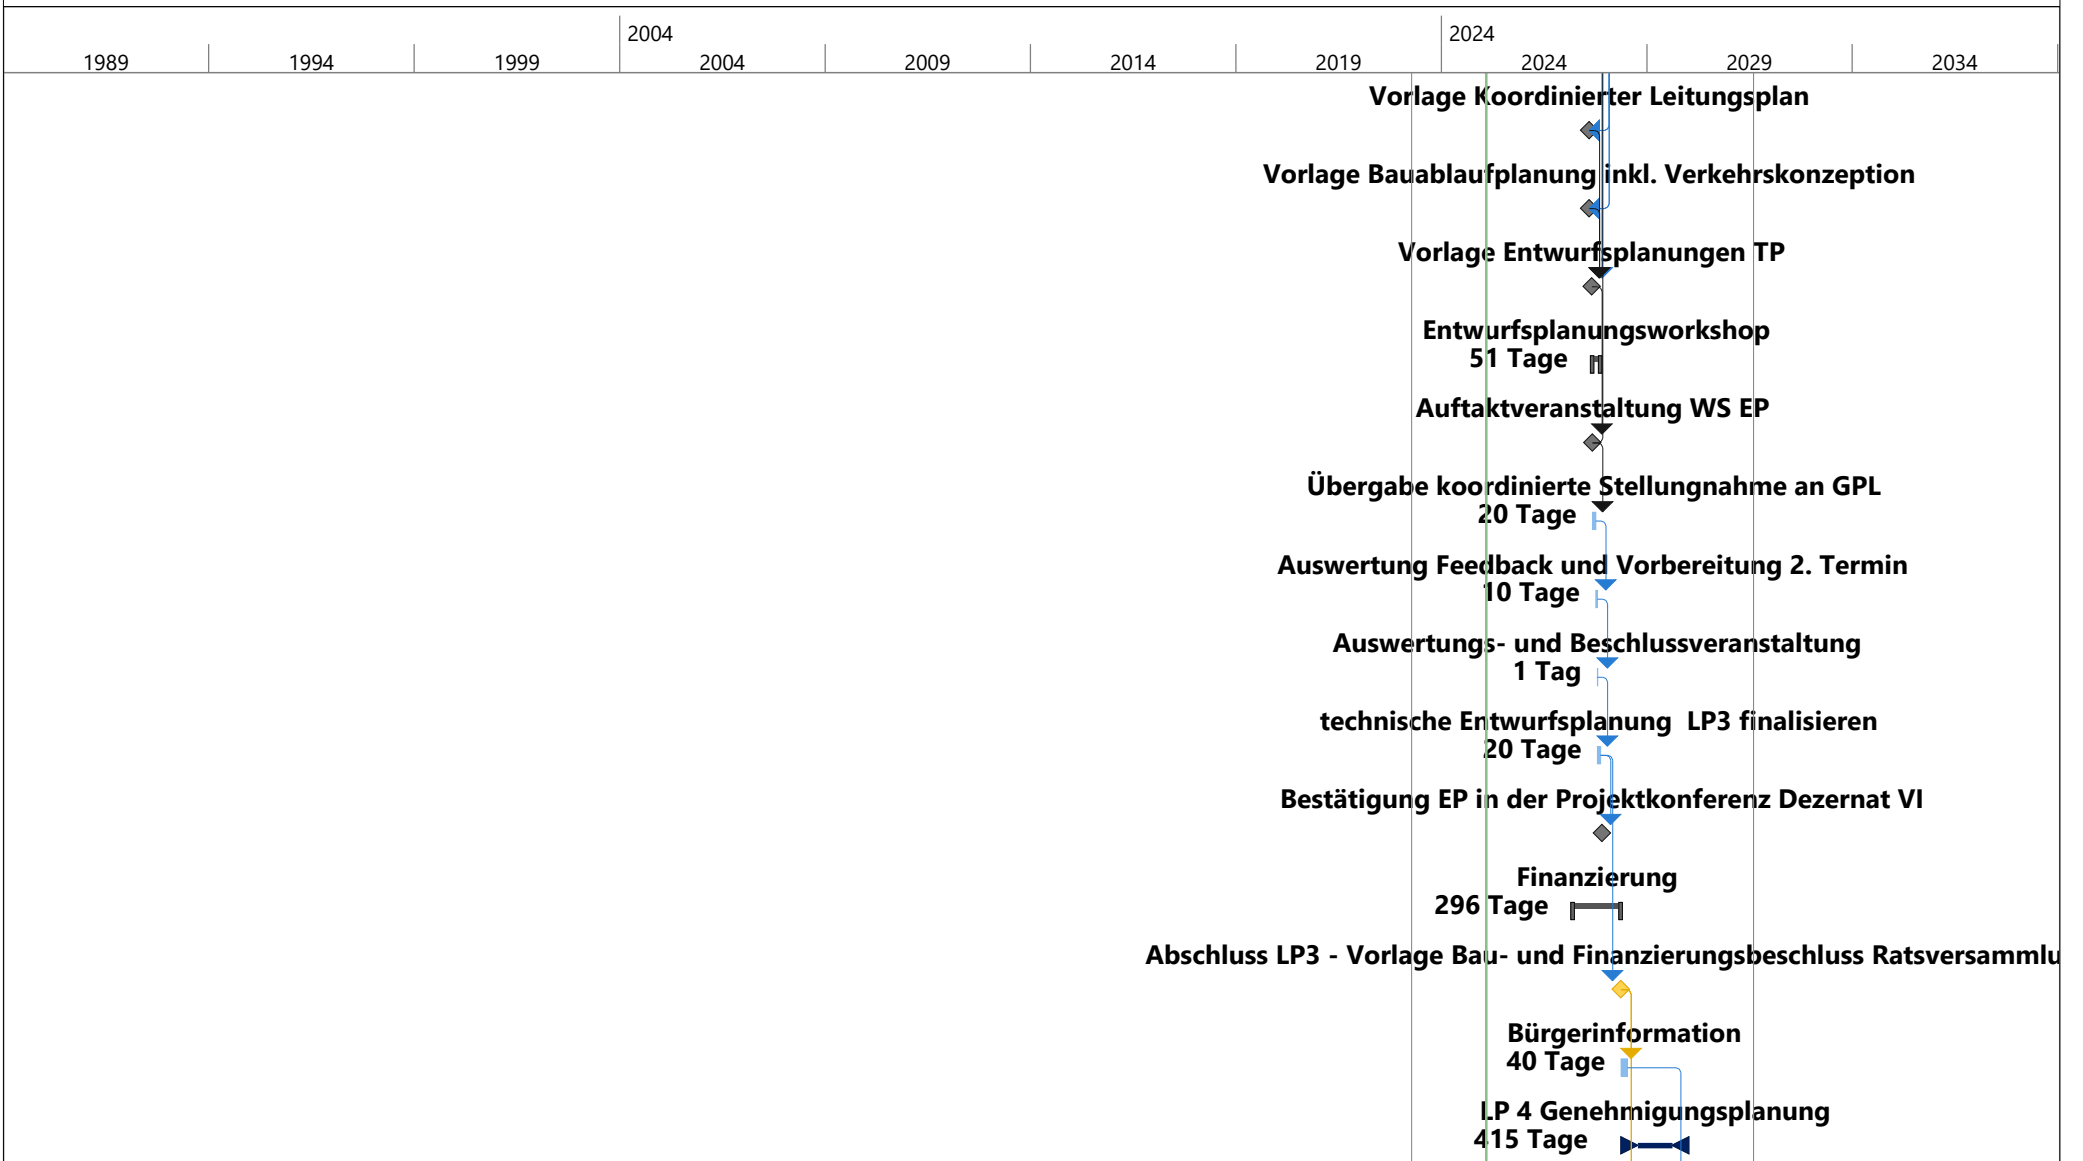


I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

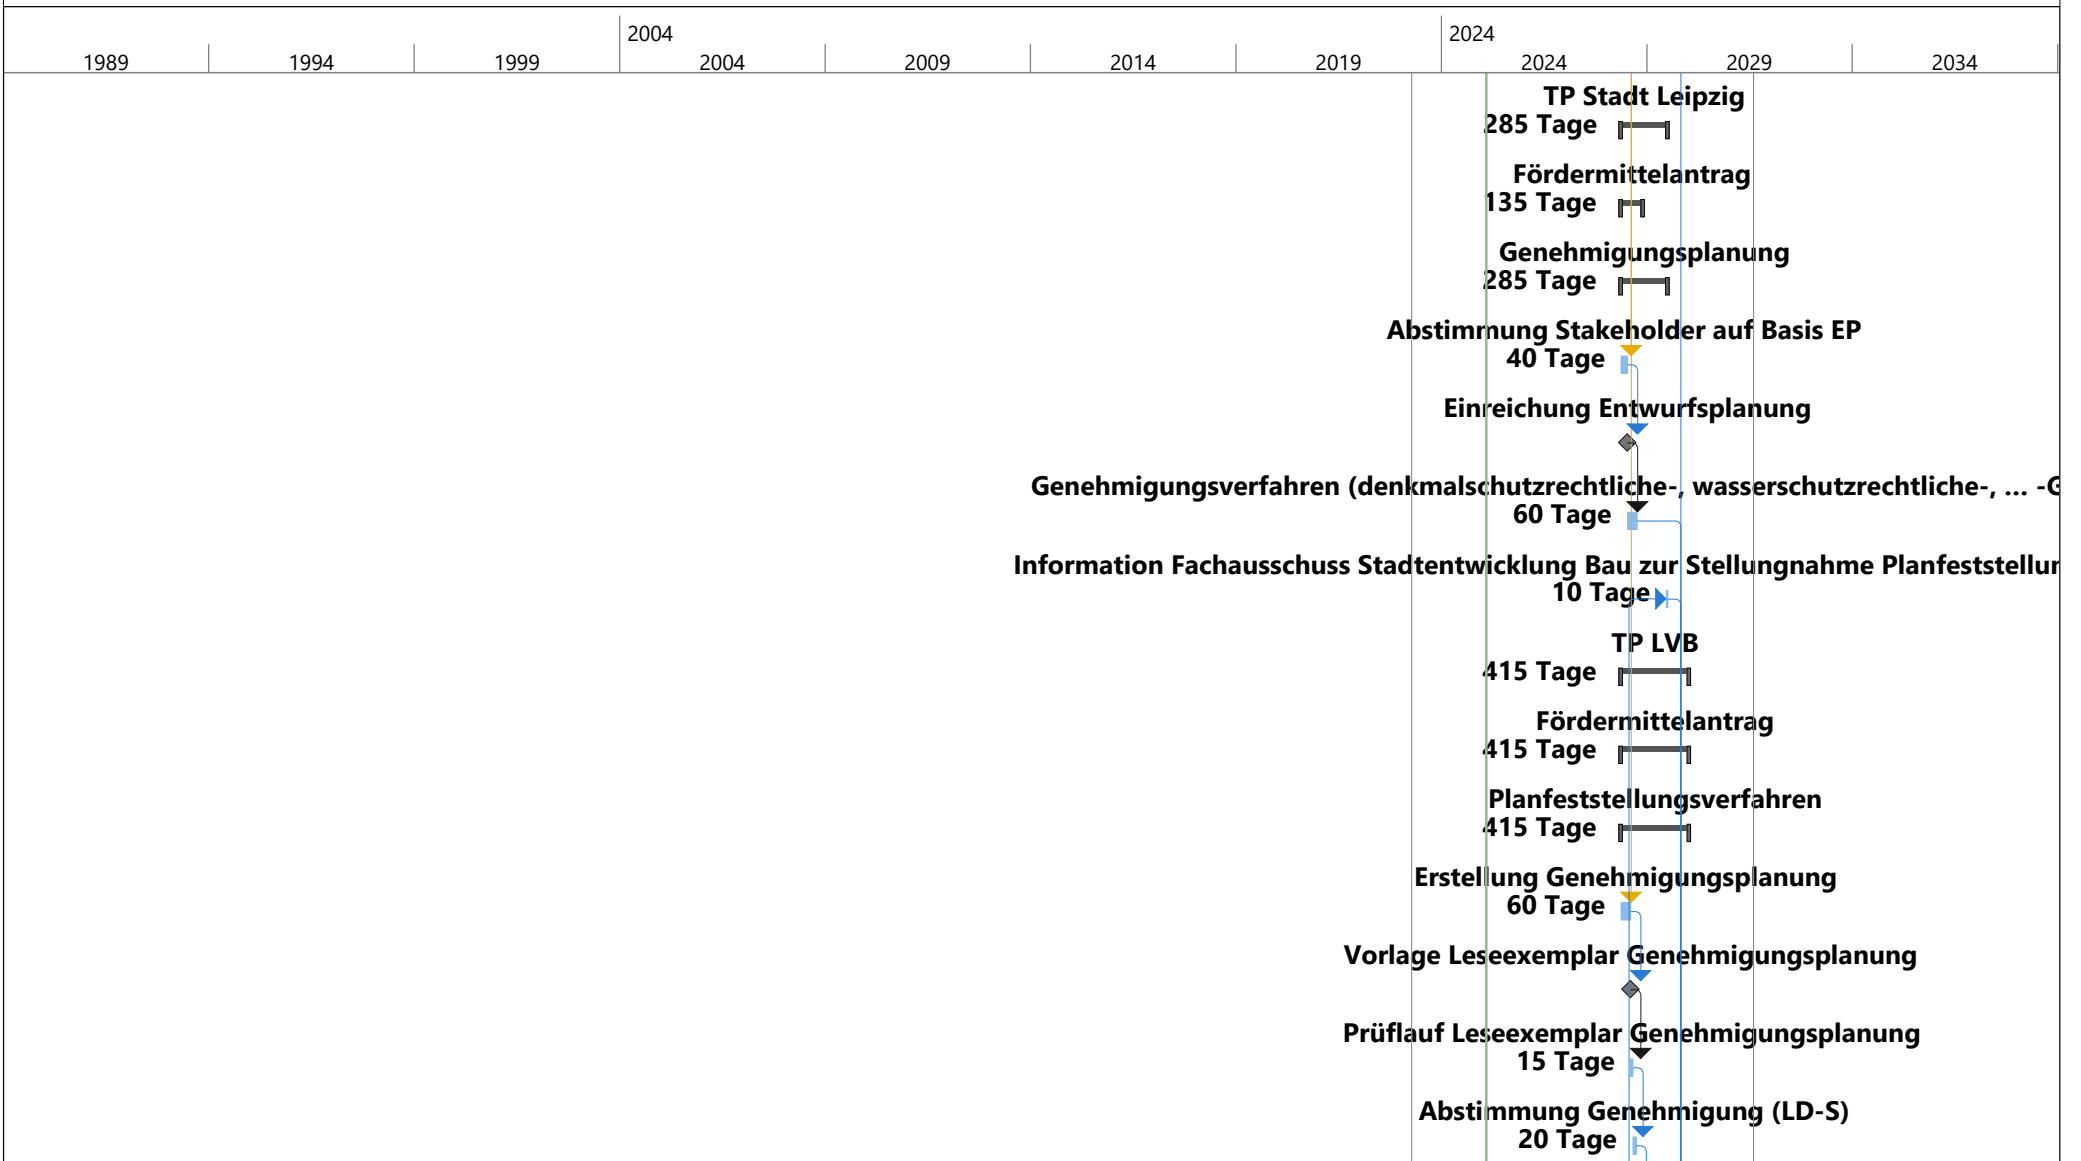


I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

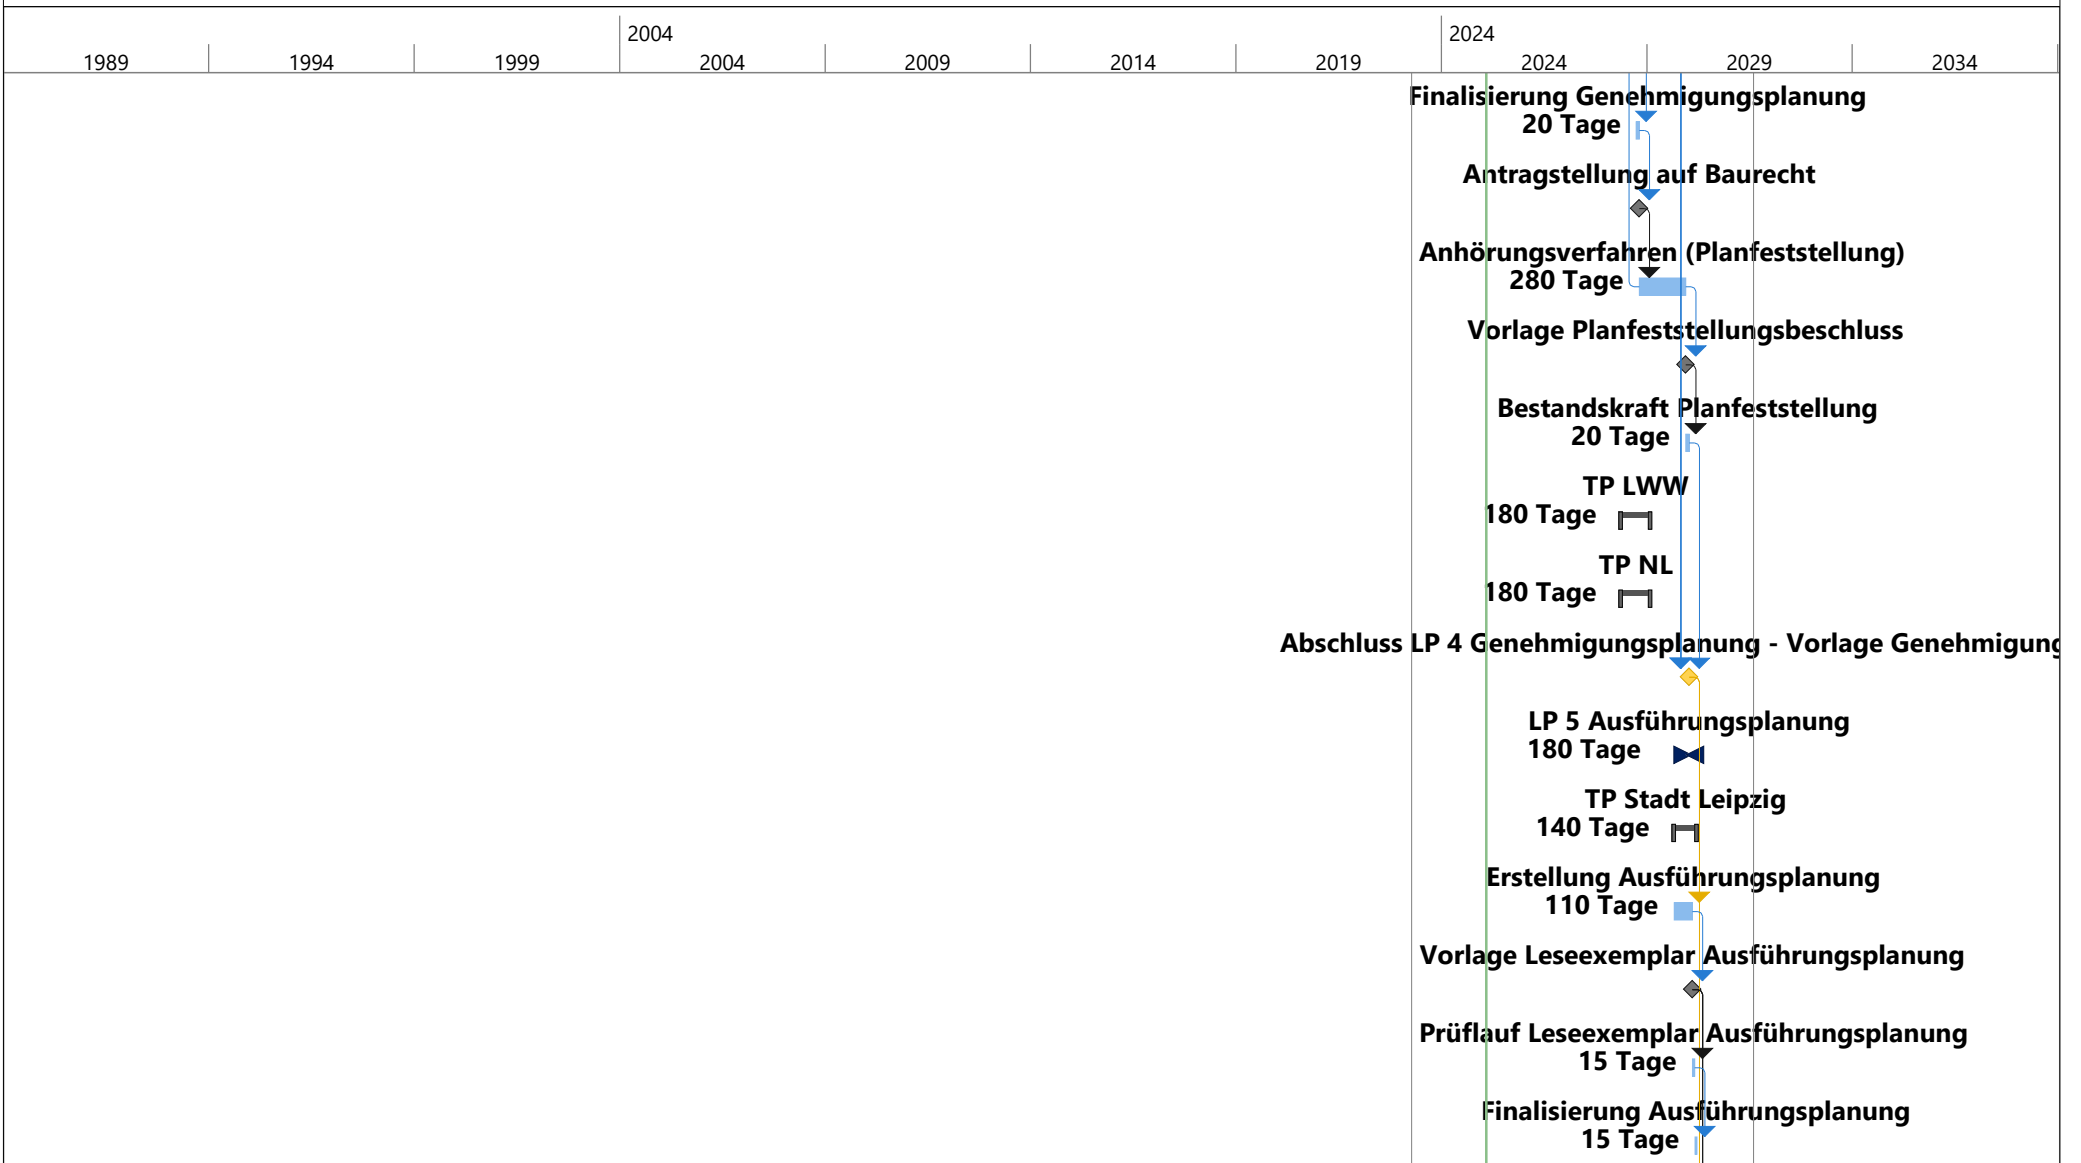


I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

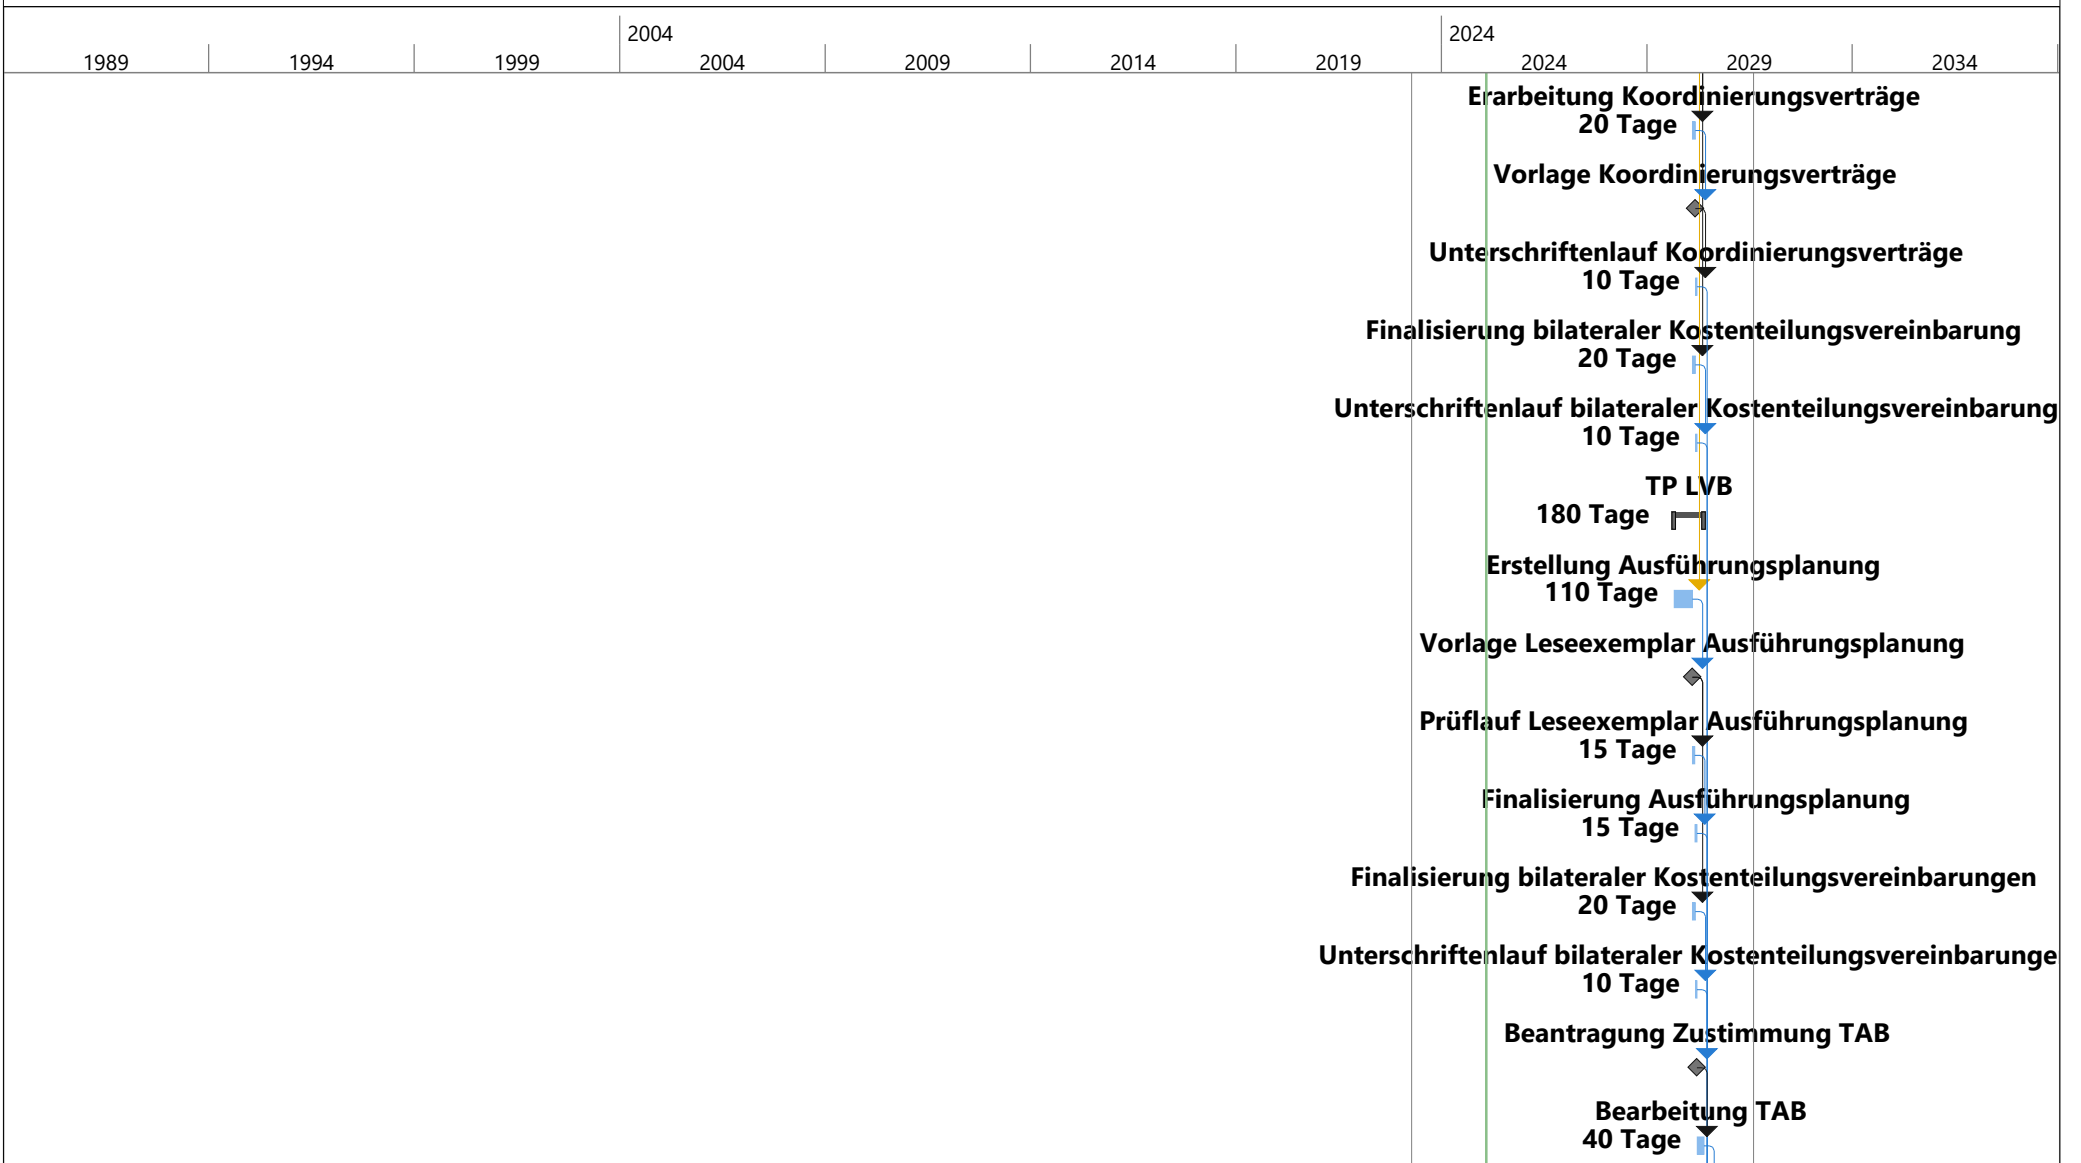


I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

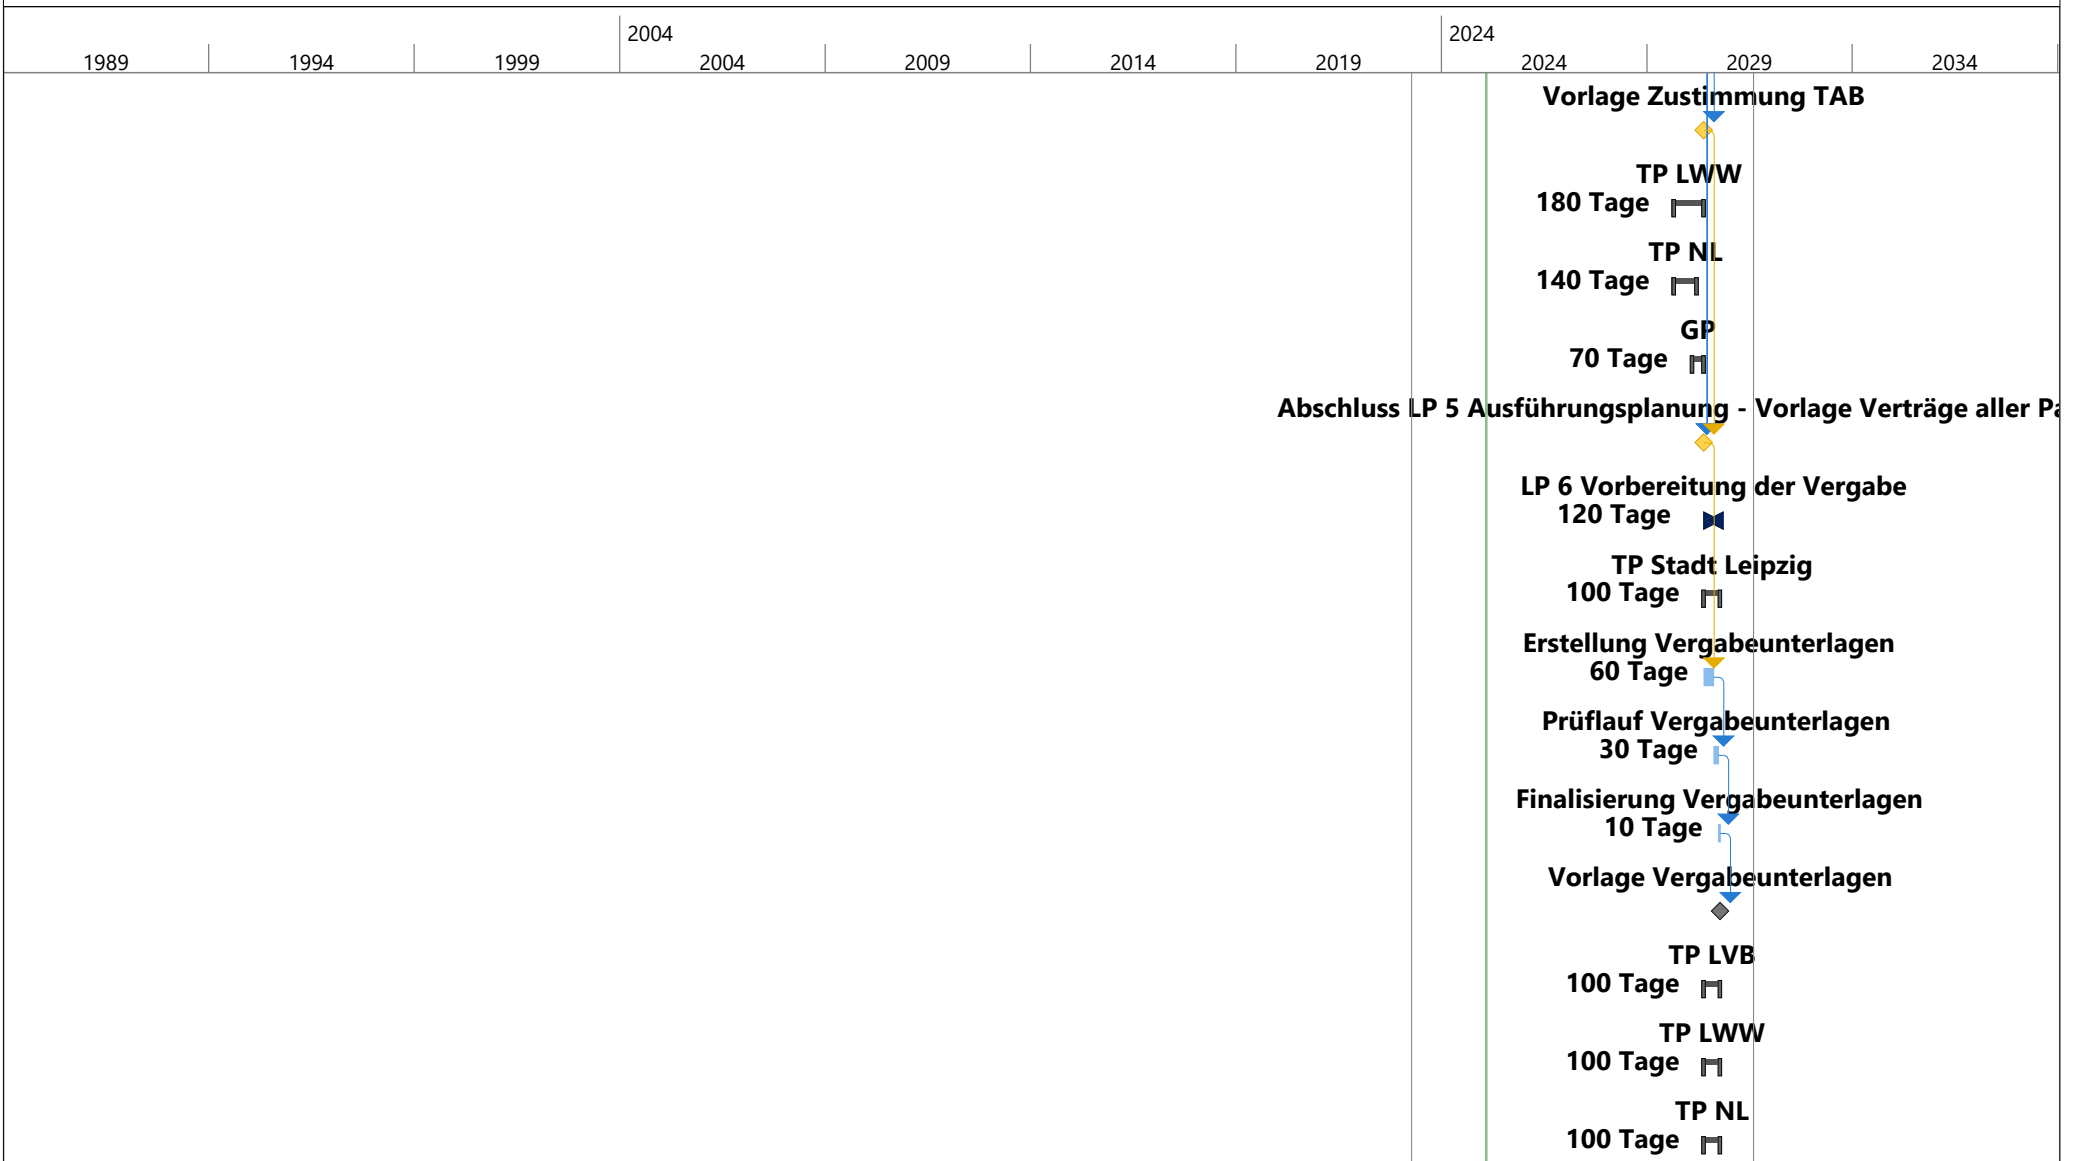

I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

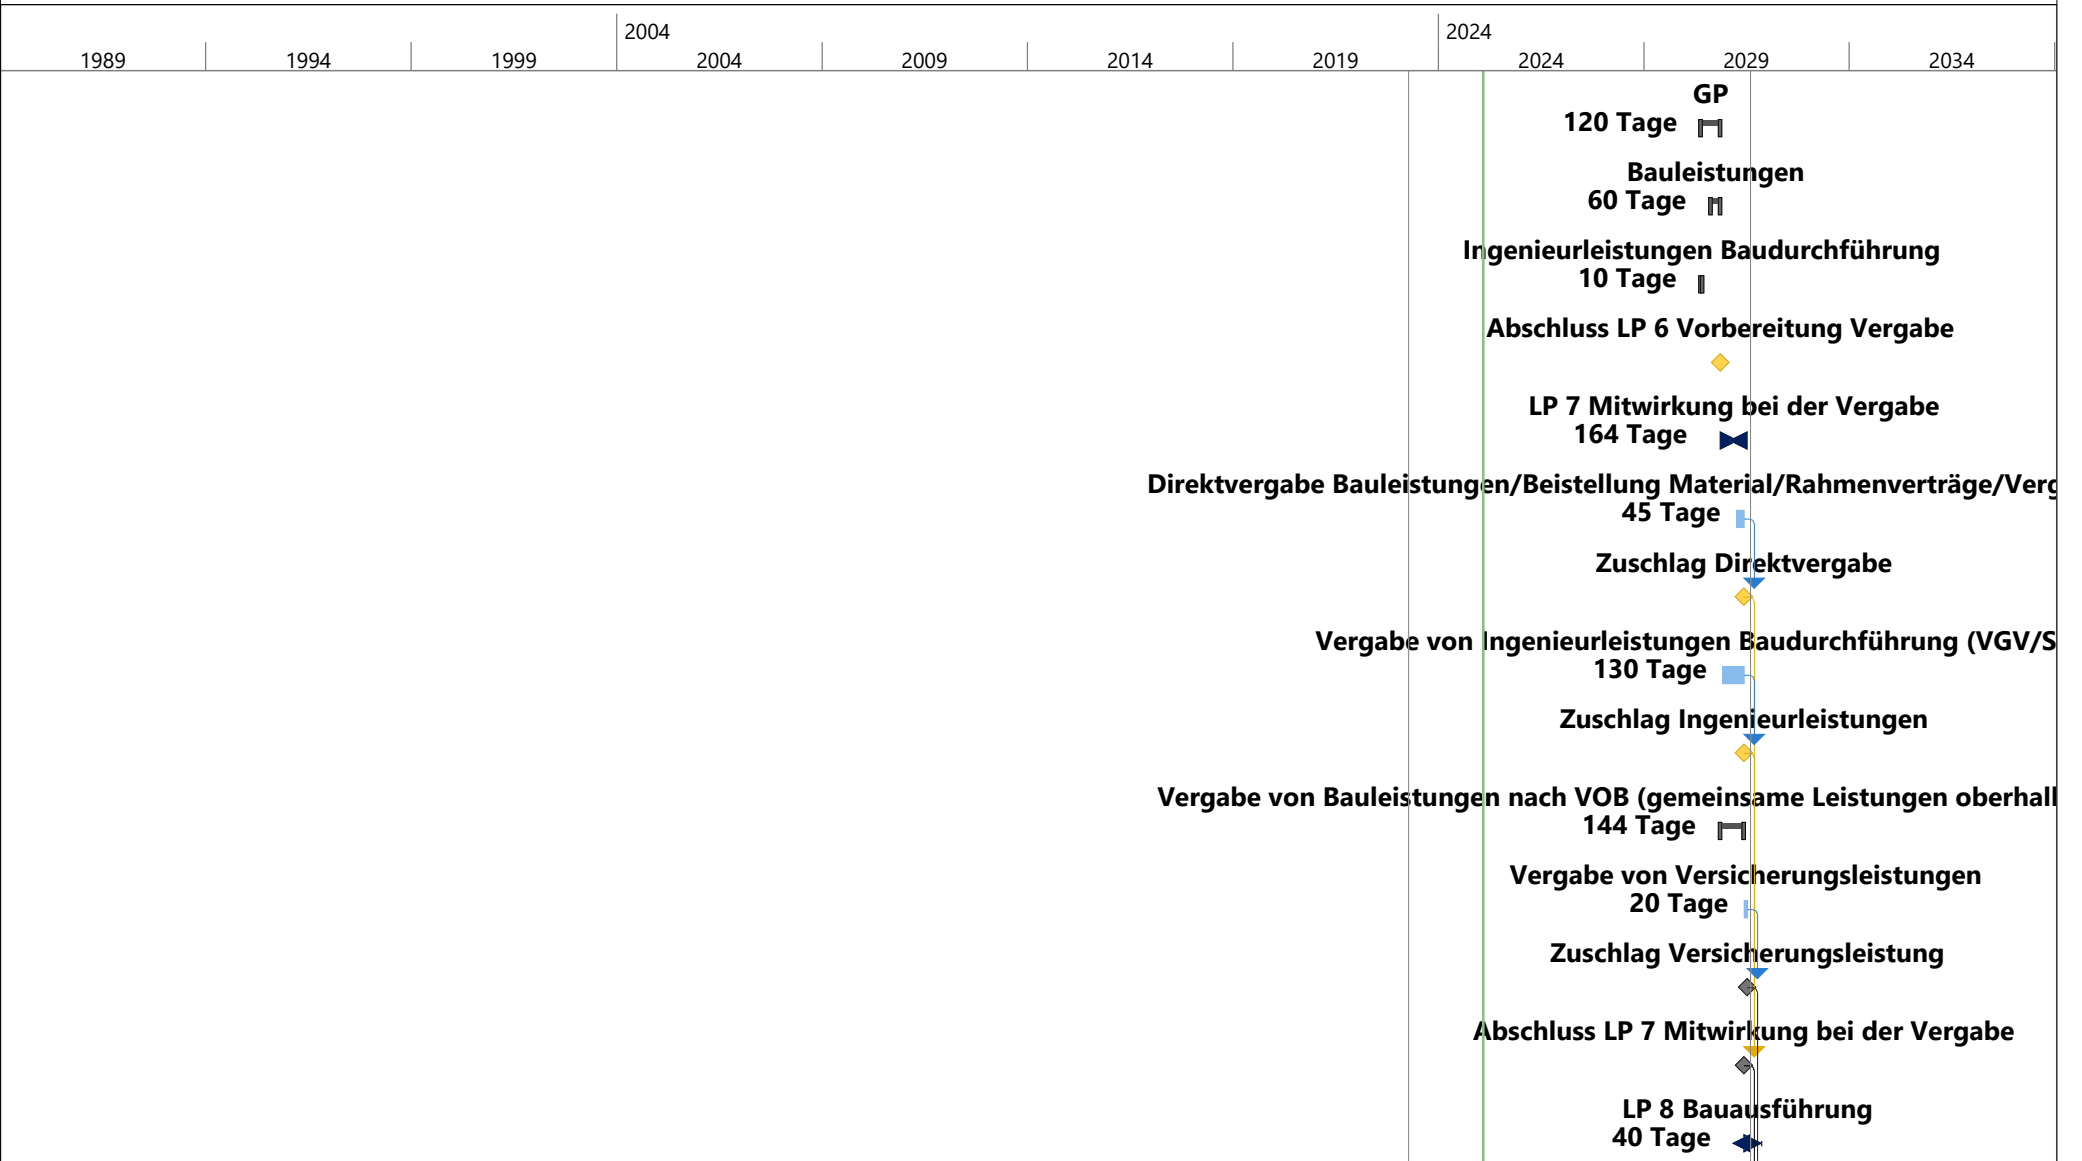

I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

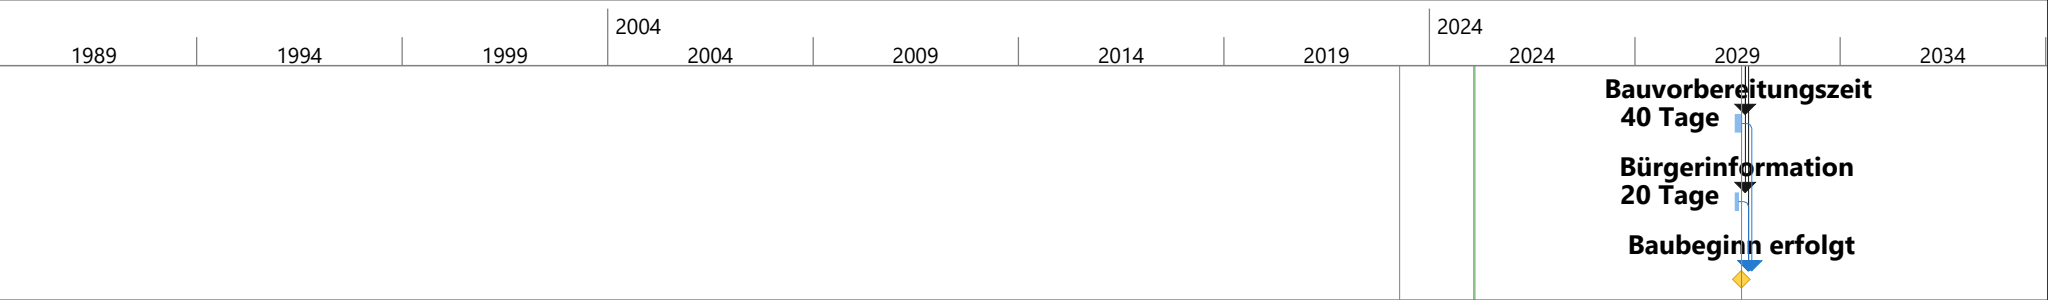

I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

2039	2044	2049	2054	2059	2064	2069	2074	2079	2084
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

2039	2044				2064				2084
	2044	2049	2054	2059	2064	2069	2074	2079	2084

Zusammenstellung voraussichtliche Gesamtkosten/Förderfähigkeit und Übergabe an Vergabestelle

I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

2039	2044				2064				
	2044	2049	2054	2059	2064	2069	2074	2079	2084

Fachplanungen mit Abhängigkeiten zum stabilen Lageplan erstellen (z.B. Umwelt, LSA, Schall, Beleuchtung, ...)

Vorlage Leseexemplar Entwurfsplanung inkl. Kostenberechnung, Verkehrskonzept und Bauphasen-/ Bauzeitenplanung

Fachplanungen mit Abhängigkeiten zum stabilen Lageplan erstellen (z.B. Umwelt, Baugrund, LSA, Schall, Beleuchtung, Fahrleitung, Gleis, ...)

Vorlage Leseexemplar Entwurfsplanung inkl. Kostenberechnung, Verkehrskonzept und Bauphasen-/ Bauzeitenplanung

I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

2039	2044					2064					2084
	2044	2049	2054	2059	2064	2069	2074	2079		2084	

Abschluss LP3 - Vorlage Bau- und Finanzierungsbeschluss Ratsversammlung

I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

2039	2044					2064					2084
	2044	2049	2054	2059	2064	2069	2074	2079		2084	

Genehmigungsverfahren (denkmalschutzrechtliche-, wasserschutzrechtliche-, ... -Genehmigung)

Information Fachausschuss Stadtentwicklung Bau zur Stellungnahme Planfeststellungsverfahren der LVB

I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

2039	2044				2064				2084
	2044	2049	2054	2059	2064	2069	2074	2079	2084

Abschluss LP 4 Genehmigungsplanung - Vorlage Genehmigungen

I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

2039	2044					2064					2084
	2044	2049	2054	2059	2064	2069	2074	2079		2084	

Unterschriftenlauf bilateraler Kostenteilungsvereinbarung

Unterschriftenlauf bilateraler Kostenteilungsvereinbarungen

I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

2039	2044					2064					2084
	2044	2049	2054	2059	2064	2069	2074	2079		2084	

Abschluss LP 5 Ausführungsplanung - Vorlage Verträge aller Partner

I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

2039	2044	2049	2054	2059	2064	2069	2074	2079	2084
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Direktvergabe Bauleistungen/Beistellung Material/Rahmenverträge/Vergabe an Tochterfirmen

Vergabe von Ingenieurleistungen Baudurchführung (VGV/Sekt VO)

Vergabe von Bauleistungen nach VOB (gemeinsame Leistungen oberhalb EU Schwellenwert)

I-58 - Komplexmaßnahmen des Basismodul Hauptachsen zur Umsetzung der Mobilitätstrategie 2030 der Stadt Leipzig

2039	2044				2064					
	2044	2049	2054	2059	2064	2069	2074	2079	2084	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
