


Phase 1 M.1:500

Draufsicht


- Phase 1 ca. 4 Wochen:
- Pleißenbach noch im alten Bachlauf
 - Zufahrt Baugeräte nur aus Richtung Westen
 - Herstellung der Bohrfahrgründung von Bestandsgelände aus
 - Teilabbruch Überbau und WL-Süd Bestandsbauwerk

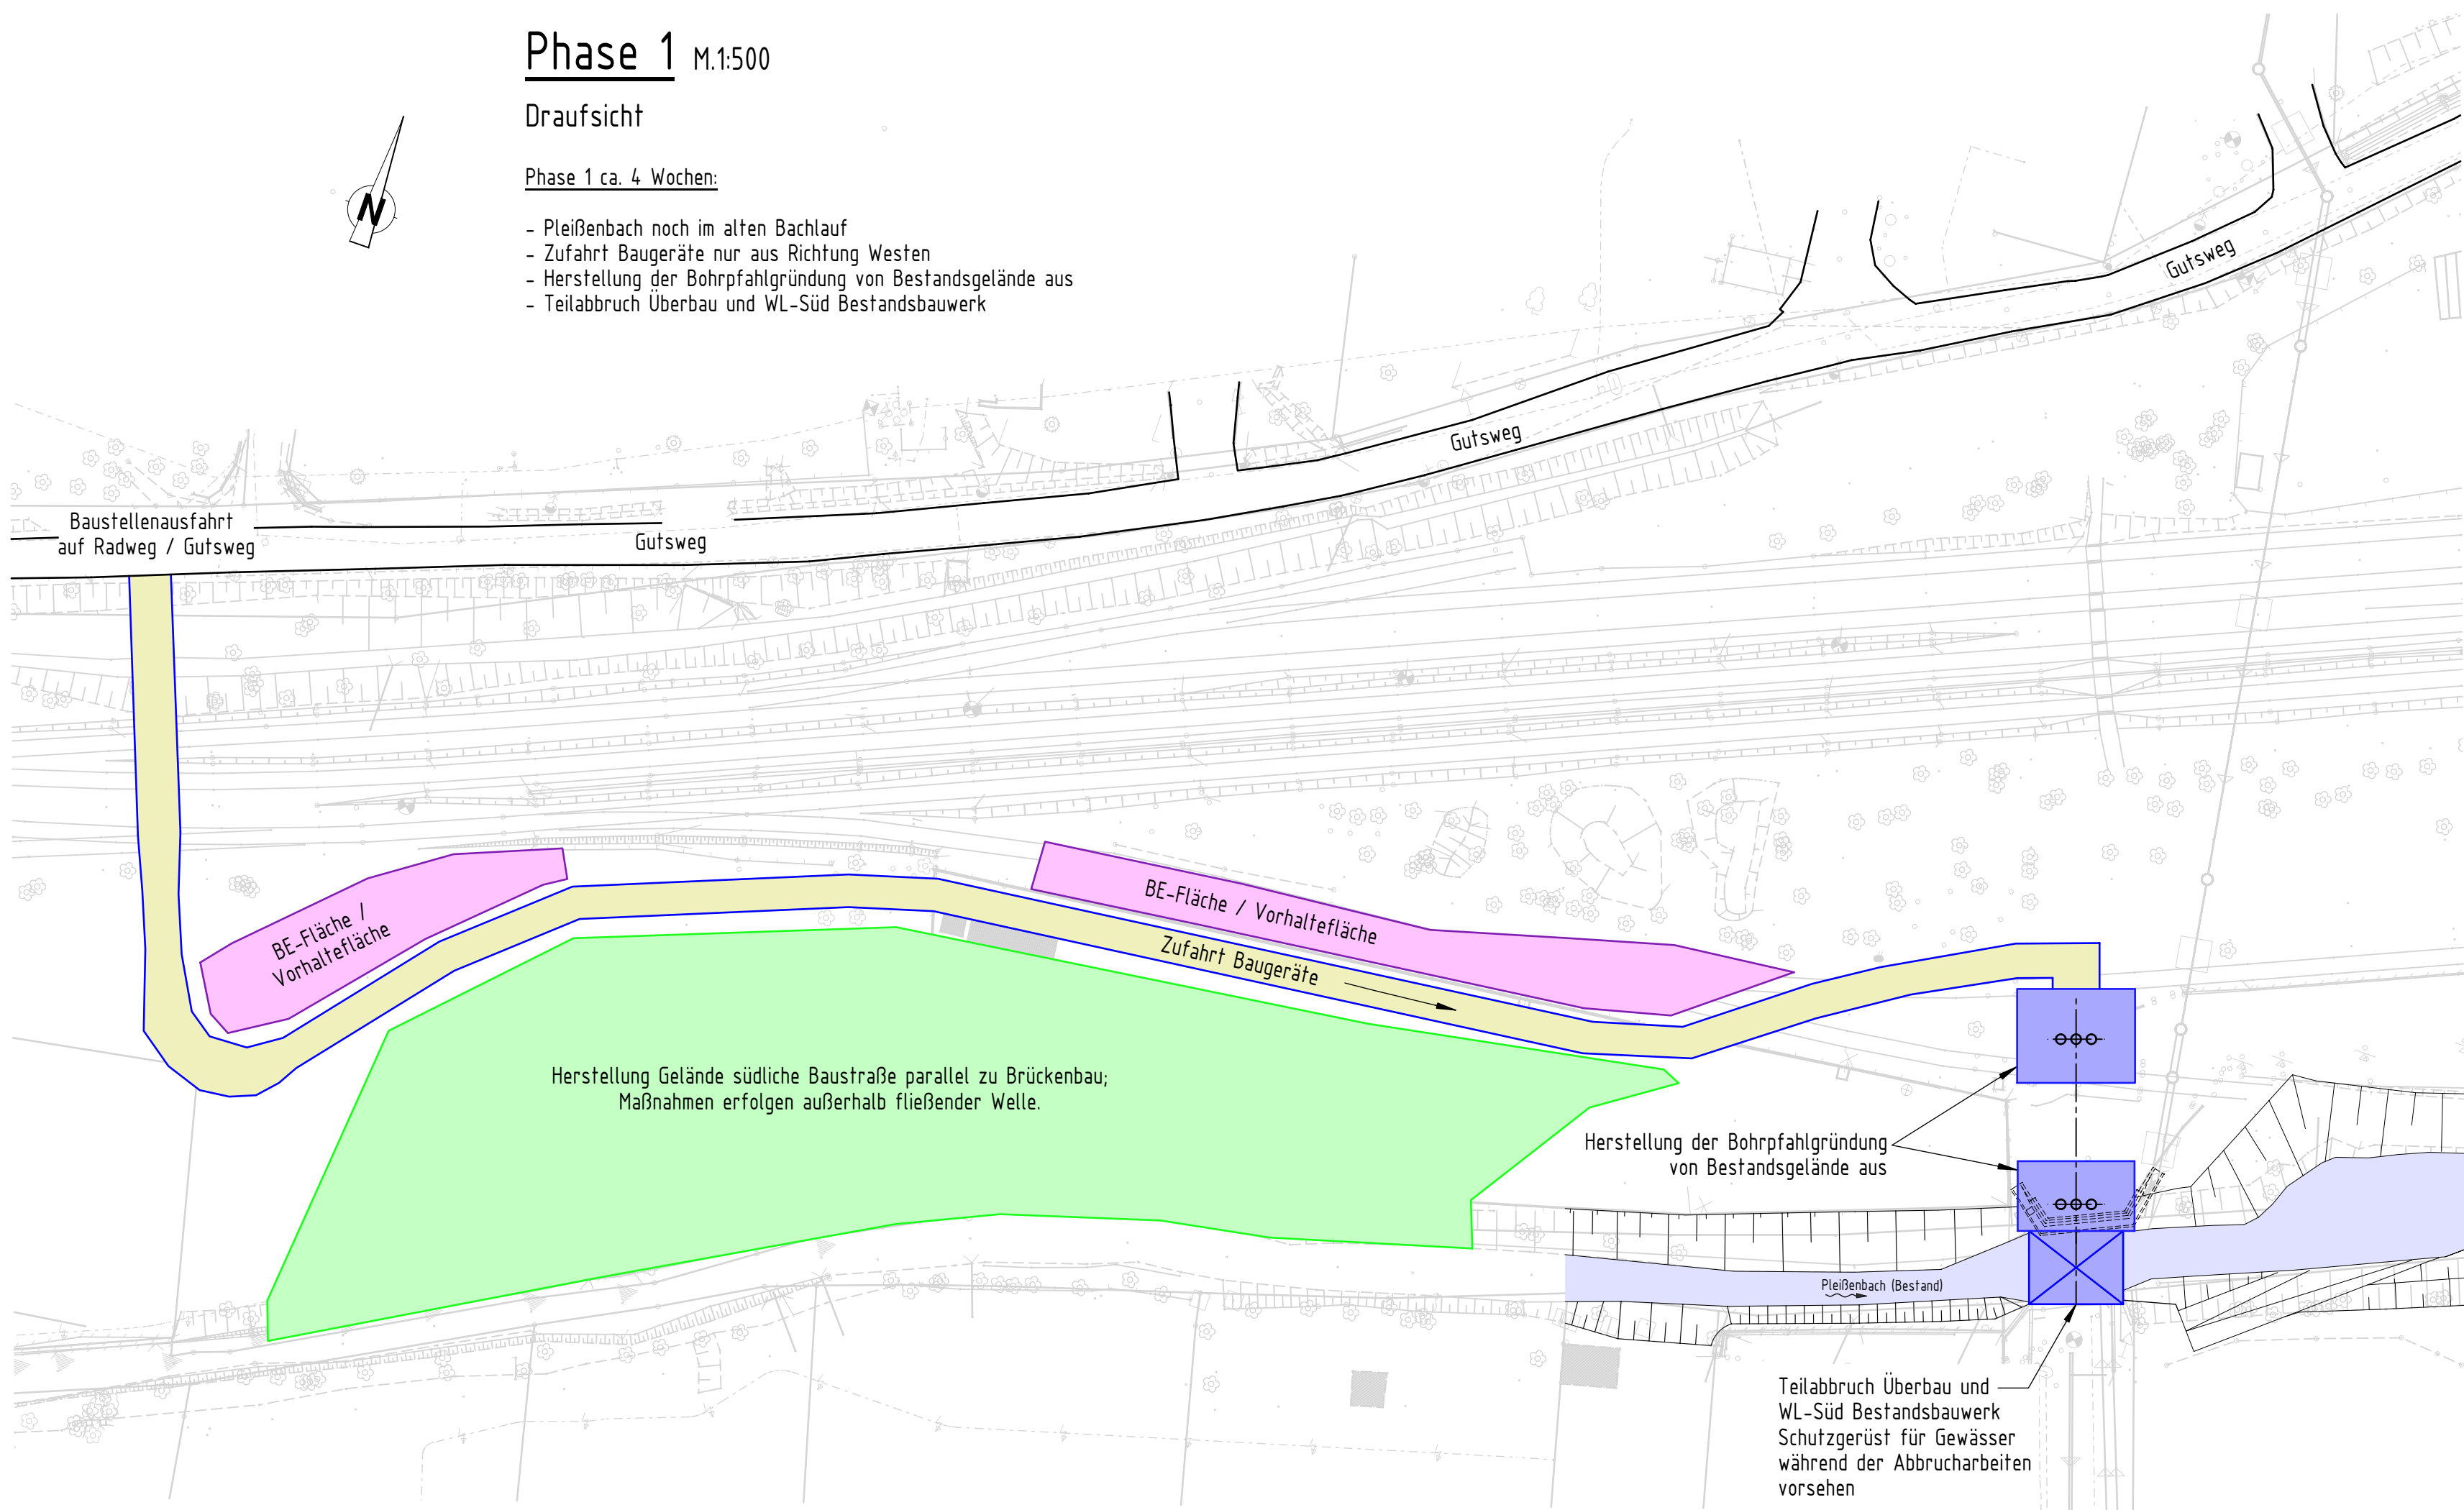

Phase 2 M.1:500


Draufsicht

- Phase 2 ca. 8 Wochen:
- Pleißenbach noch im alten Bachlauf
 - Zufahrt Baugeräte nur aus Richtung Westen
 - Herstellung der Baugruben und Kopfbalken / Flügel

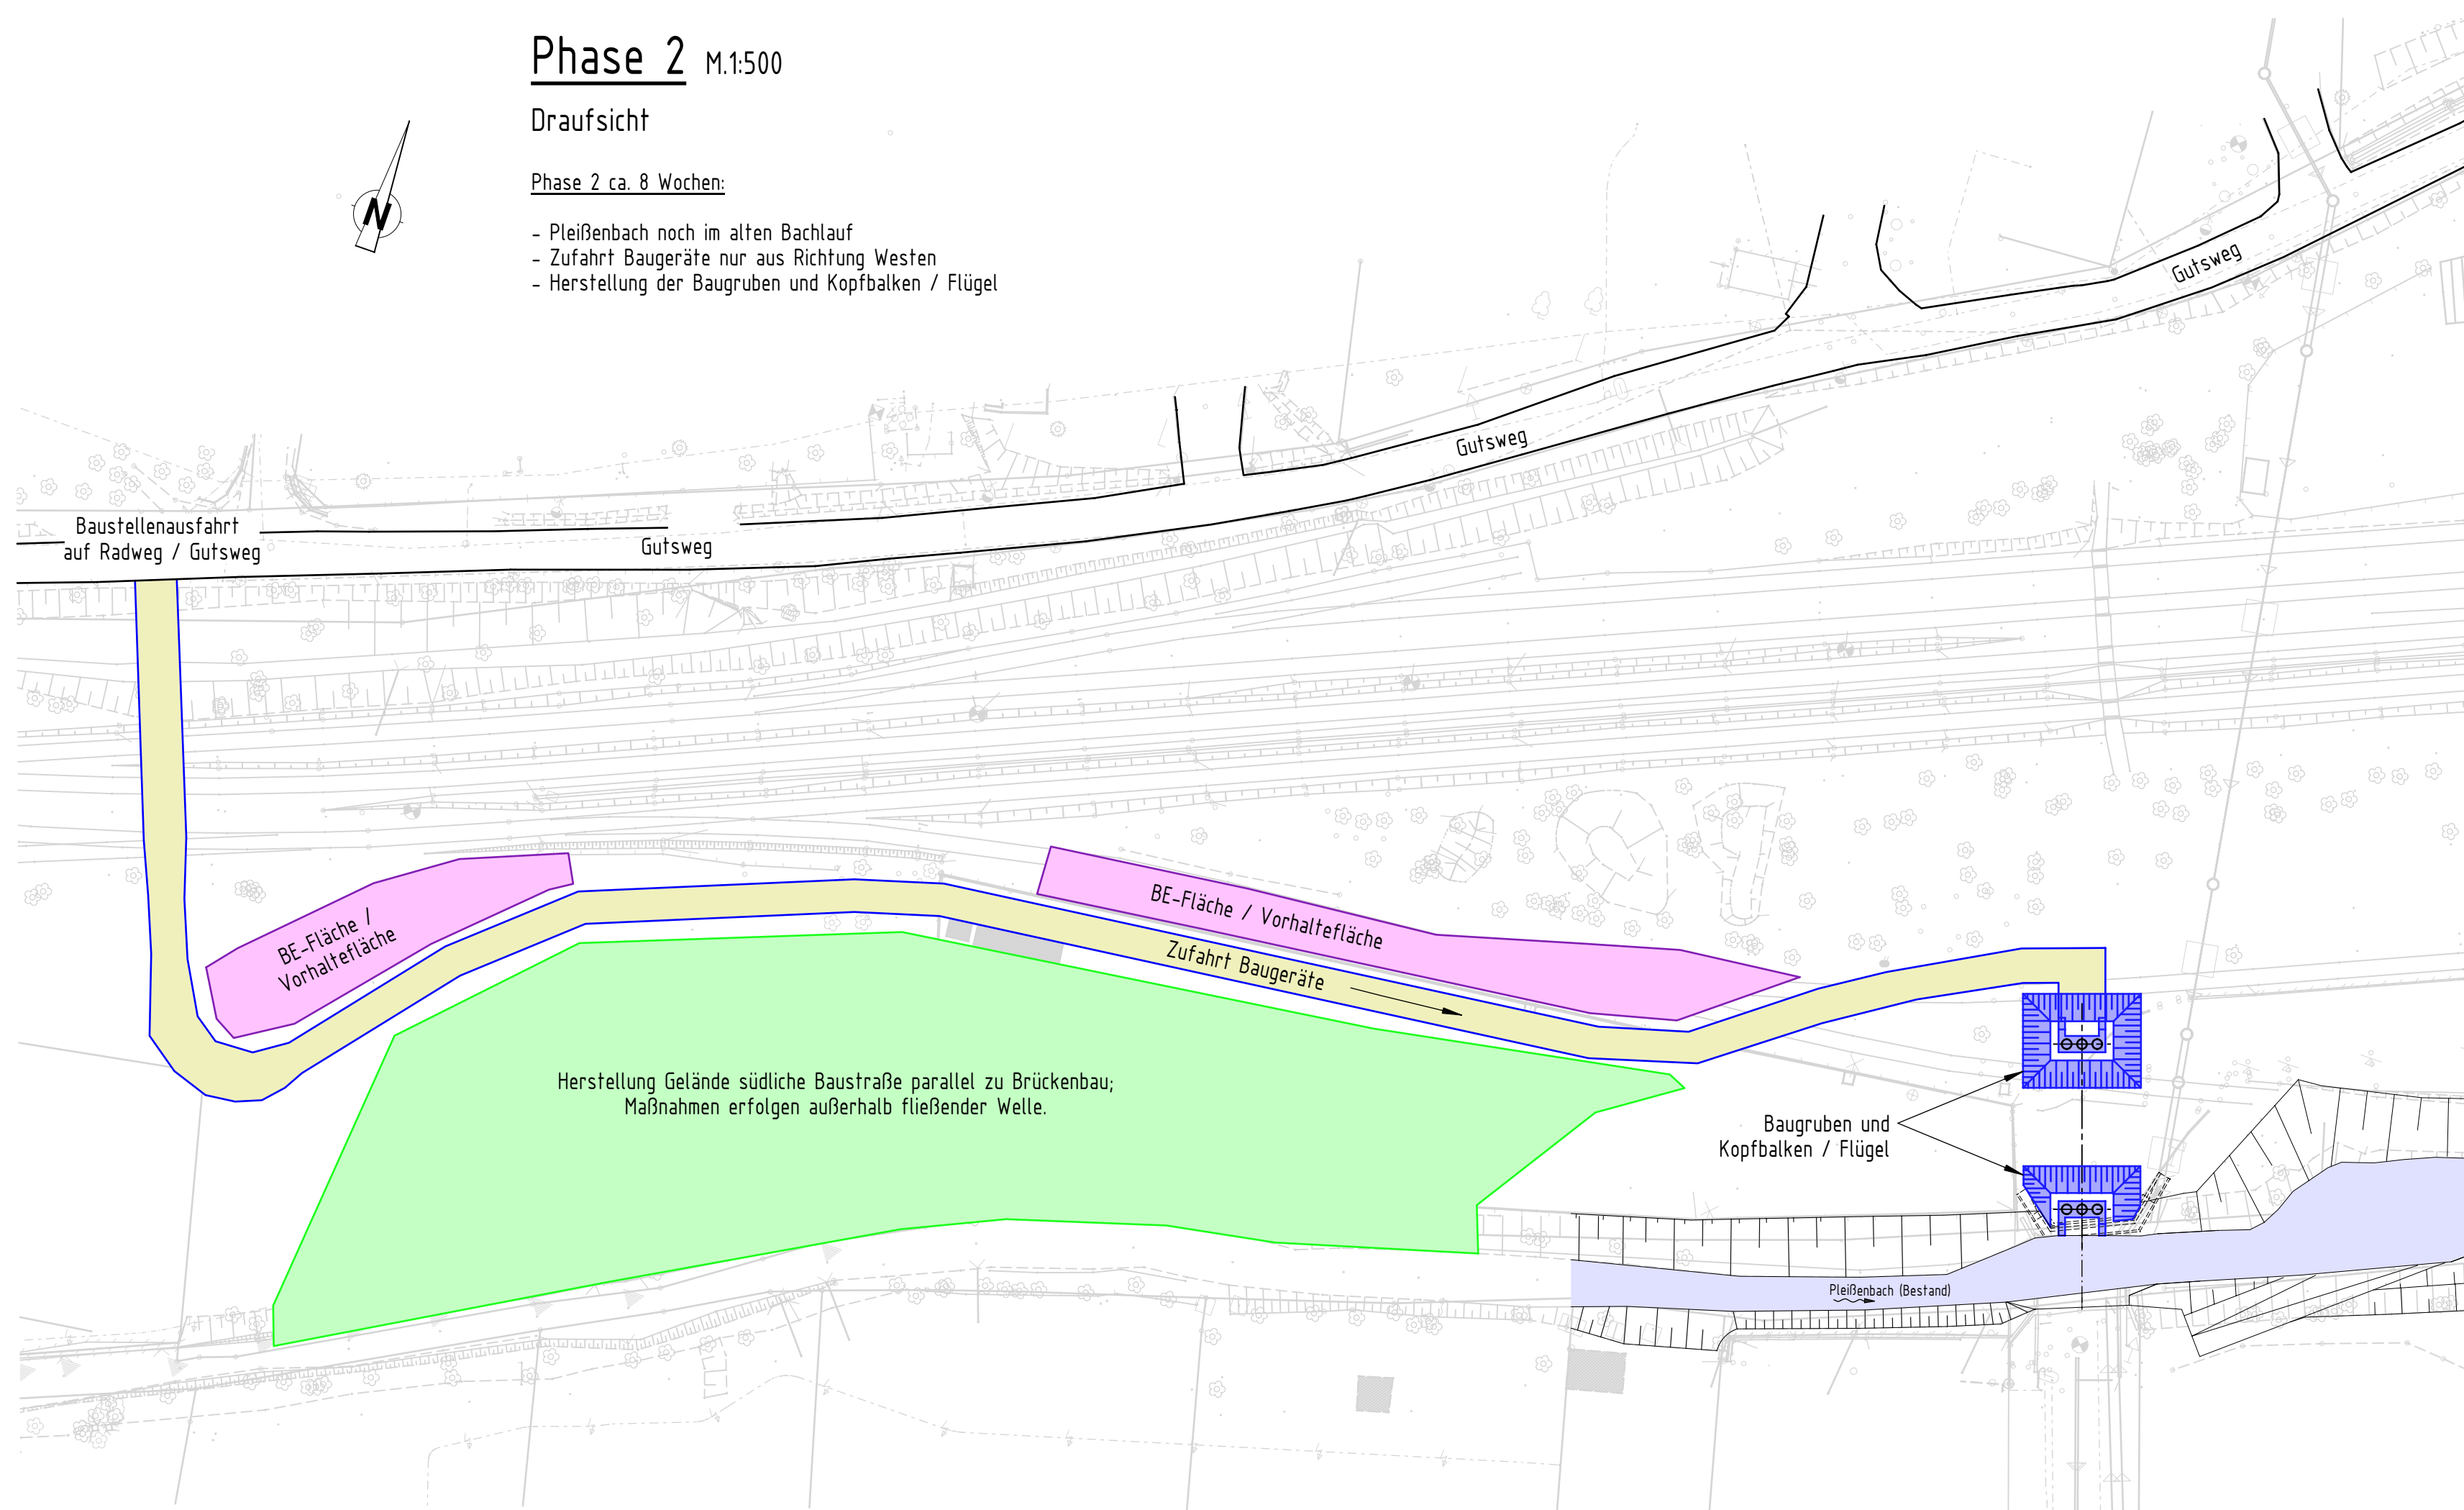

Querschnitt M.1:50


dargestellt: Abbruchstufe 1

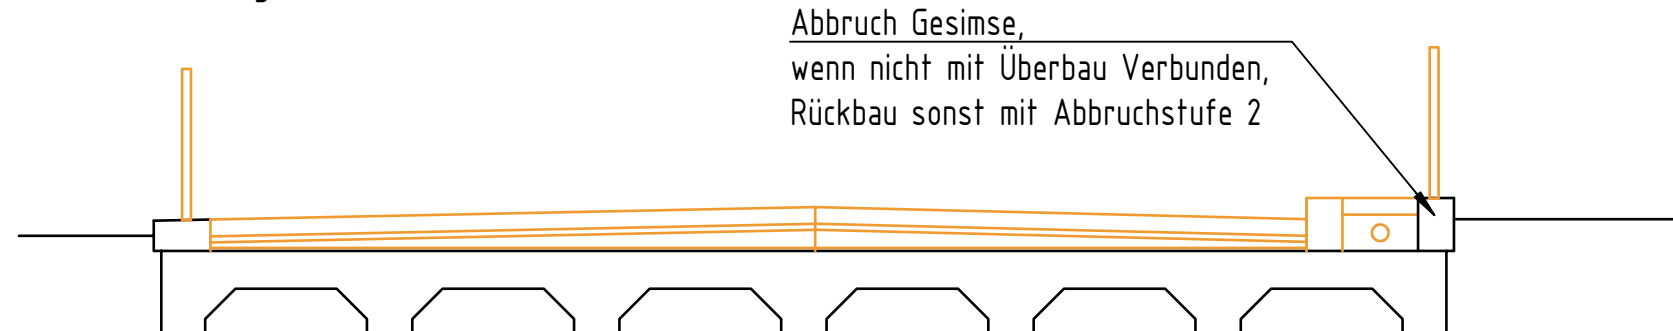

Abbruch Gesimse, wenn nicht mit Überbau Verbunden, Rückbau sonst mit Abbruchstufe 2

Querschnitt M.1:50

dargestellt: Abbruchstufe 2

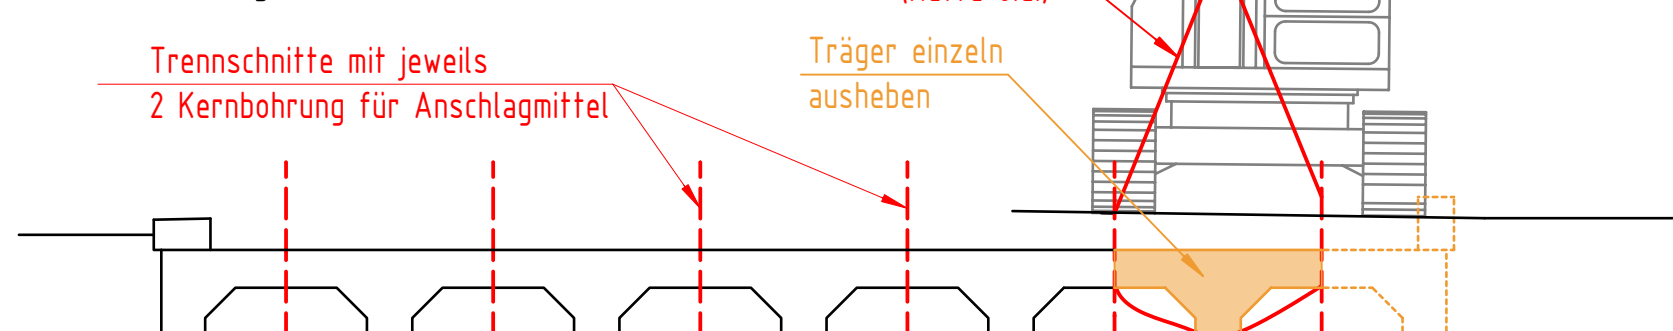


Trennschnitte mit jeweils 2 Kernbohrung für Anschlagmittel

Träger einzeln ausheben

Gerät zum Ausheben der Überbauteile

Längsschnitt M.1:50

dargestellt: Abbruchstufe 2

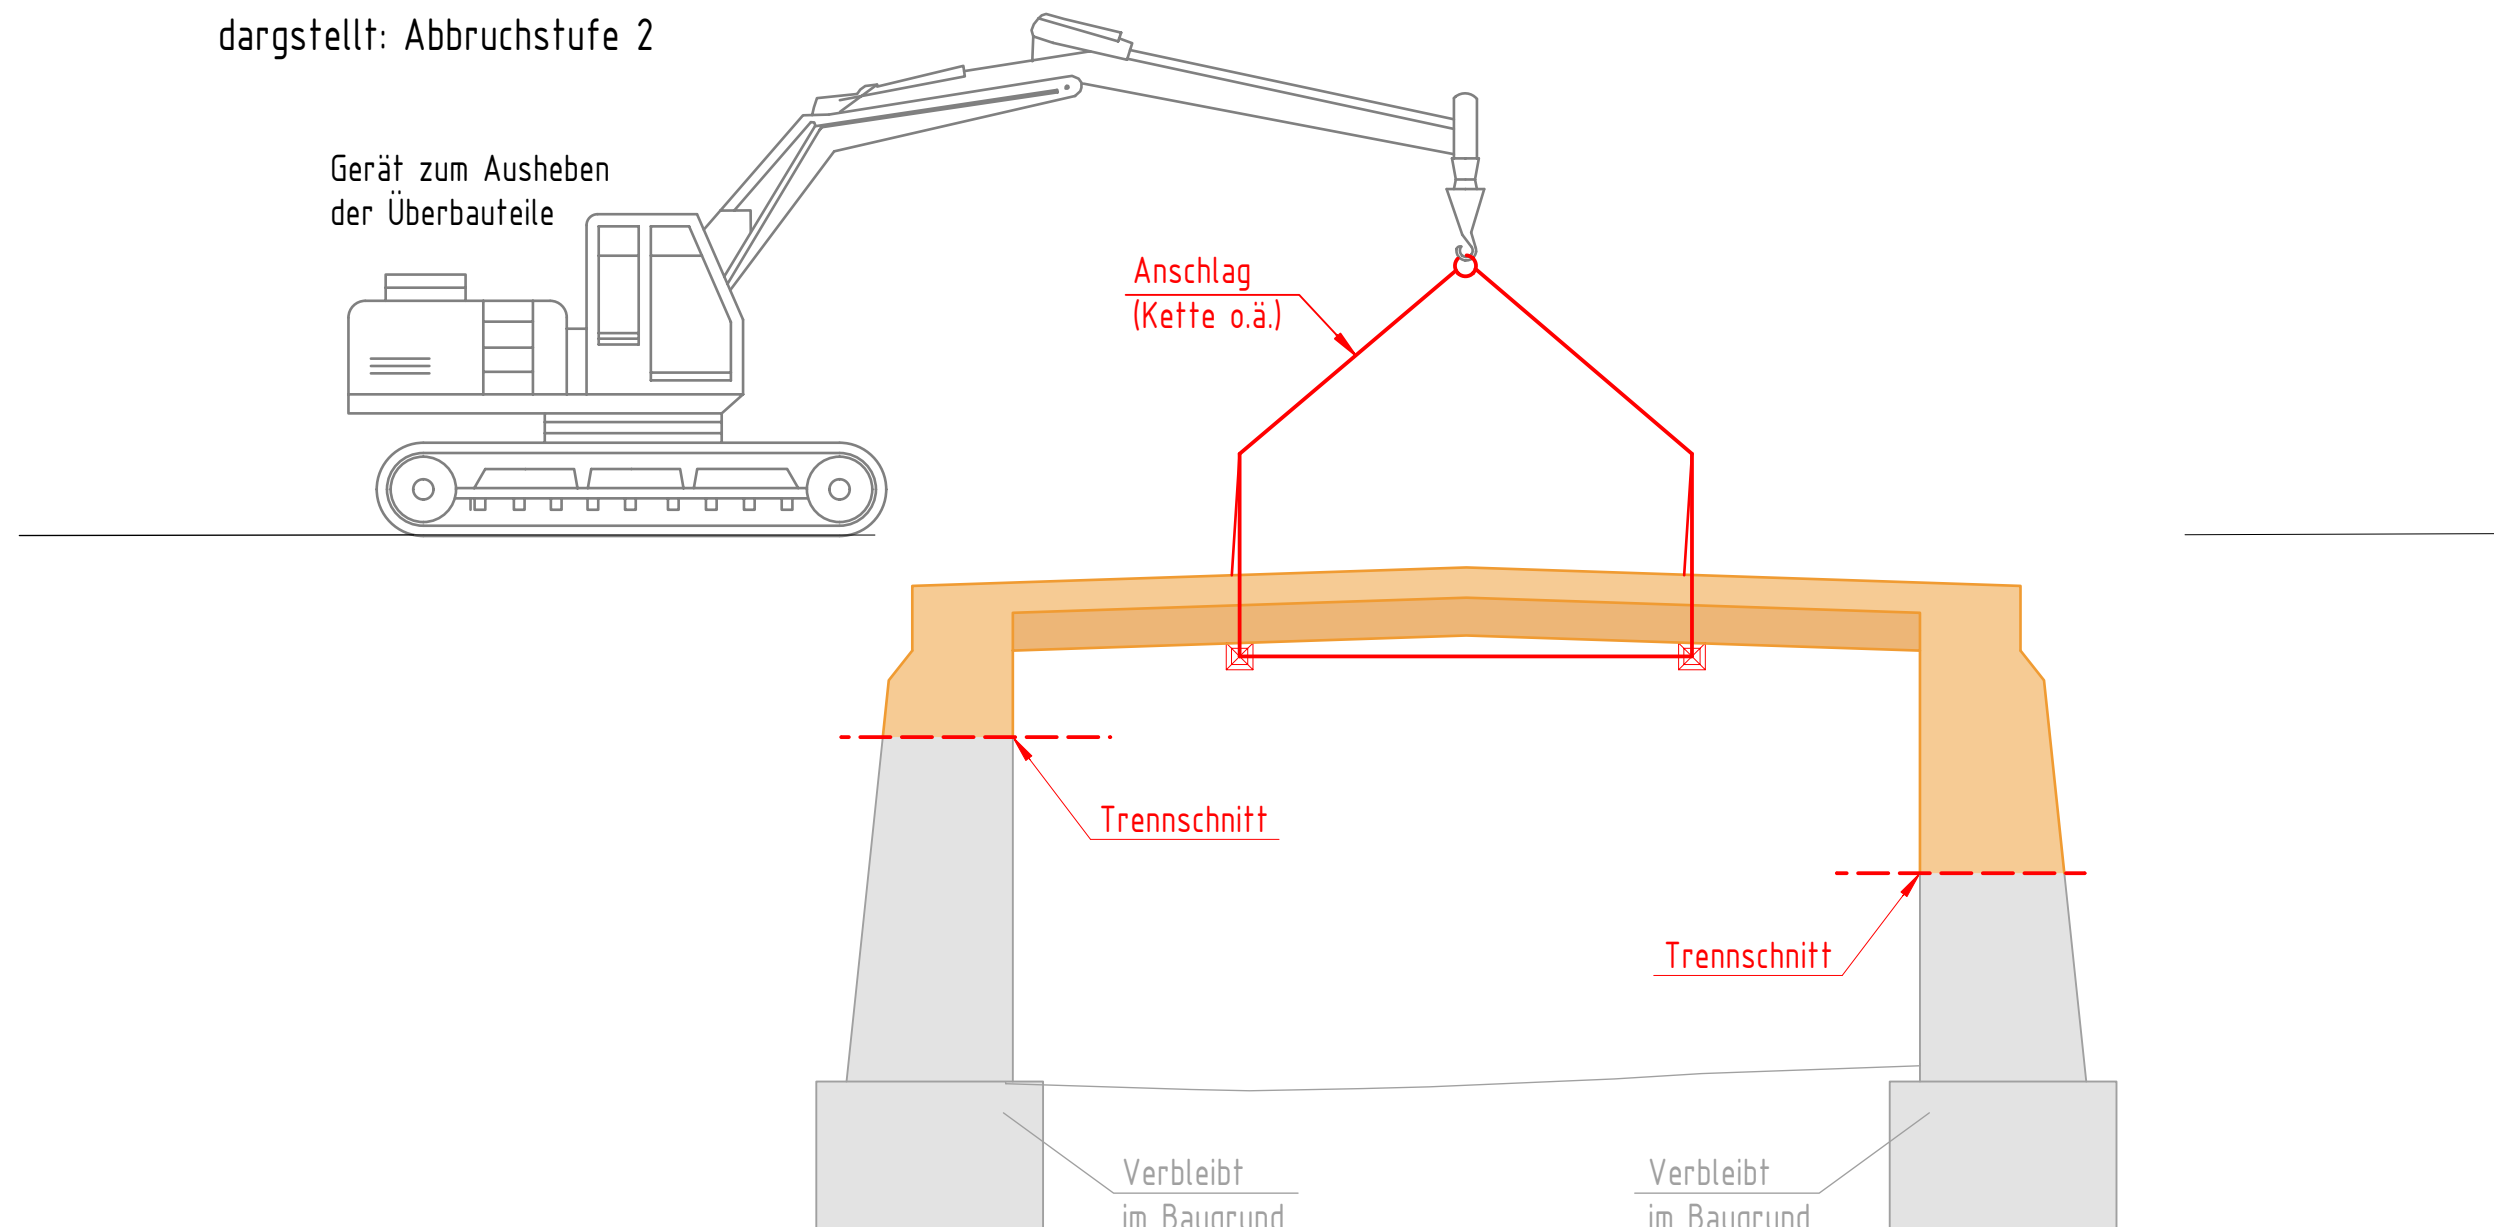

Gerät zum Ausheben der Überbauteile

Anschlag (Kette o.ä.)

Trennschnitt

Trennschnitt


Verbleibt im Baugrund

Verbleibt im Baugrund

Phase 3 M.1:500

Draufsicht


- Phase 3 ca. 6-8 Wochen:
- Teilverfüllung Baugruben (von Norden)
 - Ausbau Bachbett neu im Bauwerksbereich
 - Verfüllung alter Bachlauf (Leistung Gewässerbauer)

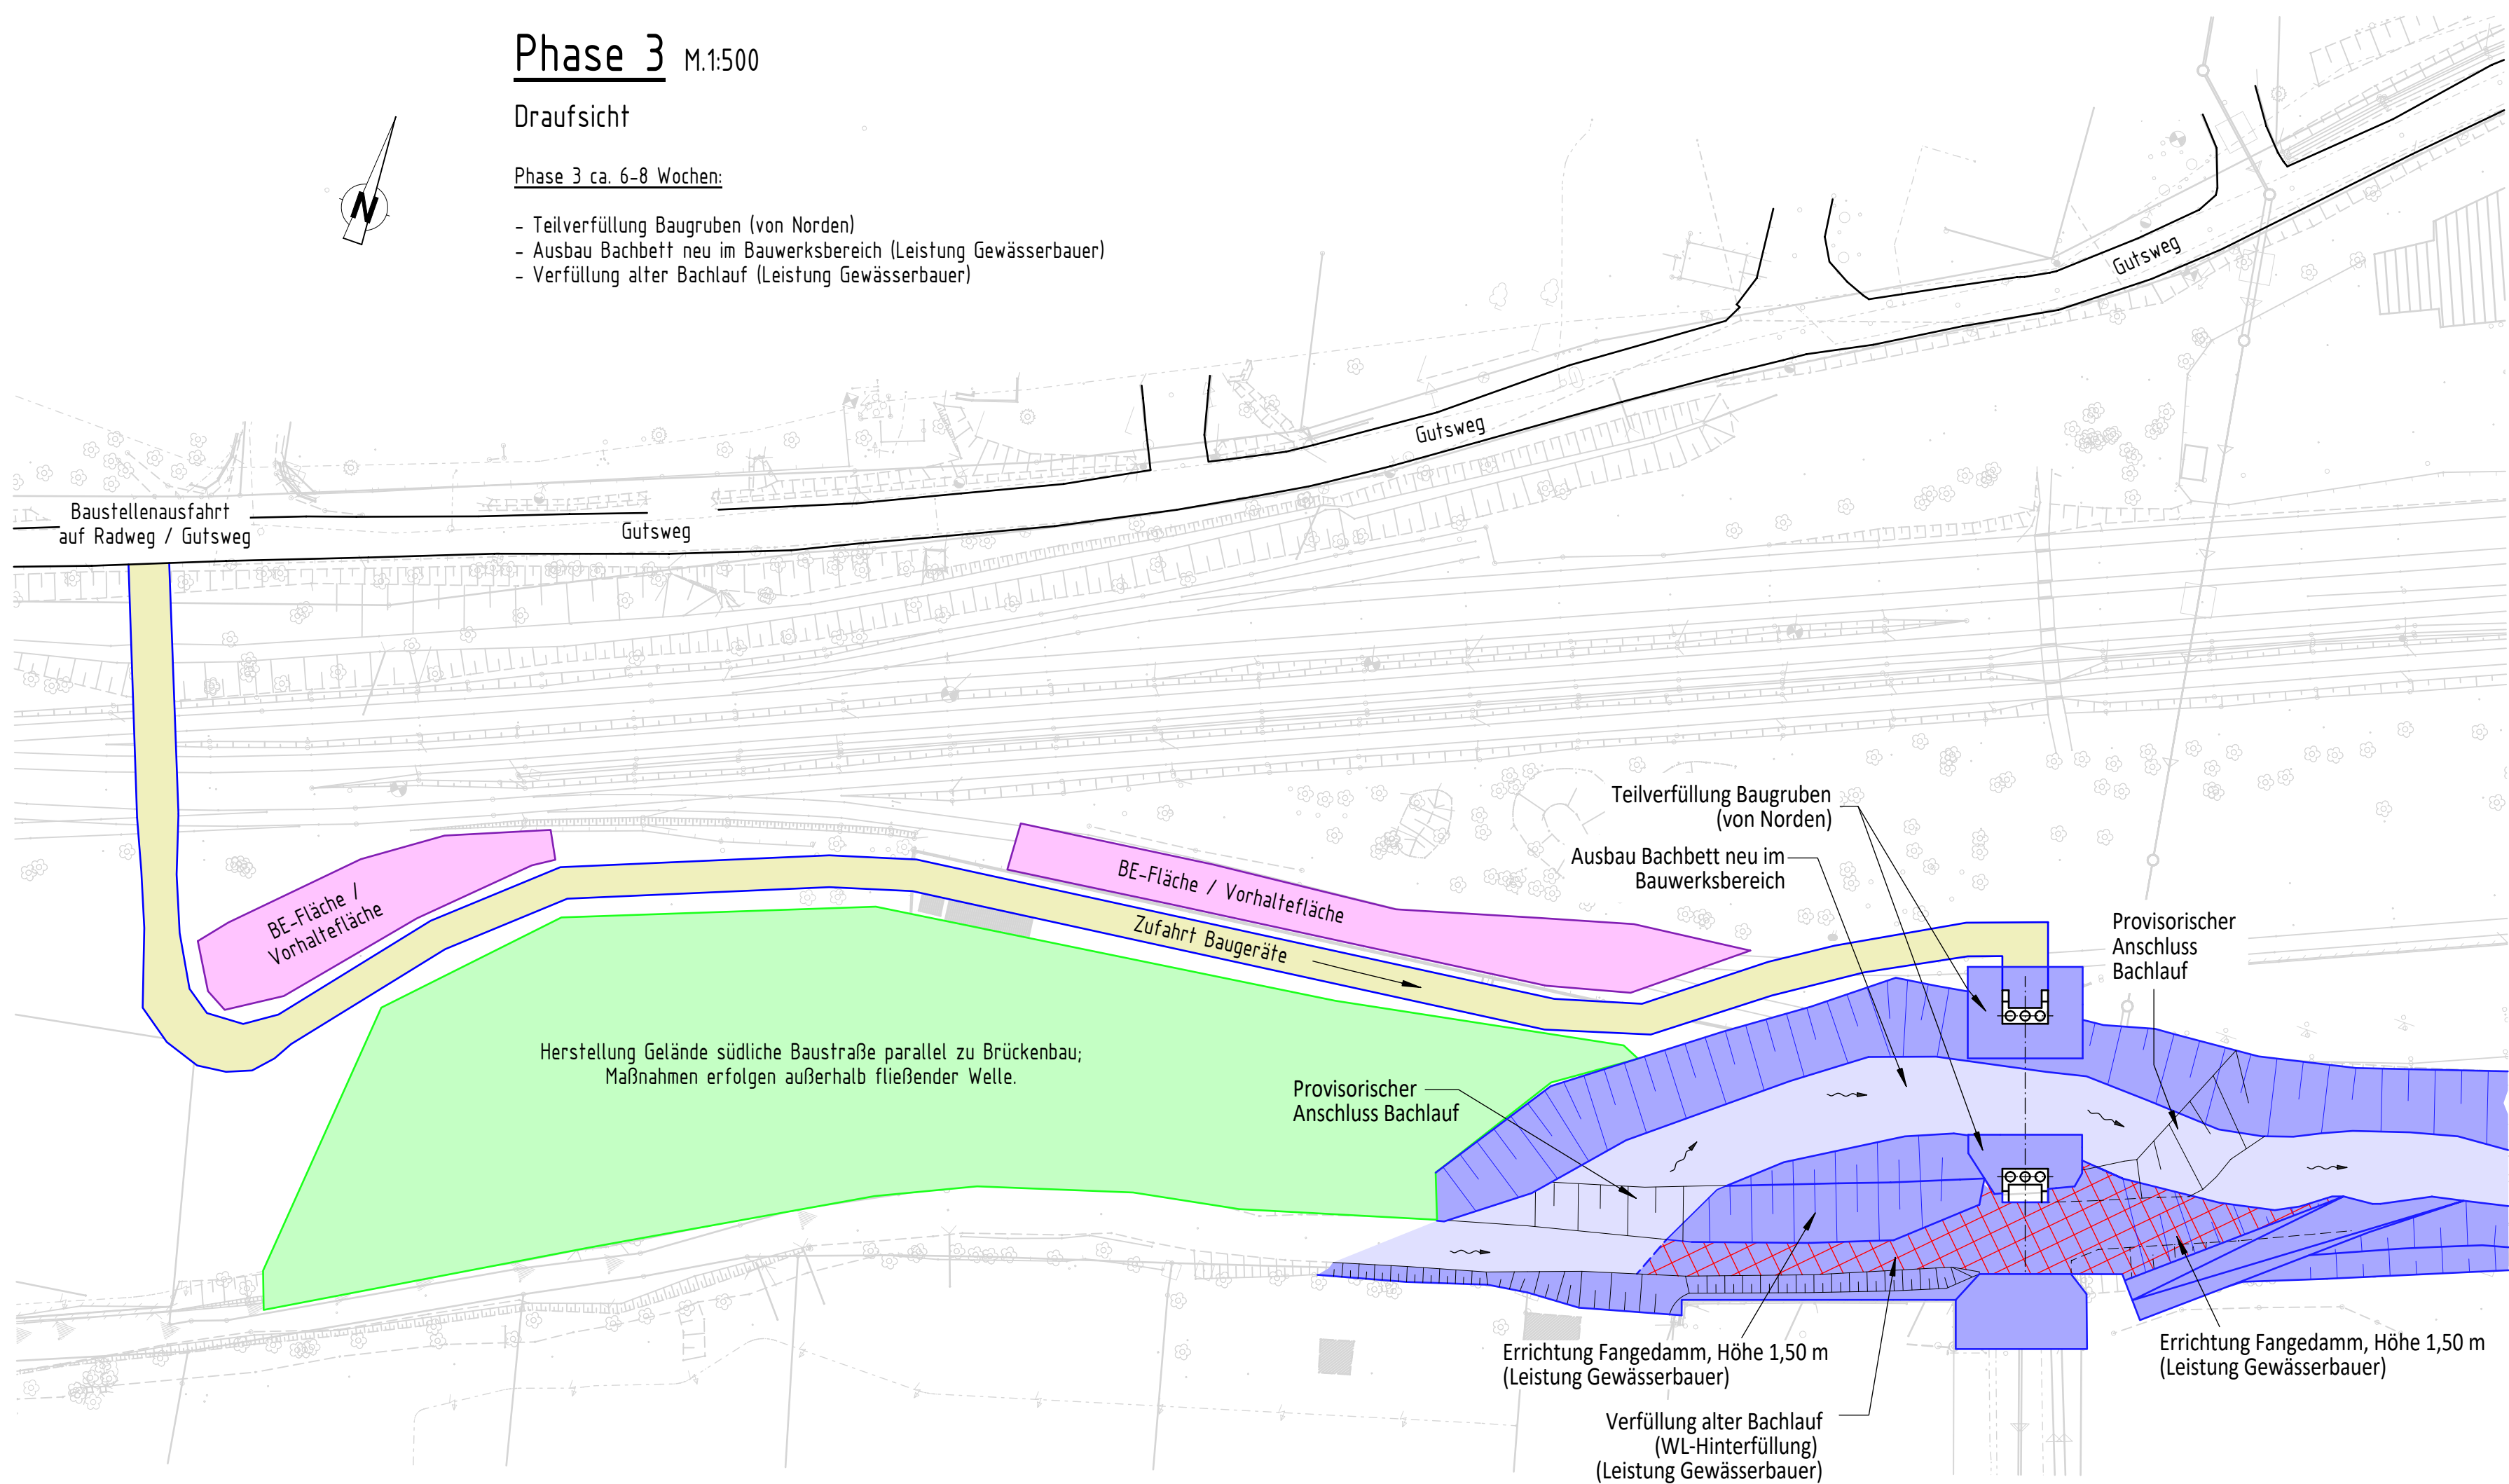

Phase 4 M.1:500

Draufsicht

- Phase 4 ca. 8 Wochen:
- Einheben Fertigteile (Stellfläche Mobilkran auf altem Bachbett) Zufahrt Mobilkran und Anlieferung FT von Süden
 - Fertigstellung Rahmenecken (WL Nord von Norden, WL Süd von Süden)
 - Restverfüllung Baugruben, Einbau Dichtung, Asphalt, Geländer, sonstige Ausstattung

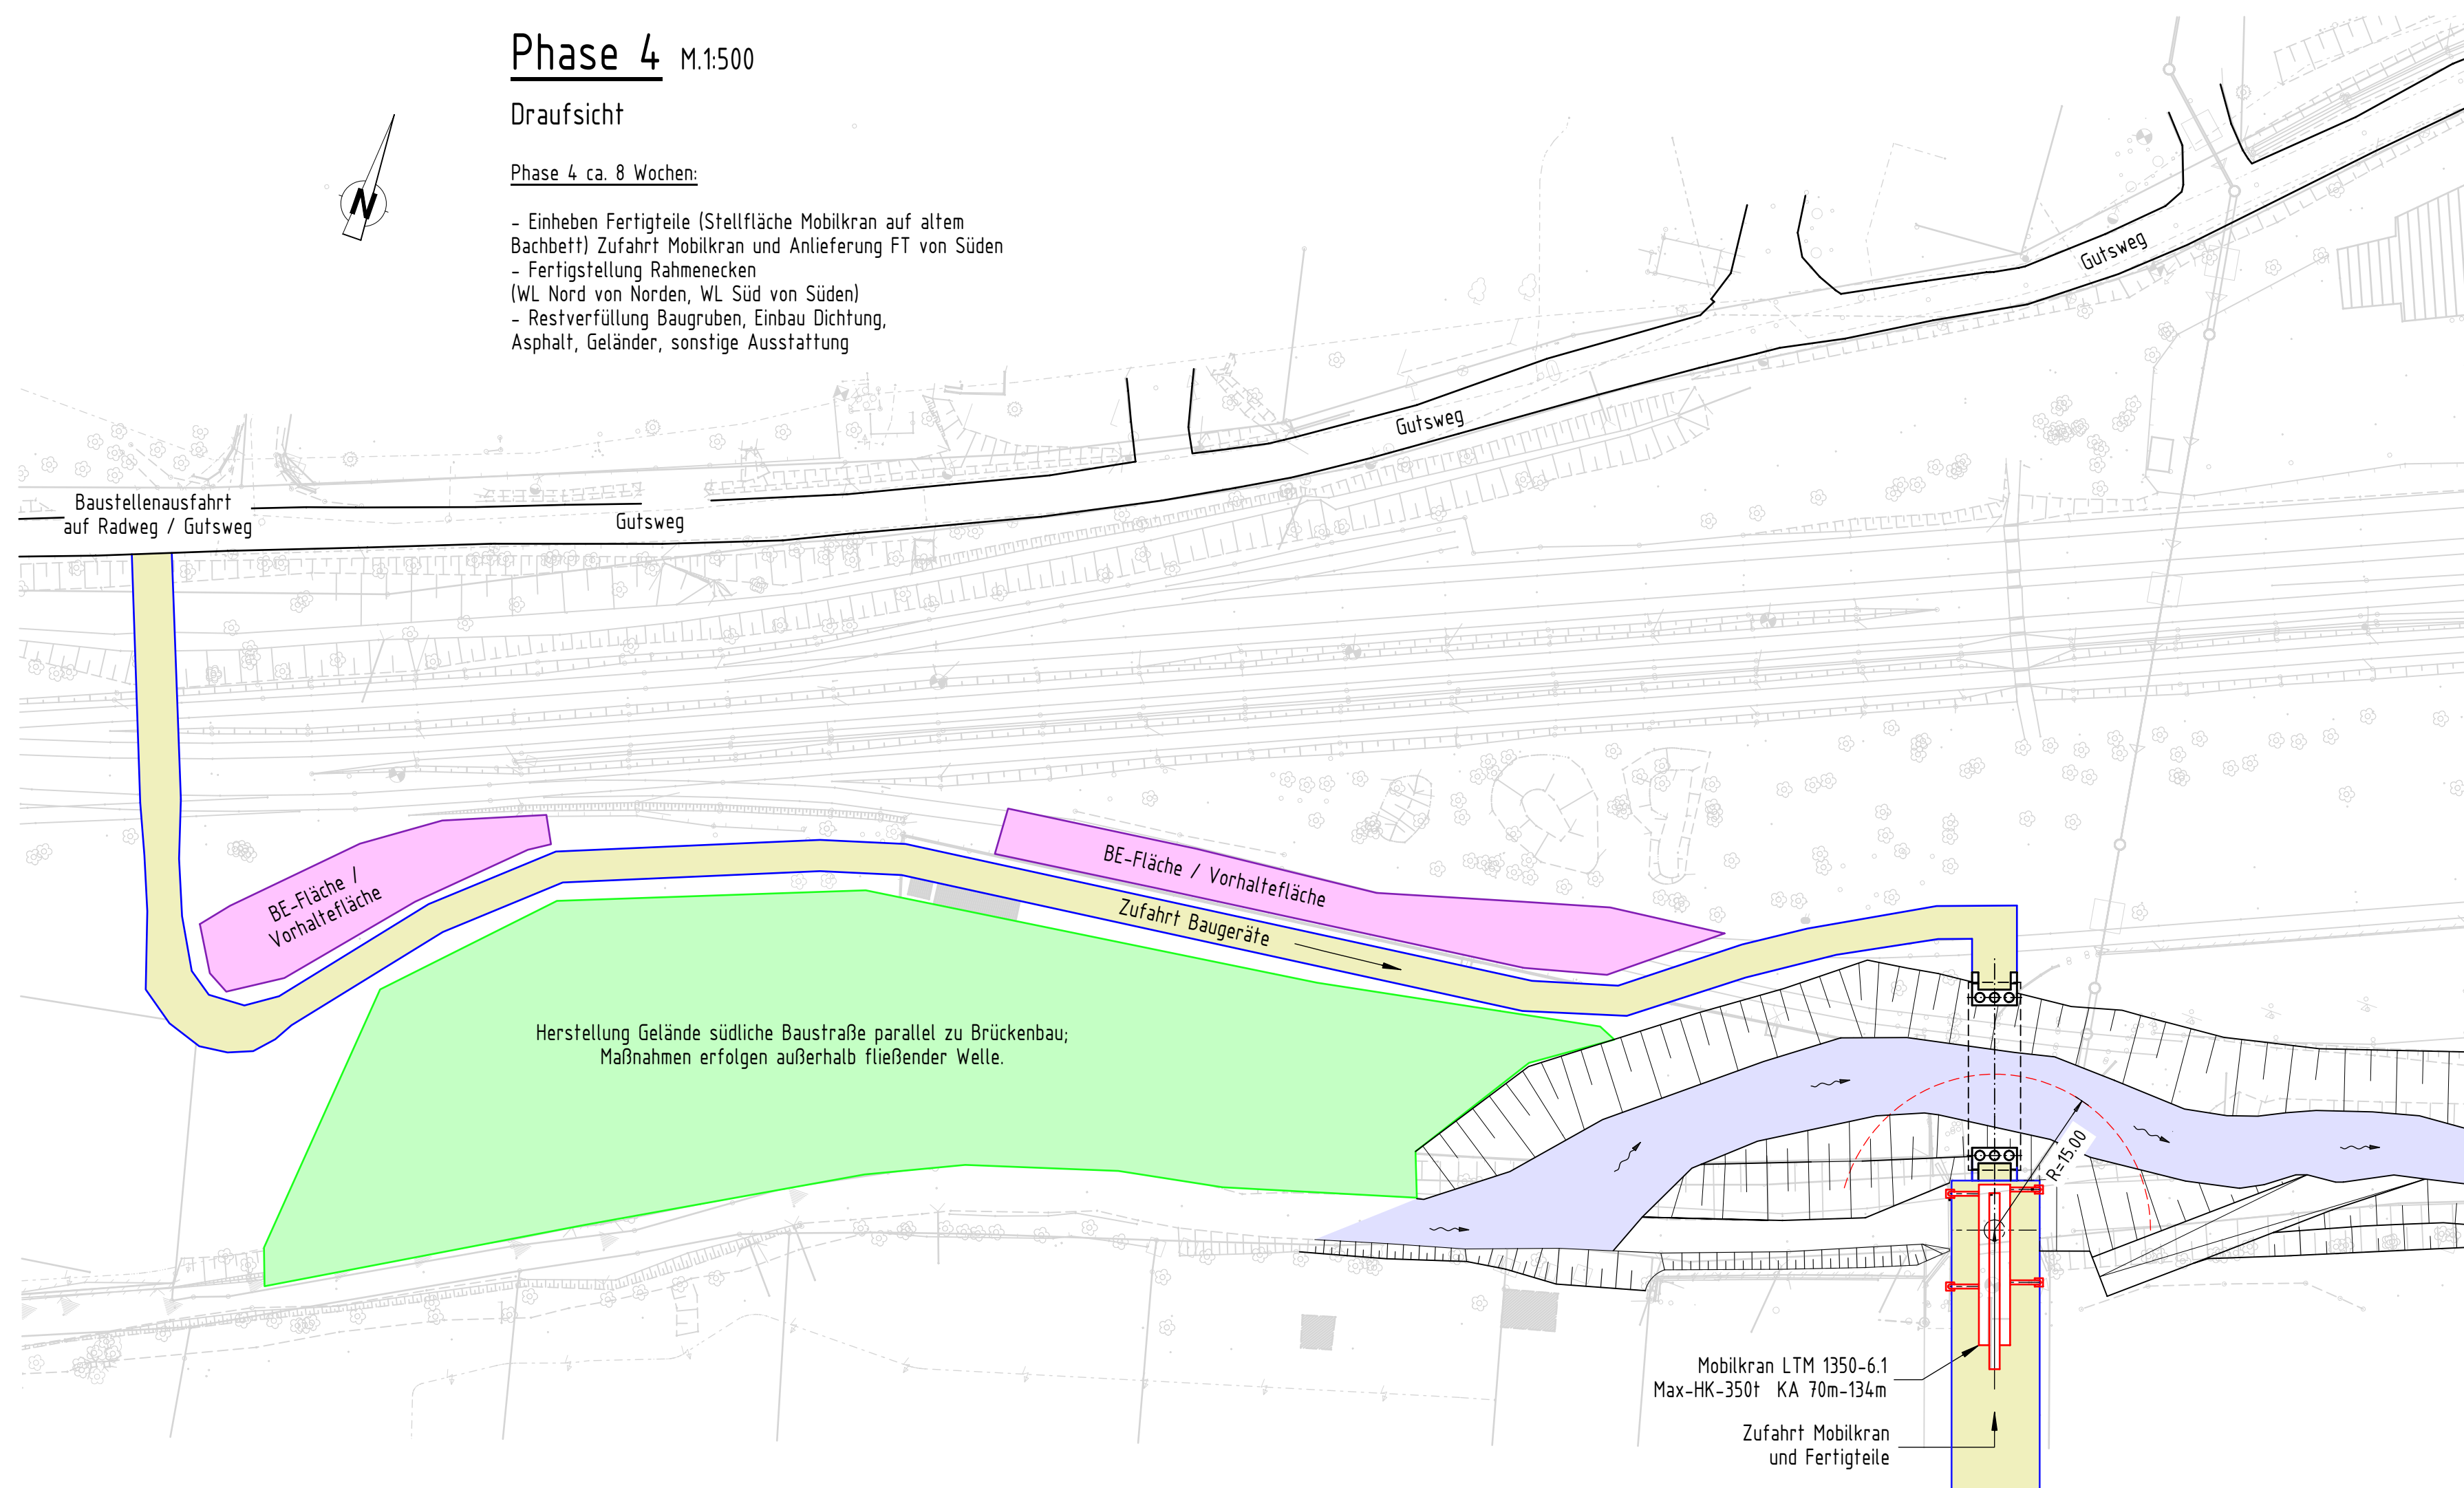

Mobilkran LTM 1350-6.1 Max-Hk-350t KA 70m-134m

Zufahrt Mobilkran und Fertigteile

Planinhalt gilt nur für die Ausschreibung!

Höhensystem: DHN 16

Lagesystem: ETRS 89-UTM 33

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.

Entwurfsbearbeitung		Projekt-Nr.: V21-086	
		Bearb.: 05/2023	Datum
		Gez.: 05/2023	Zul.
		Gepr.: 05/2023	Möller
Geändert		Datum	Gez.
a	Baustellenzweige geändert, Abbruch Bestandsbauwerk	12/2024	V. Kreyer
b			
c			
d			
 CHEMNITZ KULTURHAUPTSTADT EUROPAS 2025		Unterlage: 8	
		Blatt - Nr.: 2a	
		Projekt-Nr.:	
		ASB-Nr.:	
Bauwerk/Baumaßnahme		Bearb.:	Datum
Neubau Pleißenbachgrünzug "Stadtgut"		Gez.:	
		Gepr.:	
		ASB-Nr.:	
Plandarstellung		Bauwerksplan	
Bauphasen, Abbruch Bestandsbauwerk		Maßstab: 1:500, 1:200	
Aufgestellt:		Geprüft:	
Gesehen:		Genehmigt:	
