

Nördlicher Auenwald

Standort:
die nächste
Waldwegkreuzung

Fachgerechte Fahrbahnertüchtigung
z.B. mit Fahrschutzplatten

Auswechslung TWL DN 200 auf 19,17 m


Park Rosenthal

Waldweg temporär
fachgerecht
befestigen


Aufstellfläche
Abfalltonnen

Nördlicher Auenwald

HT 1

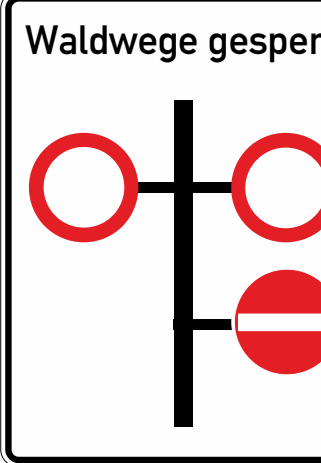

HT 2

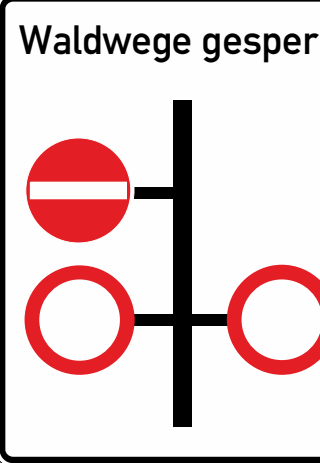

- technologischer Bauraum (Baufahrzeuge, Baumaterial, WC, Container)
- Rohrgraben, Breite 1,20 m, Kopfgruben 1,50 m x 1,50 m
- vorhandene AW-Rohrtrasse, AW-Schächte,
- Wegertüchtigung/ Fahrbahnertüchtigung
- Trinkwasserleitung Bestand/ neu
- mobile Beschilderung
- vorhandene stationäre Beschilderung
- vorhandene mobile Beschilderung

Haltverbote (Z 283) werden **3 volle Tage**
vor Beginn der Maßnahme gestellt,
mit Zusatzsatz "**ab...**" und ggf.
mit Zusatzzeichen ZZ 1060-31.
**Ein Protokoll über die Haltverbotsstrecken
wird angefertigt.**

Die Baugrubensicherung erfolgt **bauseits**
entsprechend der TL - Absperrschranken.

Grundstückszugänge und -zufahrten sind
bauseits ständig gesichert, operativ
zu gewährleisten.

Die umfangreiche Anliegerinformation
erfolgt **bauseits** vorab.

Rettungs- und Entsorgungsverkehr
werden **bauseits** gesichert gewährleistet.

Auftraggeber:

Leipziger
Wasserwerke

LSI
Leipzig

LSI GmbH, Sommerfelder Straße 71,
04316 Leipzig
Tel.: 0341 33621-0
E-mail: info@lsi-gmbh.de

Gesamtzeit Bauausführung:

Phase 0: 01.10.2025 - 15.10.2025

Umverlegung TWL

Planung Verkehrsabsicherung

Bauvorhaben:

**Leipzig, Dammweg
zw. Marienweg und Möckernsche Allee**
Sanierung des 2.nördlichen Hauptsammlers
Mühlwiese/ Rosenthal



	Datum	Name	Maßstab	Projekt-Nr.:	Plan-Nr.:
gezeichnet	24.06.2025	E. Filcheva	1:500	2025-21617	1
geändert			DIN A1		
