


Umschluss Schritt 3

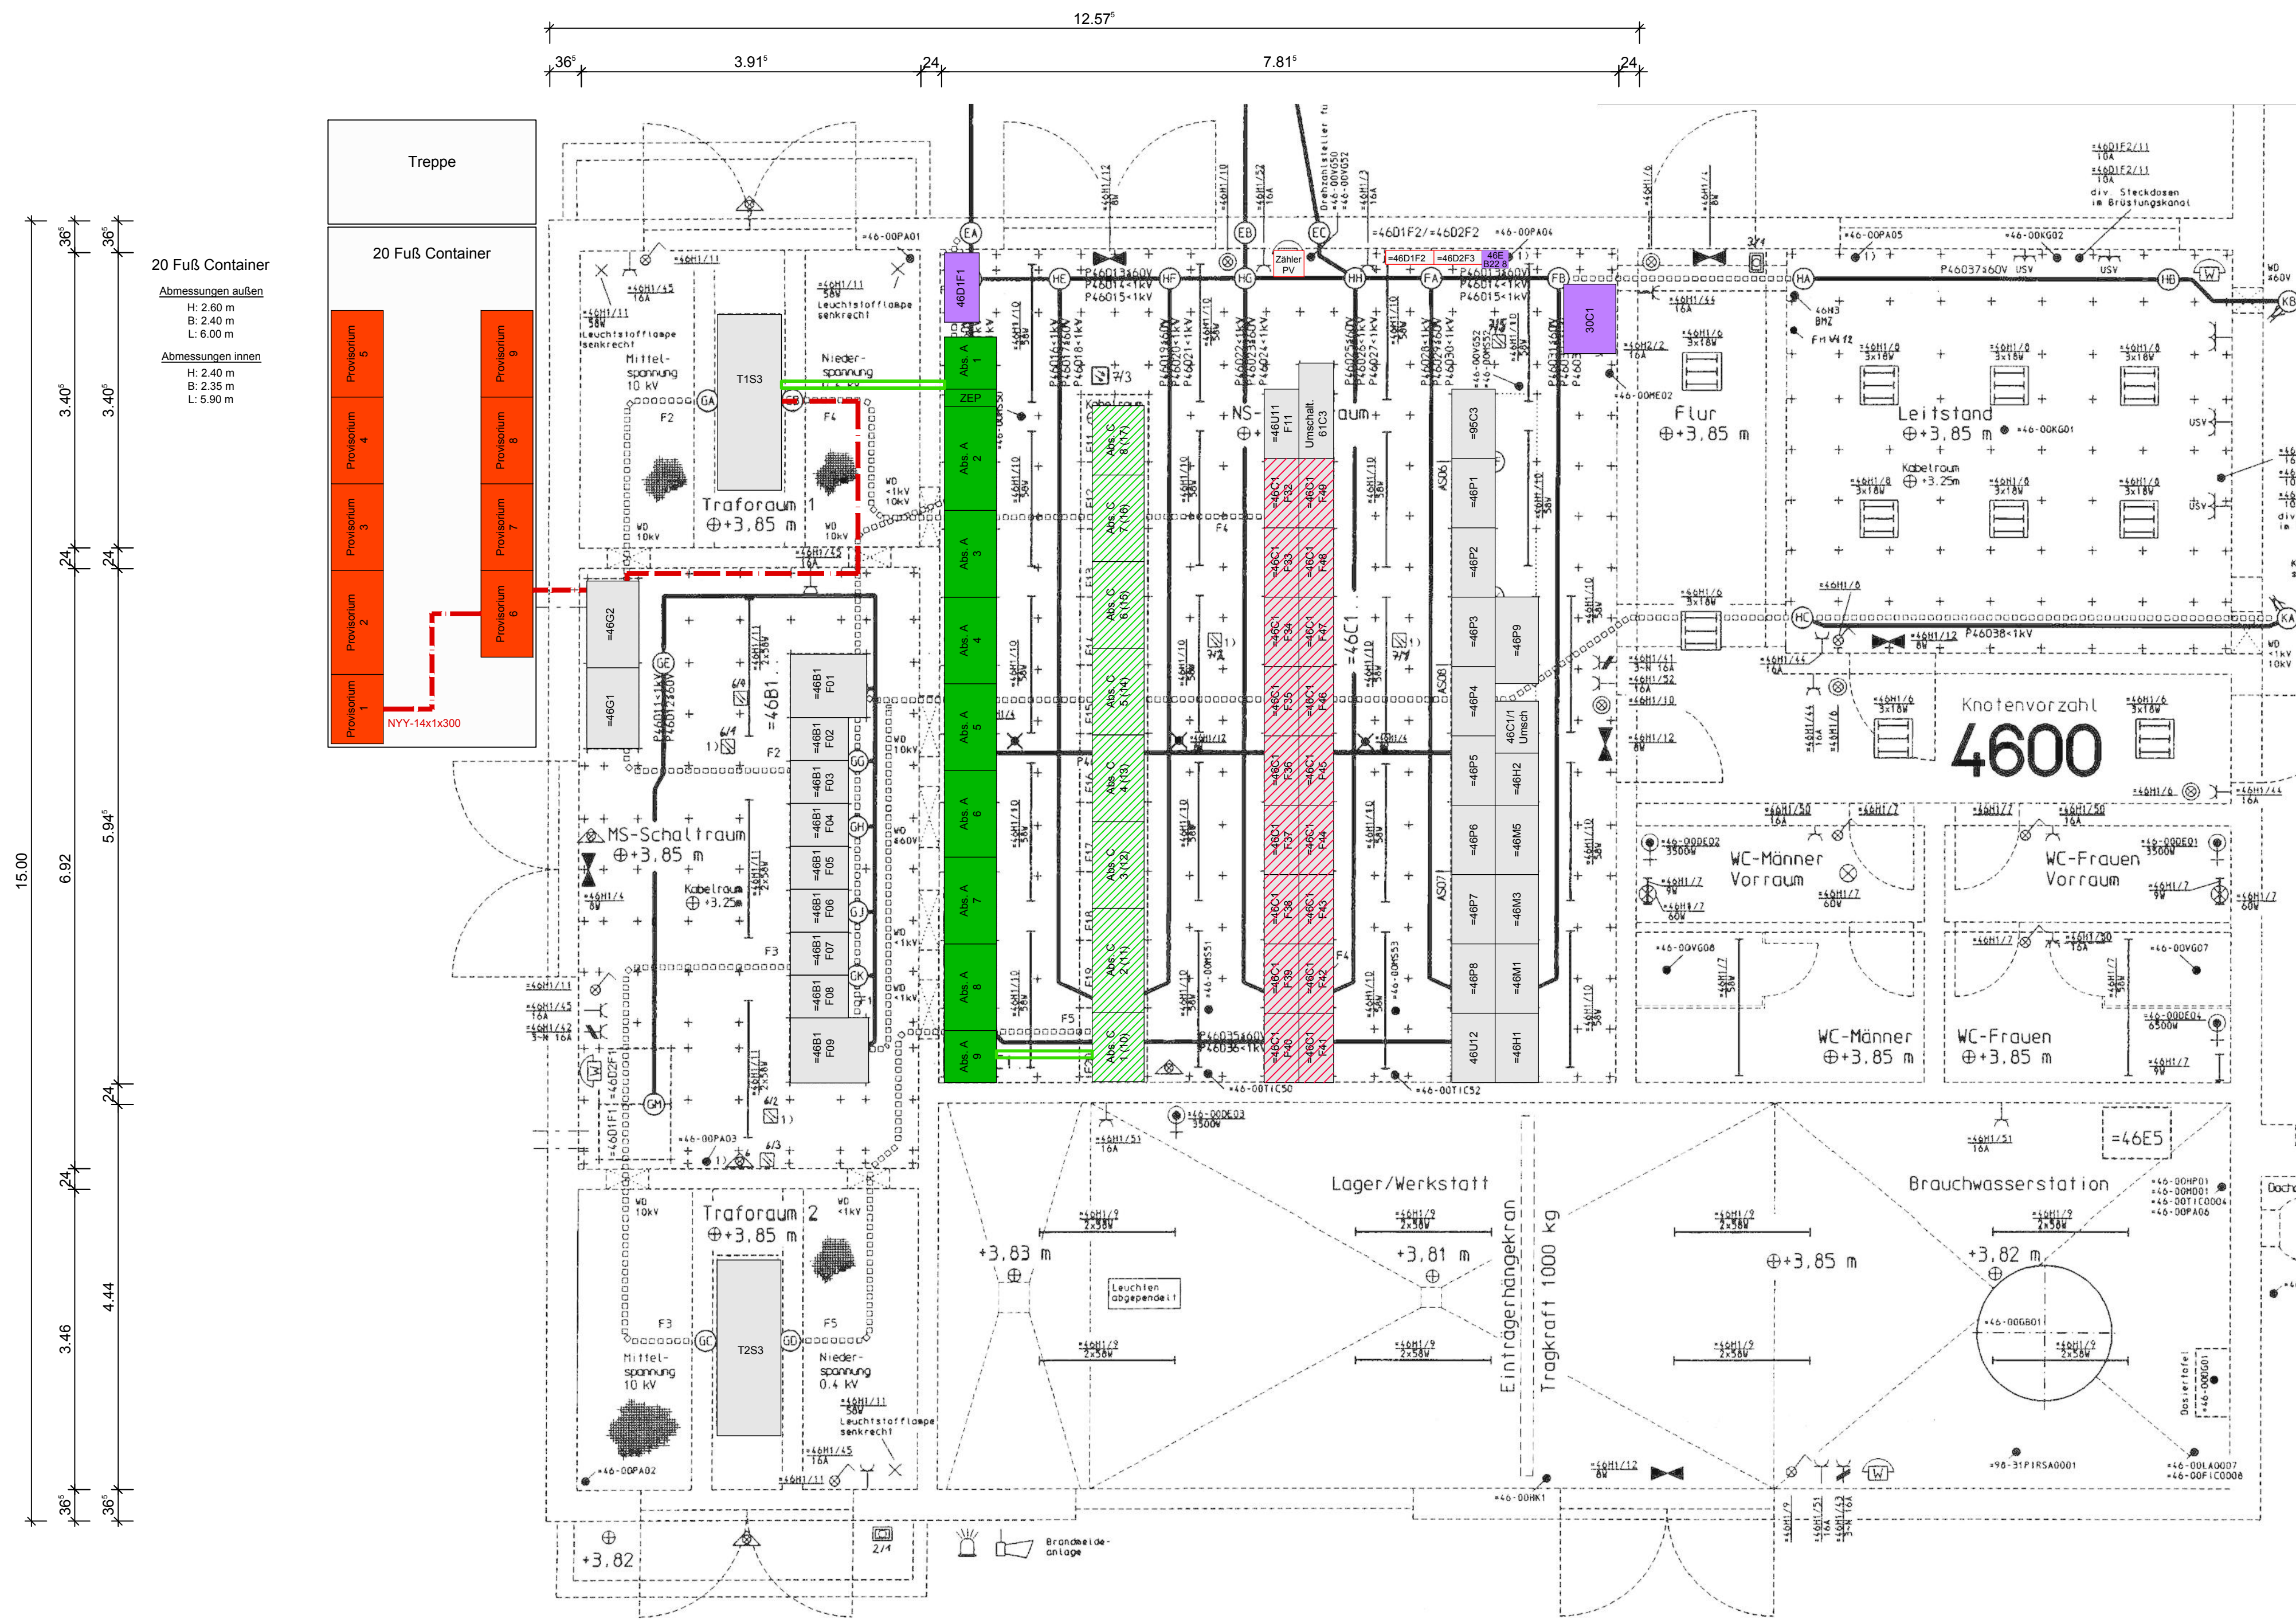


Legende:

- Schränke Bestand - Abschnitt A
- Schränke Bestand - Abschnitt B
- Schränke Bestand - Abschnitt C
- Schränke Bestand - nicht zuzuordnen
- Schränke Bestand - nicht relevant für den Umschluss
- Schränke Bestand - umversetzt
- Schränke neu - Provisorium
- Schränke neu - Abschnitt A
- Schränke neu - Abschnitt B
- Schränke neu - Abschnitt C
- Montage neuer Schränke
- Demontage alter Schränke
- zu versetzende Schränke
- Provisorische Kabel
- Stromschiene

- Aufstellung 8 neuer Schränke
 - Rastermaß Doppelboden anpassen
 - Schränke aufstellen
 - Energieversorgung vorbereiten
 - Stromschienenverbindung zwischen Abschnitt A Feld 9 zu Abschnitt C Feld 1 herstellen
 - Kabelzug vorbereiten
- Umschluss auf die neu aufgestellten Schränke
 - Die einzelnen Umschlüsse sind der Verteileransicht Abschnitt C zu entnehmen.
 - Kabel schneiden / Kabel abklemmen
 - Umschwenken der Kabel auf die neuen Aufstellorte
 - Anklemmen der Kabel

- Demontage der Schränke 46C1 F32 bis F49


ENTSORGUNGSBETRIEB DER STADT CHEMNITZ  **Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz**

Blankenburgstraße 62 Tel. 0371 4995777
09114 Chemnitz Kundenservice@ASR-Chemnitz.de

Projekt **Erneuerung NSHV Trafostation 3, 4 und 5 ZKA Chemnitz**

Darstellung **Schränkaufstellung NSHV Trafostation 3 Umschluss Schritt 3**

Leistungsphase **Ausführungsplanung**

 Dr. Born - Dr. Ermel GmbH Dresden Schachtsstraße 1 · 01705 Freital Tel. (0351) 64987-0 Fax (0351) 64987-99 dresden@born-ermel.de · www.born-ermel.de	Maßstab 1:50	Datum	Name	
		gez.	01.10.2024	KI
		geprüft	21.10.2024	PB
		Freigabe	22.10.2024	TM
Datei: siehe linken Planrand		Originalgröße: 594x841		
Zeichnungs-Nr.		3503004-05- E-104		
