

Vorhandene Findlinge entlang der Wege und Fahrgassen zum Schutz vor Befahrung der Wiese und wildem Parken bauzeitlich unangetastet an ihren Standorten belassen.

Kurvenbereich  
mit Bauzaun  
ausklammern  
zum Schutz  
der Kastanie

Kurvenbereich mit Bauzaun –  
ausklammern zum Schutz  
von Baum Nr. 16

## Baustellentor

Trafostation  
(Anschluss  
Baustrom)

zum Park während  
der Bauzeit








Entsorgungs-Container  
Schüttgutrutsche,  
Zwischenlagerfläche  
begradigen

Arbeitsraum/  
Gerüststellung








Sicherheitsbereich  $F_{\max} = 300 \text{ kg/m}$   
(4m Abstand zu den Stützmauern)

-  Bearbeitungsgebiet
-  Flurstücksgrenzen
-  Vermessungsinformation im Hintergrund, Stand 09/2022
-  Strauchflächen Bestand
-  Baum Bestand
-  Baumstubben / Wurzelstock




**Baustelleneinrichtung**  
(Zuarbeit von Hochbauplanung Heidelmann & Klingebiel)

	<b>Baustellenzufahrt</b>
	<b>Zufahrt / Zuwegung, ohne bauzeitliche Schutzmaßnahmen</b>
	<b>Baustraße (Erweiterung Zuwegung durch Abtrag Oberboden und Einbau 20 cm Mineralgemisch auf Flies)</b>
	<b>Aufstell- und Lagerfläche</b>
	<b>Gerüststellfläche Dachfangerüst</b>
	<b>Gerüststellfläche Fassadengerüst</b>
	<b>Sicherheitsbereich Teich-Stützmauern (Vorgabe von Henneker Zilling, Beratende Ingenieure Leipzig PartG mbH)</b>

### Gehölzschutz über die gesamte Bauzeit (Aufbau im BE-Los)

-  Baumkronenschutz zzgl. 1,50 m
-  Stammsschutz
-  Baumschutzkasten
-  Ortsfester Bauzaun  
doppelt verschraubt, mit Erdanker gegen Verrücken fixiert
-  Wurzelschutz  
Baumkronen zzgl. 1,50 m; Stahlplatten
-  Wurzelschutz  
Wurzel im Fahrbereich sichtbar; Vlies + 20 cm Sand + Stahlplatten
-  Wegeschutz  
Sicherung historischer Wegebeläge; Vlies + 20 cm Mineralgemisch 0/3


Gehölzschutz im Park während Bauzeit Tief- und Landschaftsbau  
(Aufbau durch GaLaBauer)

	Ortsfester Schutzzaun
	Stammschutz
	Baumschutzkasten wenn Wurzelanlauf in Fahrgasse ragt

[illegible]

0000 \_ 00

Projektnummer	Ph.	Ersteller	Planart	Verortung	Gebäude- teil	Plan-Nummer	Planau- schnitt	Index	Status
---------------	-----	-----------	---------	-----------	------------------	-------------	--------------------	-------	--------

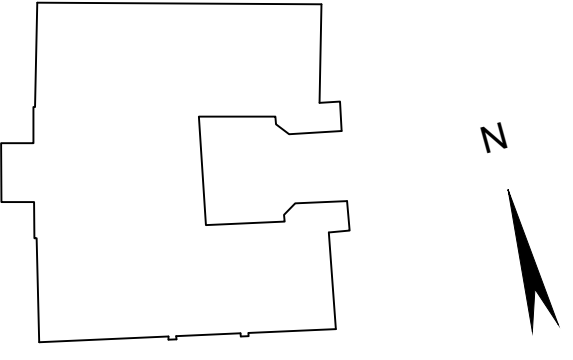

**±0,00= 238,08 DHHN**      Raum für zusätzliche Informationen für Vermessung usw.

# Schloss Seifersdorf

## Touristische Erschließung zu einem Erlebnisschloss

Bauherr:

**Gemeinde Wachau**  
Teichstr. 2, 01454 Wachau



Fon: +49 3528 . 48 08-2  
Fax: +49 3528 / 4808-18  
email: [info@wachau.de](mailto:info@wachau.de)

Architektur und Hochbau:

Tragwerksplanung:

Technikplanung:

Planinhalt:

# A-090\_Lageplan BE

## Lageplan Baustelleneinrichtung

Phase: Ausführungsplanung	Fachbereich:	Projektleiter:
Unterschrift Bauherr:	Unterschrift Bauvorlageberechtigter/ Projektleiter:	bearbeitet:
		gezeichnet:
		geprüft:

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.  
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
