


Stand: 25. Feb. 2025 13:25
Ausgabe: 25. Feb. 2025 13:26
Bearbeiter: Helene Charpentier
P:\UZ_Pig\Bau\30 Drifte\0230-0109 Stett Arneburg, Weichen\00A\08 Planung\06 LPE Vorbereitung Vergabe\01 Bearbeitung\03 CAD\AU_Arneburg_LP.dwg
Plotsitellatelle: Layout: AU_LP_W6_W14

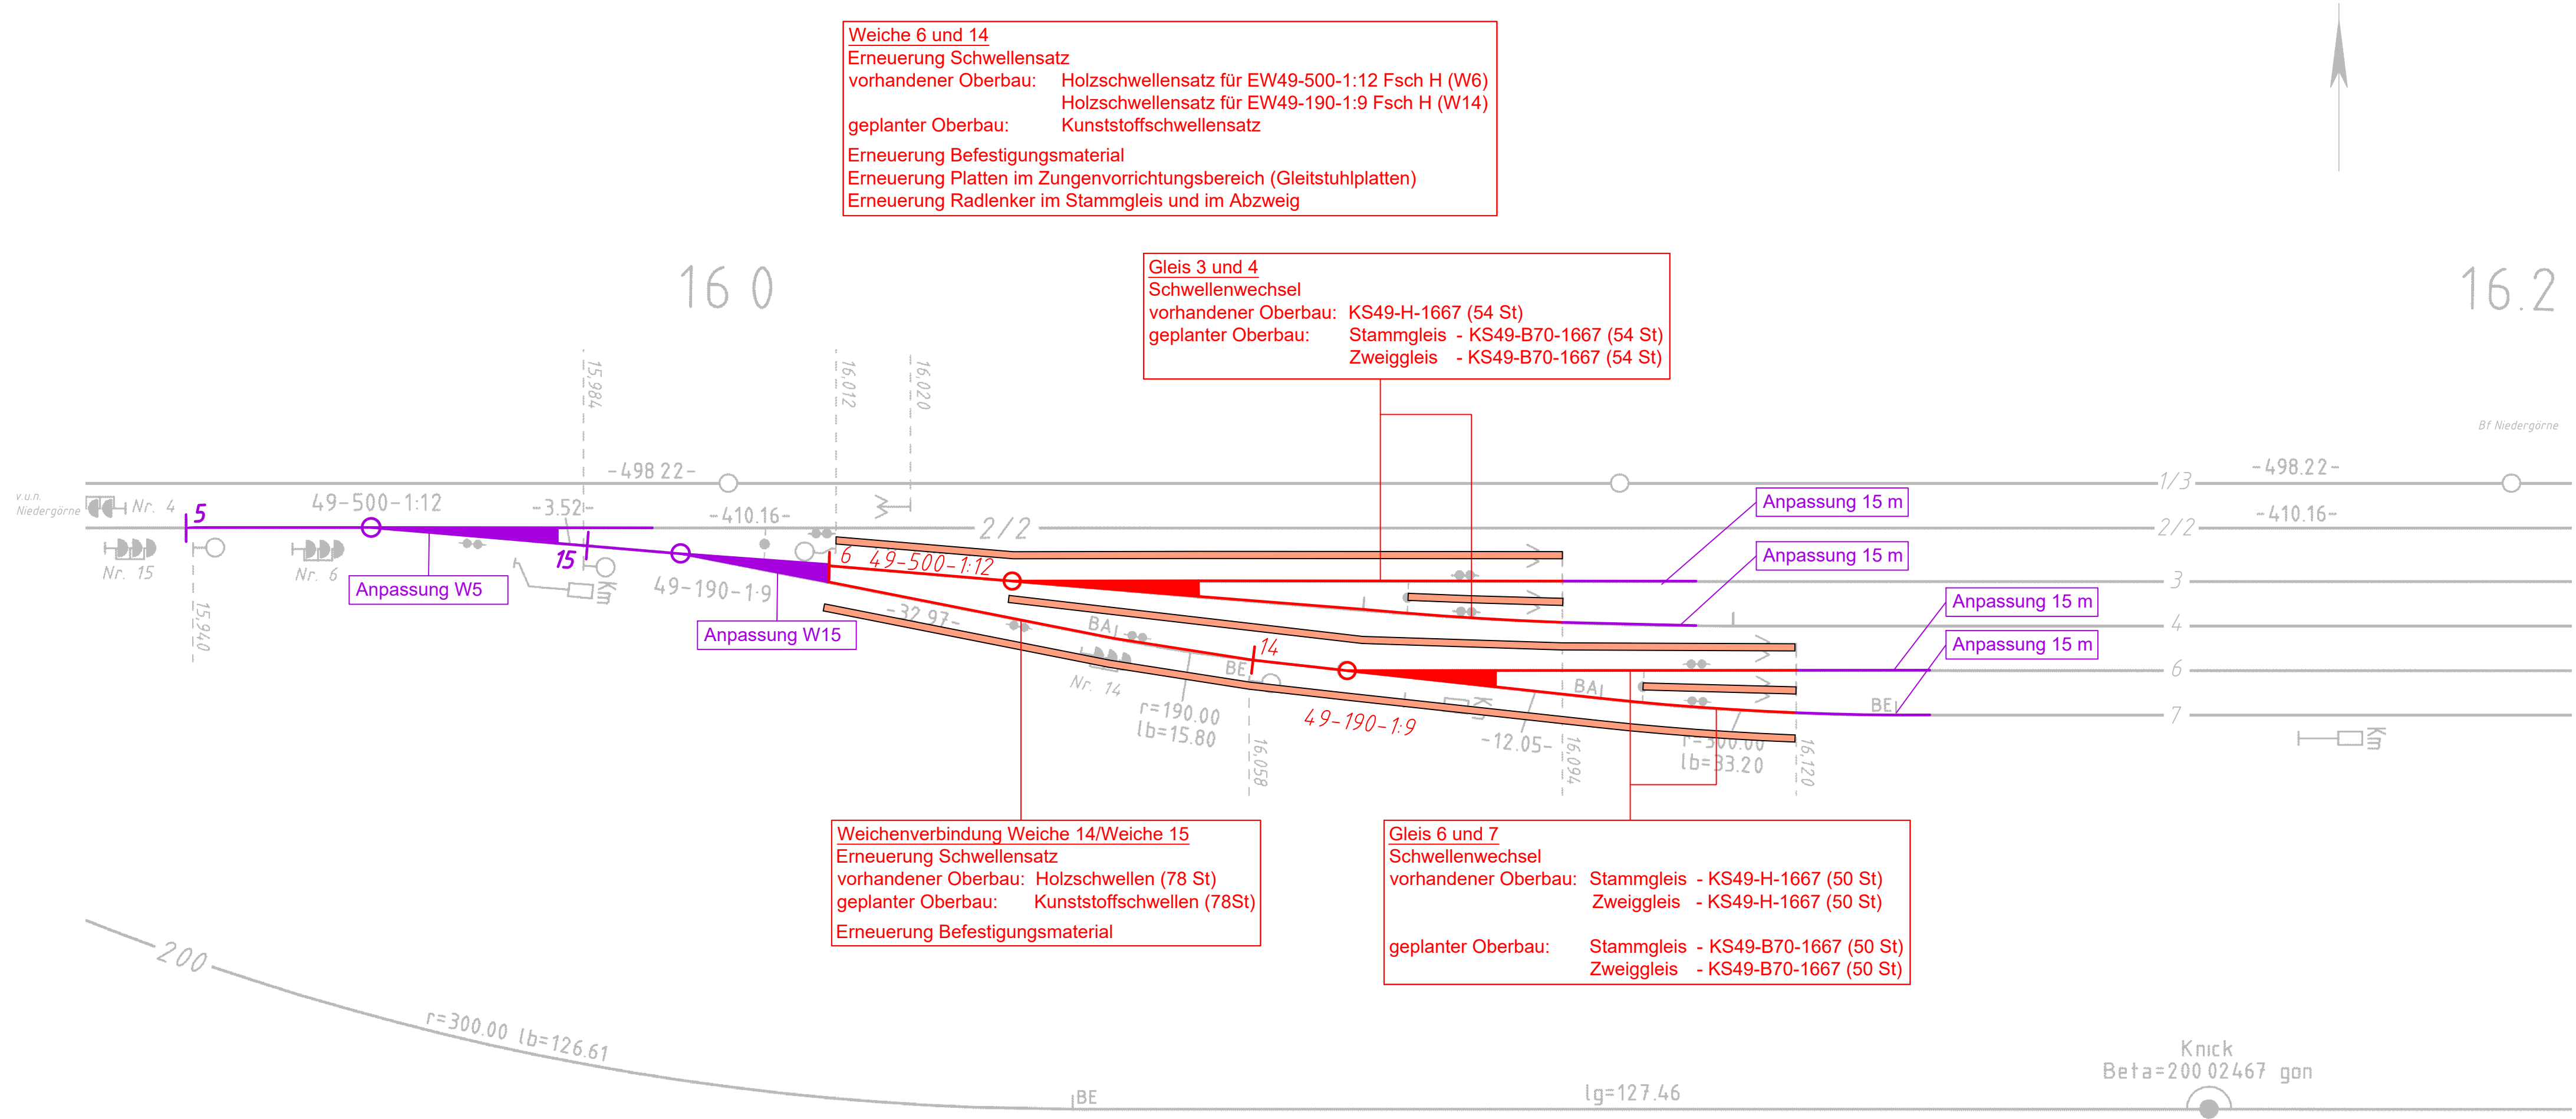

Weiche 6 und 14
Erneuerung Schwellensatz
vorhandener Oberbau: Holzschwellensatz für EW49-500-1:12 Fsch H (W6)
Holzschwellensatz für EW49-190-1:9 Fsch H (W14)
geplanter Oberbau: Kunststoffschwellensatz
Erneuerung Befestigungsmaterial
Erneuerung Platten im Zungenvorrichtungsbereich (Gleitstuhlplatten)
Erneuerung Radlenker im Stammgleis und im Abzweig

Gleis 3 und 4
Schwellenwechsel
vorhandener Oberbau: KS49-H-1667 (54 St)
geplanter Oberbau: Stammgleis - KS49-B70-1667 (54 St)
Zweiggleis - KS49-B70-1667 (54 St)

Weichenverbindung Weiche 14/Weiche 15
Erneuerung Schwellensatz
vorhandener Oberbau: Holzschwellen (78 St)
geplanter Oberbau: Kunststoffschwellen (78St)
Erneuerung Befestigungsmaterial

Gleis 6 und 7
Schwellenwechsel
vorhandener Oberbau: Stammgleis - KS49-H-1667 (50 St)
Zweiggleis - KS49-H-1667 (50 St)
geplanter Oberbau: Stammgleis - KS49-B70-1667 (50 St)
Zweiggleis - KS49-B70-1667 (50 St)

Legende	
	Bestand
	Instandhaltung
	Randweg

Index:		Änderungen bzw. Ergänzungen				Name:		Datum:	
Lageskizze									
