

BKB 1 / RKS 1-2023

▽ 0.00m

Ansatzpunkt:GOK

0.000m

P1.1 ☒ 0.11m

0.110m

Parkett und Holzaufbau

P1.2 ☒ 0.18m

0.113m

Bitumenbahn, 2 bis lagig
schwarz

P1.3 ☒ 0.18m

0.178m

Estrich, Beton
grau

P1.4 ☒ 0.41m

0.180m

Bitumenbahn, 2 bis lagig
starker PAK-Geruch

Beton

schwankende Stärke 20 bis 23 cm
grau

0.600m

Auffüllung

Kies, sandig, schwach schluffig
locker bis mitteldicht, erdfeucht
rotbraun

[GU]

0.950m

Auffüllung

Kies und Sand, schwach schluffig bis schluffig, sehr
schwach Ziegelreste
locker bis mitteldicht, erdfeucht
braun

[GU]

[GU*]

▽ -1.00 m

1.000m

Lößderivat


Schluff, tonig, schwach sandig
steif, erfeucht
braun

TM

kein Grundwasser angetroffen
Ende Bohrung

BKB 2 / RKS 2-2023

▽ 0.00m

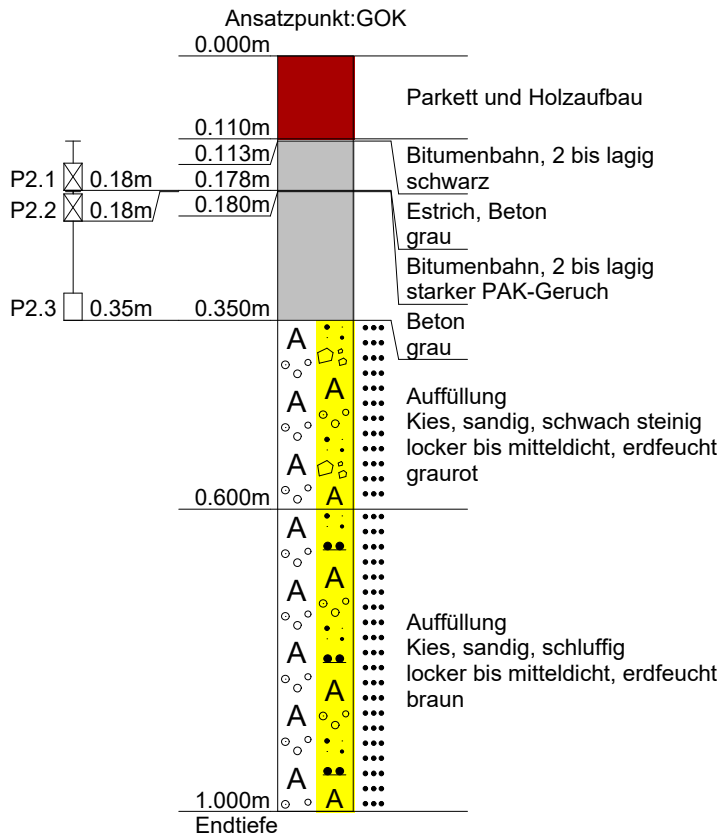

[GW]

[GU*]

▽ -1.00 m

kein Grundwasser angetroffen
Ende Bohrung

