



Verkehrsführung 1 M 1:100

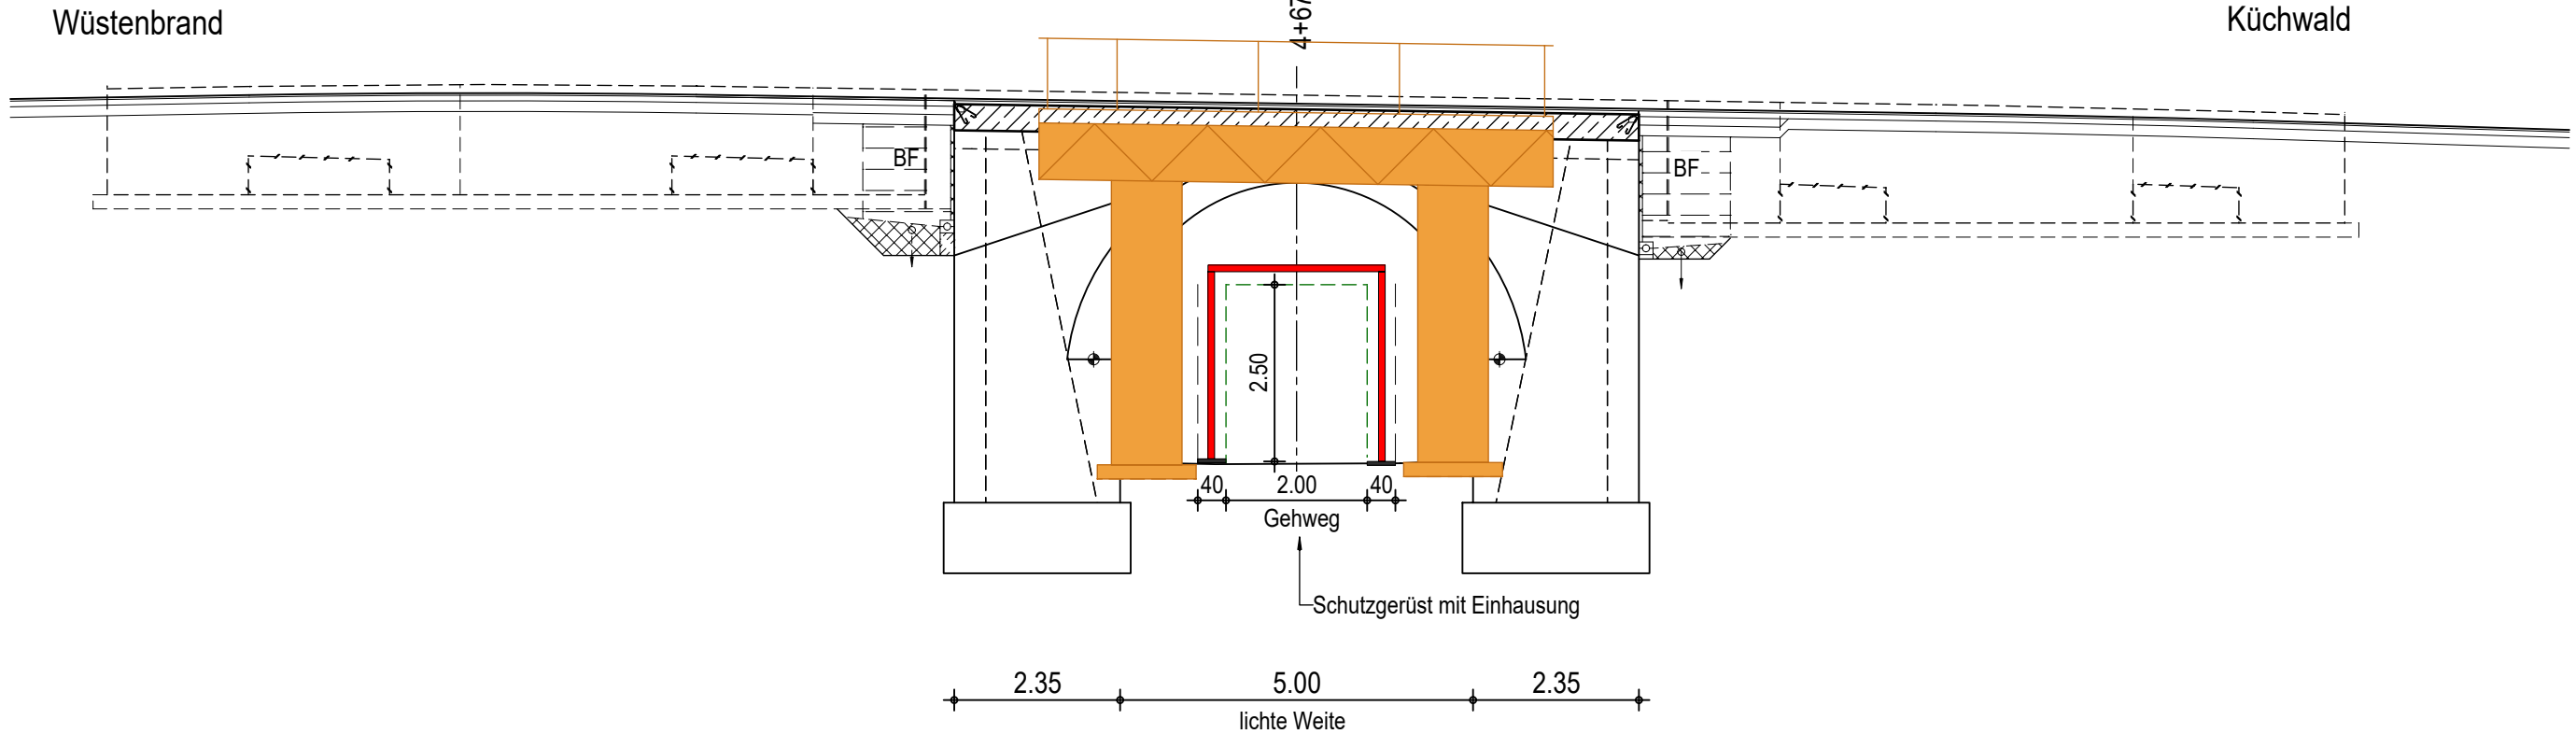

Verkehrsführung 2 M 1:100

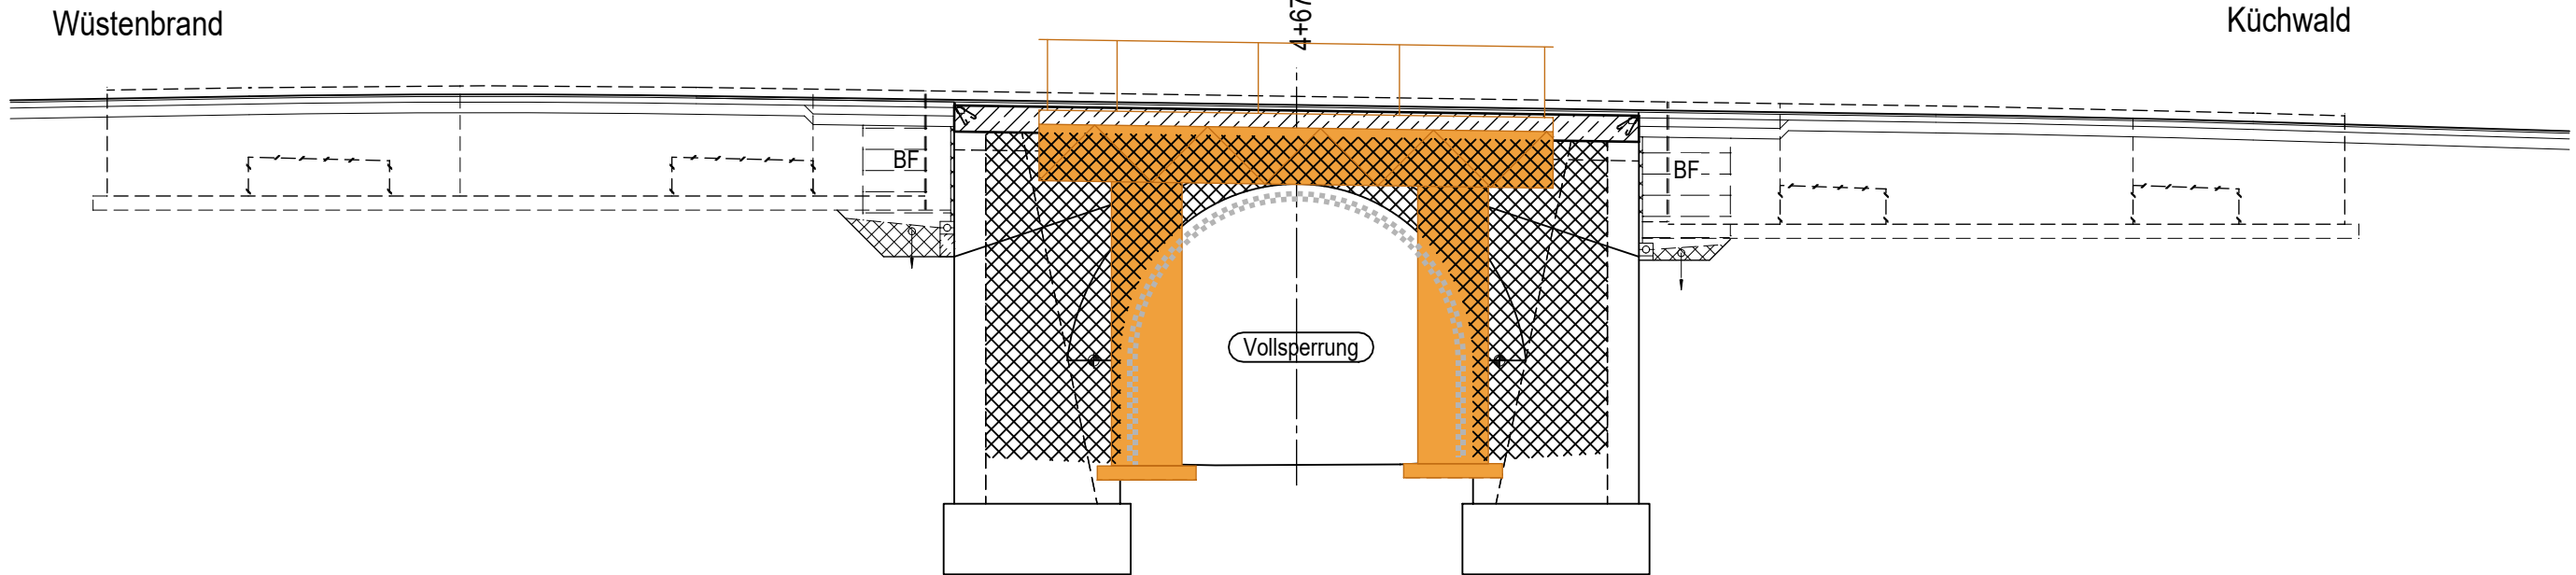

Legende:

- Arbeitsbereich Gewölbe: Instandsetzung Untersicht
- Arbeitsbereich Gewölbe: Instandsetzung Stirnflächen

Grobablauf:

Arbeiten am Bauwerk:

Vollsperrung Fahrzeugverkehr während gesamter Baumaßnahme
Fußgängerführung mittig (mit Einhausung)
Dauer = gesamte Baumaßnahme

Arbeiten bei Verkehrsführung 1:

Rückbau vorhandene Geländer / Abdeckplatte
Arbeiten an der Hinterfüllung, Fahrbahnplatte, Kappen


Arbeiten bei Verkehrsführung 2:

Vollsperrung gesamter Verkehr inkl. Fußgänger
Dauer = ca. 4 Wochen

Gewölbe gesamt inkl. Flügelwände:
Natursteinflächen reinigen, Sanierung Fugen

Gerüstbauarbeiten (Aufbau und Abbau Gerüst):

Vollsperrung Fahrzeugverkehr
Fußgängerführung mit kurzzeitiger Sperrung beim Hubarbeiten

Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:	07/2025	
	Gez.:	07/2025	
	Gepr.:	07/2025	
Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			
Straßenbauverwaltung:		Unterlage: 8.2	
 CHEMNITZ KULTURHAUPTSTADT EUROPAS 2025		Verkehrs- und Tiefbauamt Friedensplatz 1, 09111 Chemnitz Tel.: 0371 488-6601 / Fax: 0371 488-6699 E-Mail: tiefbauamt@stadt-chemnitz.de	
Streckenbezeichnung : Radweg Wüstenbrand - Küchwald		Blatt - Nr.: 3	
Gemarkung : Gröna		Projekt - Nr.:	
Bauwerk/Baumaßnahme :		Datum	
Radweg BA 2.0		Bearb.:	
Bau-km 3+175 bis Bau-km 5+600		Gez.:	
BW 3 Brücke über den Schafftreiberweg		Gepr.:	
Bau km 4+672 / Bahn km 10.419		ASB-Nr.:	
Plandarstellung :		Bauwerksplan	
bauzeitliche Verkehrsführung		Maßstab:	
Aufgestellt :		Geprüft :	
Chemnitz, den		Dirk Schlimper Abteilungsleiter	
Gesehen :		Genehmigt :	
		Thomas Blankenhagel amt. Amtsleiter Verkehrs- und Tiefbauamt	
