Baumanagement der Maßnahme - Rahmenzeitplan - GUT-DRAUF-KOMPLEX KIEZ Querxenland Seifhennersdorf
Stand: 21.02.2025

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	**Genehmigungen**	**202 Tage?**	**Don 22.02.24**	**Fre 29.11.24**	
12					
13	**Tiefbau-/ Haustechnikplanung für Medienumverlegung**	**1970 Tage**	**Die 28.03.17**	**Mon 14.10.24**	
24					
25	**Hochbauplanung bis Vergabe Bauhauptleistung**	**345 Tage**	**Die 04.06.24**	**Mon 13.10.25**	
41	**Ausschreibung und Vergabe**	**365 Tage?**	**Fre 12.07.24**	**Don 18.12.25**	
88	**Rohbau / Dach / Fassade 1. und 2. BA**	**350 Tage**	**Mon 25.11.24**	**Fre 01.05.26**	
89					
90	**Rohbau / Dach MZH**	**170 Tage**	**Mon 25.11.24**	**Fre 01.08.25**	
91	Baustelleneinrichtung	10 Tage	Mon 25.11.24	Fre 06.12.24	
92	Fundamente Mehrzweckhalle	9 Tage	Mon 09.12.24	Don 19.12.24	
93	Einbau Bodenpolster Mensa	4 Tage	Mon 09.12.24	Don 12.12.24	91
94	Einbau Bodenpolster Mehrzweckhalle	5 Tage	Die 07.01.25	Mon 13.01.25	
95	Grundleitung Mensa	20 Tage	Mon 13.01.25	Fre 07.02.25	
96	Bodenplatte Mehrzweckhalle	6 Tage	Die 14.01.25	Die 21.01.25	
97	Herstellung Wände STB Mehrzweckhalle	93 Tage	Mit 22.01.25	Fre 30.05.25	
98	**Dacharbeiten MZH**	**30 Tage**	**Mon 23.06.25**	**Fre 01.08.25**	
99	**Bindermontage**	**5 Tage**	**Mon 23.06.25**	**Fre 27.06.25**	**137**
100	Dach: Trapezblech, Dämmung und Abdichtung	20 Tage	Mon 30.06.25	Fre 25.07.25	99
101	RWA Herstellung	5 Tage	Mon 28.07.25	Fre 01.08.25	100
102	**Rohbau / Dach / Gesellschaftsbau**	**314 Tage**	**Die 28.01.25**	**Fre 01.05.26**	
103	Bodenplatte Mensa	24 Tage	Die 28.01.25	Fre 28.02.25	
104	Mauerwerksarbeiten Mensa EG	30 Tage	Mon 03.03.25	Fre 11.04.25	103
105	Decke über EG & Laubengangmontage	20 Tage	Mon 14.04.25	Fre 09.05.25	104
106	Mauerwerksarbeiten Mensa OG	30 Tage	Mon 12.05.25	Fre 20.06.25	105
107	Decke über OG und Laubengangmontage	20 Tage	Mon 23.06.25	Fre 18.07.25	106
108	Rohbauarbeiten Dach & Attika Treppenhauskopf	10 Tage	Mon 21.07.25	Fre 01.08.25	107
109	**Dacharbeiten Gesellschaftsbau**	**190 Tage**	**Mon 21.07.25**	**Fre 01.05.26**	
110	Dachabdichtungsarbeiten Regensicherheit Anschlüsse WDVS	20 Tage	Mon 21.07.25	Fre 15.08.25	108EA-10 Tage
111	Dachabdichtungsarbeiten Dämmung	10 Tage	Mon 18.08.25	Fre 29.08.25	110
112	Fertigstellung Dacharbeiten Dichtigkeitsprüftung	5 Tage	Mon 01.09.25	Fre 05.09.25	111
113	Haustechnikagregate Montage	10 Tage	Mon 15.09.25	Fre 26.09.25	110EA+20 Tage
114	Dachzentrale Montage	15 Tage	Mon 22.09.25	Fre 10.10.25	113EA-5 Tage
115	Montage Dachaufbauten Laufanlage	10 Tage	Mon 20.10.25	Fre 31.10.25	114
116	Montage PV Anlage	20 Tage	Mon 06.04.26	Fre 01.05.26	115
117					
118	**Achse K Westseite Fassade**	**143 Tage**	**Mon 17.03.25**	**Mit 01.10.25**	
119	Abdichtungarbeiten + Dämmung Achse K	10 Tage	Mon 17.03.25	Fre 28.03.25	
120	Verfüllung Achse K	10 Tage	Mon 31.03.25	Fre 11.04.25	119
121	**Medienverlegung TW; RW, FW**	**15 Tage**	**Mon 07.04.25**	**Fre 25.04.25**	**120EA-5 Tage**
122	Aufstellung Gerüst Achse K	4 Tage	Mon 28.04.25	Don 01.05.25	121
123	Fenster & Türenmontage Achse K	10 Tage	Mon 28.07.25	Fre 08.08.25	100;122
124	WDVS Arbeiten Achse K	35 Tage	Mon 11.08.25	Fre 26.09.25	123
125	Teilrückbau Gerüst Achse K MZH	3 Tage	Mon 29.09.25	Mit 01.10.25	124
126	**Achse 11 Nordseite Fassade**	**131 Tage**	**Mon 07.04.25**	**Mon 06.10.25**	
127	Abdichtungarbeiten + Dämmung Achse 11	15 Tage	Mon 07.04.25	Fre 25.04.25	119EA+5 Tage
128	Verfüllung & Entwässerungsleitungen Achse 11	15 Tage	Mon 28.04.25	Fre 16.05.25	127
129	Aufstellung Gerüst Achse 11	5 Tage	Mon 19.05.25	Fre 23.05.25	128
130	Fenster & Türenmontage	10 Tage	Mon 28.07.25	Fre 08.08.25	100
131	WDVS Arbeiten	35 Tage	Mon 11.08.25	Fre 26.09.25	130
132	Rückbau Gerüst Achse A MZH	1 Tag	Mon 06.10.25	Mon 06.10.25	101;131EA+5 Tage
133	**Achse A Ostseite Fassade**	**139 Tage**	**Mon 05.05.25**	**Don 13.11.25**	
134	Abdichtungarbeiten + Dämmung Achse A	10 Tage	Mon 05.05.25	Fre 16.05.25	127EA+5 Tage
135	Herstelllung Stützwand Rampe inkl. Verfüllung	10 Tage	Mon 19.05.25	Fre 30.05.25	134
136	Verfüllung & Entwässerungsleitungen Achse A	10 Tage	Mon 02.06.25	Fre 13.06.25	135
137	Aufstellung Gerüst Achse A	5 Tage	Mon 16.06.25	Fre 20.06.25	136
138	Fenster & Türenmontage	16 Tage	Mon 04.08.25	Mon 25.08.25	110AA+10 Tage
139	WDVS Arbeiten	35 Tage	Die 26.08.25	Mon 13.10.25	138
140	Rückbau Gerüst Achse A MZH	3 Tage	Die 14.10.25	Don 16.10.25	139
141	Pflasterarbeiten & Sockelherstellung Rampe	20 Tage	Fre 17.10.25	Don 13.11.25	140
142	**Achse 1 Südseite Fassade**	**124 Tage**	**Mon 19.05.25**	**Don 06.11.25**	
143	Abdichtungarbeiten + Dämmung Achse 1	10 Tage	Mon 19.05.25	Fre 30.05.25	134
144	Verfüllung & Entwässerungsleitungen Achse 1	10 Tage	Mon 02.06.25	Fre 13.06.25	143
145	Aufstellung Gerüst Achse 1	5 Tage	Mon 16.06.25	Fre 20.06.25	144
146	Fenster & Türenmontage	10 Tage	Mon 25.08.25	Fre 05.09.25	110EA+5 Tage;145
147	WDVS Arbeiten	35 Tage	Mon 08.09.25	Fre 24.10.25	146
148	Rückbau Gerüst Gesellsaftbau	4 Tage	Mon 03.11.25	Don 06.11.25	115;147
149	**Innenausbau**	**298 Tage**	**Mon 25.08.25**	**Mit 04.11.26**	
150	**Halle**	**275 Tage**	**Mon 25.08.25**	**Fre 02.10.26**	
151	Unterputzarbeiten Wandanschlussbereiche	5 Tage	Mon 25.08.25	Fre 29.08.25	101EA+5 Tage
152	Innengerüst aufstellen	5 Tage	Mon 01.09.25	Fre 05.09.25	151
153	Elt - Grundinst	15 Tage	Mon 08.09.25	Fre 26.09.25	152
154	Lüftungsinst. Hallendecke	15 Tage	Mon 29.09.25	Fre 17.10.25	153

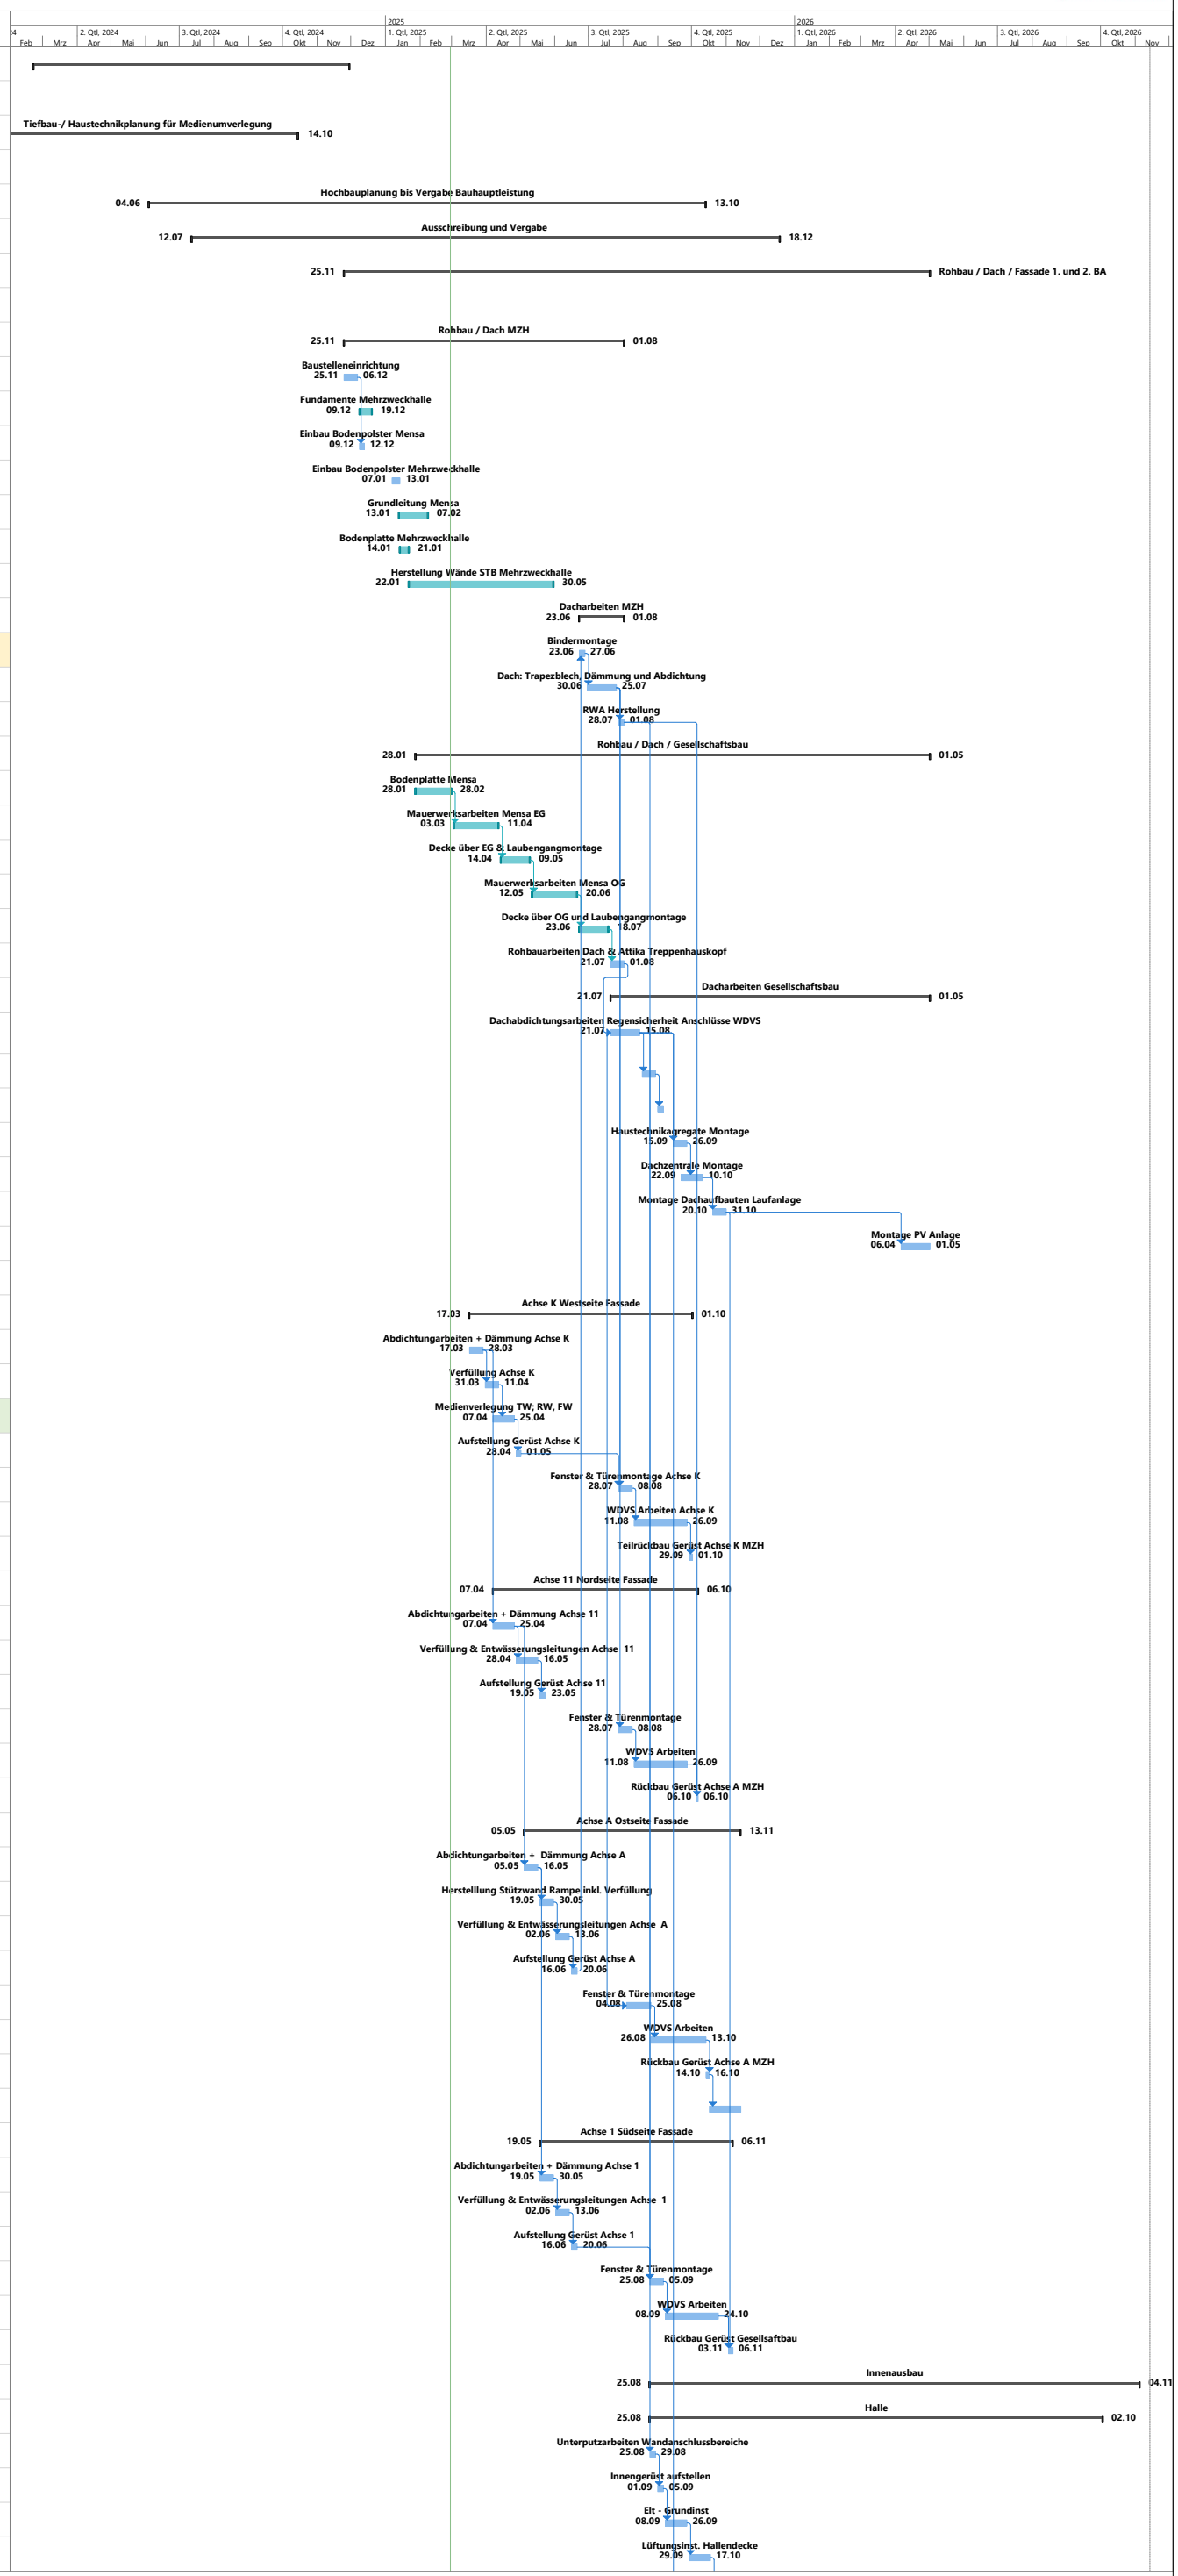

Projekt: GUT-DRAUF-KOMPLEX
Datum: 21.02.2025

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit

INDEX _ A

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
155	Elt - Grundinst Decke	10 Tage	Mon 20.10.25	Fre 31.10.25	154
156	Nachbearbeitung Sichtbetonwände	10 Tage	Mon 03.11.25	Fre 14.11.25	155
157	Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage	10 Tage	Mon 17.11.25	Fre 28.11.25	156
158	Akustikpanäle Wände Montage	10 Tage	Mon 01.12.25	Fre 12.12.25	157
159	Raumtrennvorhangmontage	5 Tage	Mon 15.12.25	Fre 19.12.25	158
160	Innengerüst Rückbau	5 Tage	Mon 12.01.26	Fre 16.01.26	159
161	Abdichtungar. Boden und Wände	10 Tage	Mon 19.01.26	Fre 30.01.26	160
162	Höhenausgleich und Schutzschicht Boden herstellen	20 Tage	Mon 02.02.26	Fre 27.02.26	161
163	Innentürmontage	10 Tage	Mon 02.03.26	Fre 13.03.26	162
164	Auslegen der Dämmung	5 Tage	Mon 16.03.26	Fre 20.03.26	163
165	FBH Verlegung Halle	30 Tage	Mon 23.03.26	Fre 01.05.26	164
166	Sportbodenaufbau herstellen	20 Tage	Mon 04.05.26	Fre 29.05.26	165
167	Prallschutzwände Montage	20 Tage	Mon 01.06.26	Fre 26.06.26	166
168	Bodenbelagsarbeiten	15 Tage	Mon 29.06.26	Fre 17.07.26	167
169	Markierungsarbeiten	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26	168
170	Elt - Boden und Wand Endmontage	20 Tage	Mon 27.07.26	Fre 21.08.26	169
171	Einbauten Montage	20 Tage	Mon 24.08.26	Fre 18.09.26	170
172	Raumausstattung - Lieferung & Einbau	10 Tage	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26	171
173	**UG Sanitärbereich & HT**	**245 Tage**	**Mon 15.09.25**	**Fre 11.09.26**	
174	Unterputzarbeiten	15 Tage	Mon 15.09.25	Fre 03.10.25	110EA-5 Tage
175	Abdichtungar. Boden und Wände	10 Tage	Mon 06.10.25	Fre 17.10.25	174
176	TBW & Vorwände 1 seitige Beplankung	20 Tage	Mon 20.10.25	Fre 14.11.25	175
177	HS - Grundinst.	25 Tage	Mon 03.11.25	Fre 05.12.25	176AA+10 Tage
178	Elt - Grundinst Boden + Wand	25 Tage	Mon 03.11.25	Fre 05.12.25	177AA
179	Lüftung - Grundinst.	25 Tage	Mon 03.11.25	Fre 05.12.25	178AA
180	Trockenbauwände Beplankung 2. Lage	20 Tage	Mon 08.12.25	Fre 23.01.26	179
181	Trockenbaudecken - Unterkonst	15 Tage	Mon 26.01.26	Fre 13.02.26	180
182	Auslegen der Dämmung	15 Tage	Mon 16.02.26	Fre 06.03.26	181
183	Fußbodenheizung Verlegung	15 Tage	Mon 02.03.26	Fre 20.03.26	182EA-5 Tage
184	Estricharbeiten	5 Tage	Mon 23.03.26	Fre 27.03.26	183
185	Estrichruhe und Estrichaufheizen	28 Tage	Mon 30.03.26	Mit 06.05.26	184
186	Oberputzarbeiten Wände	19 Tage	Don 23.04.26	Die 19.05.26	185EA-10 Tage
187	Trockenbaudecken - Beplankung	15 Tage	Mit 20.05.26	Die 09.06.26	186
188	Innentürmontage	10 Tage	Mit 27.05.26	Die 09.06.26	187EE
189	Aufzugmontage	10 Tage	Mit 20.05.26	Die 02.06.26	186
190	Fliesenverlegearbeiten	20 Tage	Mit 10.06.26	Die 07.07.26	187
191	Anstricharbeiten	20 Tage	Mit 01.07.26	Die 28.07.26	190EA-5 Tage
192	Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage	15 Tage	Mit 22.07.26	Die 11.08.26	191EA-5 Tage
193	Lüftung Sanitär Endmontage	15 Tage	Mit 22.07.26	Die 11.08.26	191EA-5 Tage
194	Elt - Boden und Wand Endmontage	15 Tage	Mit 22.07.26	Die 11.08.26	191EA-5 Tage
195	Bodenbelagsarbeiten	15 Tage	Mit 12.08.26	Die 01.09.26	194
196	Raumausstattung - Lieferung & Einbau	8 Tage	Mit 02.09.26	Fre 11.09.26	195
197	**UG Bowlingbereich**	**268 Tage**	**Mon 06.10.25**	**Mit 04.11.26**	
198	Unterputzarbeiten	10 Tage	Mon 06.10.25	Fre 17.10.25	174
199	Abdichtungar. Boden und Wände	5 Tage	Mon 03.11.25	Fre 07.11.25	198EA+10 Tage
200	TBW & Vorwände 1 seitige Beplankung	20 Tage	Mon 10.11.25	Fre 05.12.25	199
201	HS - Grundinst.	20 Tage	Mon 10.11.25	Fre 05.12.25	200AA
202	Elt - Grundinst Boden + Wand	20 Tage	Mon 08.12.25	Fre 23.01.26	200AA;201
203	Lüftung - Grundinst.	20 Tage	Mon 26.01.26	Fre 20.02.26	200AA;202
204	Trockenbauwände Beplankung 2. Lage	10 Tage	Mon 23.02.26	Fre 06.03.26	203
205	Trockenbaudecken - Unterkonst	10 Tage	Mon 09.03.26	Fre 20.03.26	204
206	Auslegen der Dämmung	5 Tage	Mon 23.03.26	Fre 27.03.26	205
207	FBH Verlegung	5 Tage	Mon 30.03.26	Fre 03.04.26	206
208	Estricharbeiten (Gussasphalt)	3 Tage	Mon 06.04.26	Mit 08.04.26	207
209	Oberputzarbeiten Wände	10 Tage	Don 16.04.26	Mit 29.04.26	208EA+5 Tage
210	Trockenbaudecken - Beplankung	10 Tage	Don 30.04.26	Mit 13.05.26	209
211	Innentürmontage	5 Tage	Don 14.05.26	Mit 20.05.26	210
212	Fliesenverlegearbeiten	10 Tage	Don 21.05.26	Mit 03.06.26	211
213	Anstricharbeiten	10 Tage	Don 04.06.26	Mit 17.06.26	212
214	Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage	10 Tage	Don 18.06.26	Mit 01.07.26	213
215	Lüftung Endmontage	10 Tage	Don 02.07.26	Mit 15.07.26	214
216	Elt - Boden und Wand Endmontage	10 Tage	Don 16.07.26	Mit 29.07.26	215
217	Bowlingbahn Montage	30 Tage	Don 30.07.26	Mit 09.09.26	216
218	Bodenbelagsarbeiten (Sockelleisten)	5 Tage	Don 10.09.26	Mit 16.09.26	217
219	Raumausstattung - Lieferung & Einbau	15 Tage	Don 17.09.26	Mit 07.10.26	218
220	Funktionsprüfung und Nacharbeiten	20 Tage	Don 08.10.26	Mit 04.11.26	218;219
221	<Neuer Vorgang>				
222	**OG Küchenbereich**	**235 Tage**	**Mon 20.10.25**	**Fre 02.10.26**	
223	Unterputzarbeiten	10 Tage	Mon 20.10.25	Fre 31.10.25	
224	Abdichtungar. Boden und Wände Küche	10 Tage	Mon 03.11.25	Fre 14.11.25	223
225	TBW & Vorwände 1 seitige Beplankung	25 Tage	Mon 17.11.25	Fre 19.12.25	224
226	Lüftung - Grundinst.	20 Tage	Mon 12.01.26	Fre 06.02.26	225
227	HS - Grundinst. + Bodeneinläufe	20 Tage	Mon 09.02.26	Fre 06.03.26	226
228	Elt - Grundinst Boden + Wand	20 Tage	Mon 09.02.26	Fre 06.03.26	227AA

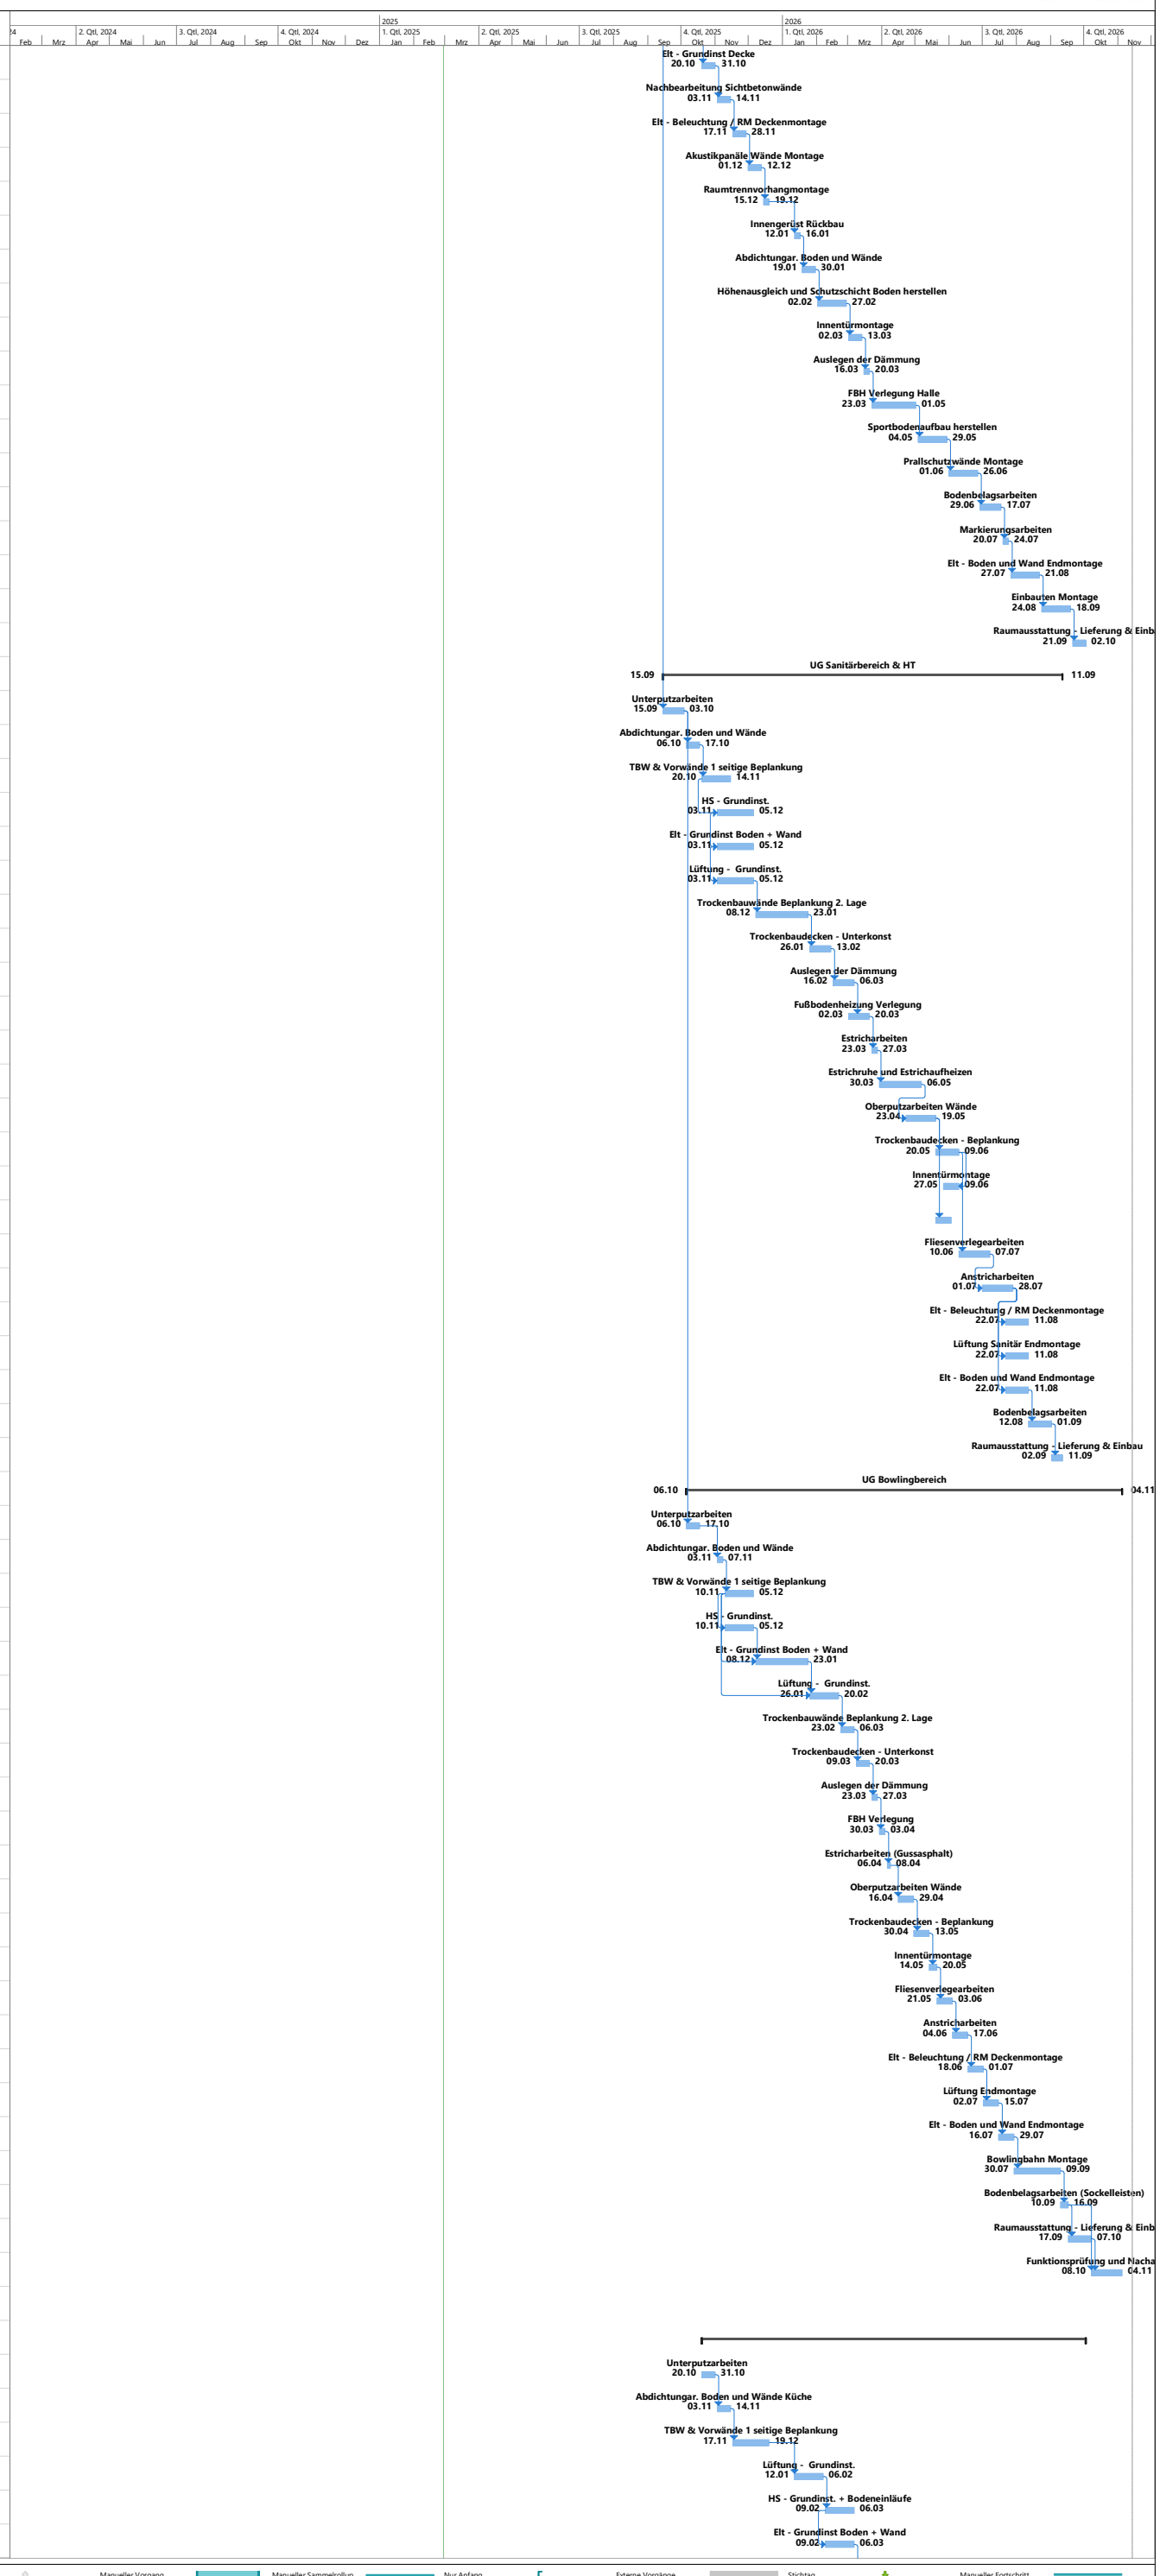

Projekt: GUT-DRAUF-KOMPLEX
Datum: 21.02.2025

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
229	Trockenbauwände Beplankung 2. Lage	10 Tage	Mon 09.03.26	Fre 20.03.26	228
230	Trockenbaudecken - Unterkonst	10 Tage	Mon 23.03.26	Fre 03.04.26	229
231	Auslegen der Dämmung	20 Tage	Mon 06.04.26	Fre 01.05.26	230
232	FBH Verlegung	10 Tage	Mon 04.05.26	Fre 15.05.26	231
233	Estricharbeiten	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26	232
234	Estrichruhe & Aufheizen	28 Tage	Mon 25.05.26	Mit 01.07.26	233
235	Oberputzarbeiten Wände	10 Tage	Don 18.06.26	Mit 01.07.26	234EA-10 Tage
236	Trockenbaudecke - Beplankung	5 Tage	Don 02.07.26	Mit 08.07.26	235
237	Innentürmontage	2 Tage	Don 09.07.26	Fre 10.07.26	236
238	Fliesenverlegearbeiten	15 Tage	Mon 13.07.26	Fre 31.07.26	237
239	Anstricharbeiten	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26	238
240	PU - Beschichtung Boden	5 Tage	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26	239
241	Küchenmontage	20 Tage	Mon 17.08.26	Fre 11.09.26	240
242	Kühlzellenmontage	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26	241
243	Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26	242
244	Lüftung & Sanitär - Endmontage	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26	242
245	Elt - Boden und Wand Endmontage	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26	244AA
246	Raumausstattung - Lieferung & Einbau	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26	245
247	**OG Mensabereich & Essenausgabe**	**260 Tage**	**Mon 22.09.25**	**Fre 09.10.26**	
248	Unterputzarbeiten	15 Tage	Mon 22.09.25	Fre 10.10.25	
249	Abdichtungar. Boden und Wände	5 Tage	Mon 13.10.25	Fre 17.10.25	248
250	Trockenbauwände & Vorwände 1 seitige Beplankung	25 Tage	Mon 20.10.25	Fre 21.11.25	249
251	HS - Grundinst.	20 Tage	Mon 03.11.25	Fre 28.11.25	250AA+10 Tage
252	Elt - Grundinst Boden + Wand	20 Tage	Mon 03.11.25	Fre 28.11.25	251AA
253	Lüftung - Grundinst.	20 Tage	Mon 03.11.25	Fre 28.11.25	252AA
254	Trockenbauwände 2. Lage	10 Tage	Mon 01.12.25	Fre 12.12.25	253
255	Trockenbaudecken - Unterkonst.	15 Tage	Mon 15.12.25	Fre 23.01.26	254
256	Auslegen der Dämmung	10 Tage	Mon 26.01.26	Fre 06.02.26	255
257	Fußbodenheizung Verlegung	15 Tage	Mon 09.02.26	Fre 27.02.26	256
258	Estricharbeiten Zement	5 Tage	Mon 02.03.26	Fre 06.03.26	257
259	Estricharbeiten Gussasphalt	5 Tage	Mon 23.03.26	Fre 27.03.26	258EA+10 Tage
260	Estrichruhe & Aufheizen	28 Tage	Mon 30.03.26	Mit 06.05.26	259
261	Oberputzarbeiten Wände	15 Tage	Don 07.05.26	Mit 27.05.26	258EA+5 Tage;259;260
262	Trockenbaudecken - Beplankung	20 Tage	Don 28.05.26	Mit 24.06.26	261
263	Innentürmontage & Trennwände	10 Tage	Don 25.06.26	Mit 08.07.26	262
264	Fliesenverlegearbeiten	15 Tage	Don 09.07.26	Mit 29.07.26	263
265	Anstricharbeiten	15 Tage	Don 30.07.26	Mit 19.08.26	264
266	PU - Beschichtung Küche und Essensausgabe	5 Tage	Don 20.08.26	Mit 26.08.26	265
267	Essensausgabe Montage	15 Tage	Don 27.08.26	Mit 16.09.26	266
268	Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage	15 Tage	Don 27.08.26	Mit 16.09.26	267AA
269	Lüftung & Sanitär - Endmontage	15 Tage	Don 27.08.26	Mit 16.09.26	268AA
270	Elt - Boden und Wand Endmontage	15 Tage	Don 27.08.26	Mit 16.09.26	269AA
271	Bodenbelagsarbeiten Einpflege	5 Tage	Don 17.09.26	Mit 23.09.26	270
272	Raumausstattung - Lieferung & Einbau	12 Tage	Don 24.09.26	Fre 09.10.26	271
273	**Tiefbau & Außenanlagen**	**536 Tage**	**Mon 09.09.24**	**Mon 02.11.26**	
274	Medienumverlegung	25 Tage	Mon 09.09.24	Fre 11.10.24	
275	BA 1 Parkplatz Süd & Viebigstr.	30 Tage	Die 01.04.25	Mon 12.05.25	
276	BA 2 Unfahrung West; SW,RW;TW	65 Tage	Mon 02.06.25	Fre 29.08.25	
277	BA 3 Gewege oberhalb der Rezeption	22 Tage	Mon 01.09.25	Die 30.09.25	
278	BA 4 Gewege unter der Rezeption + Zufahrten	44 Tage	Die 01.10.24	Fre 29.11.24	
279	BA 5 Parkplatz Süd (Bereich Baustelleneinrichtung)	65 Tage	Mon 02.03.26	Fre 29.05.26	
280	Regenrückhaltung Süd / RW SÜD	65 Tage	Mon 02.03.26	Fre 29.05.26	
281	Straßenbau von Viebigstr. - Anlieferungsbereich	65 Tage	Mon 02.03.26	Fre 29.05.26	
282	Straßenbau vor Kläranlage & Parkflächen	22 Tage	Mon 01.06.26	Die 30.06.26	
283	Ostseite; RW-Kanal, Winkelstützwand, Gewege	87 Tage	Mon 02.03.26	Die 30.06.26	
284	Medienanschluss Achse K (Fettabscheider, Gas, Elt)	20 Tage	Mon 06.04.26	Fre 01.05.26	
285	Nordseite, Parkplatz Zufahrt	64 Tage	Mit 01.07.26	Sam 26.09.26	
286	Zäune & Tore nach Baufortschritt	246 Tage	Mit 01.10.25	Mit 30.09.26	
287	Pflanzungen nach Baufortschritt	291 Tage	Mon 01.09.25	Mon 02.11.26	
288					
289	**Fertigstellung**	**54 Tage**	**Die 01.09.26**	**Fre 13.11.26**	
290	Justage der HSL Anlagen	10 Tage	Die 01.09.26	Mon 14.09.26	
291	Justage der ELT Anlagen	10 Tage	Die 15.09.26	Mon 28.09.26	290
292	Grundreinigung	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26	291
293	Nacharbeiten der Gewerke	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26	292
294	Sachverständigenabnahmen	3 Tage	Mon 26.10.26	Mit 28.10.26	293
295	Endabnahmen der Prüfing.	2 Tage	Don 29.10.26	Fre 30.10.26	294
296	Bauaufsichtliche Abnahme	1 Tag	Mon 02.11.26	Mon 02.11.26	295
297	Endabnahmen der Gewerke	2 Tage	Die 03.11.26	Mit 04.11.26	296
298	Endreinigung	5 Tage	Don 05.11.26	Mit 11.11.26	297
299	Übergabe an den Bauherrn	1 Tag	Don 12.11.26	Don 12.11.26	298
300	Nutzungsaufnahme	1 Tag	Fre 13.11.26	Fre 13.11.26	299
301					

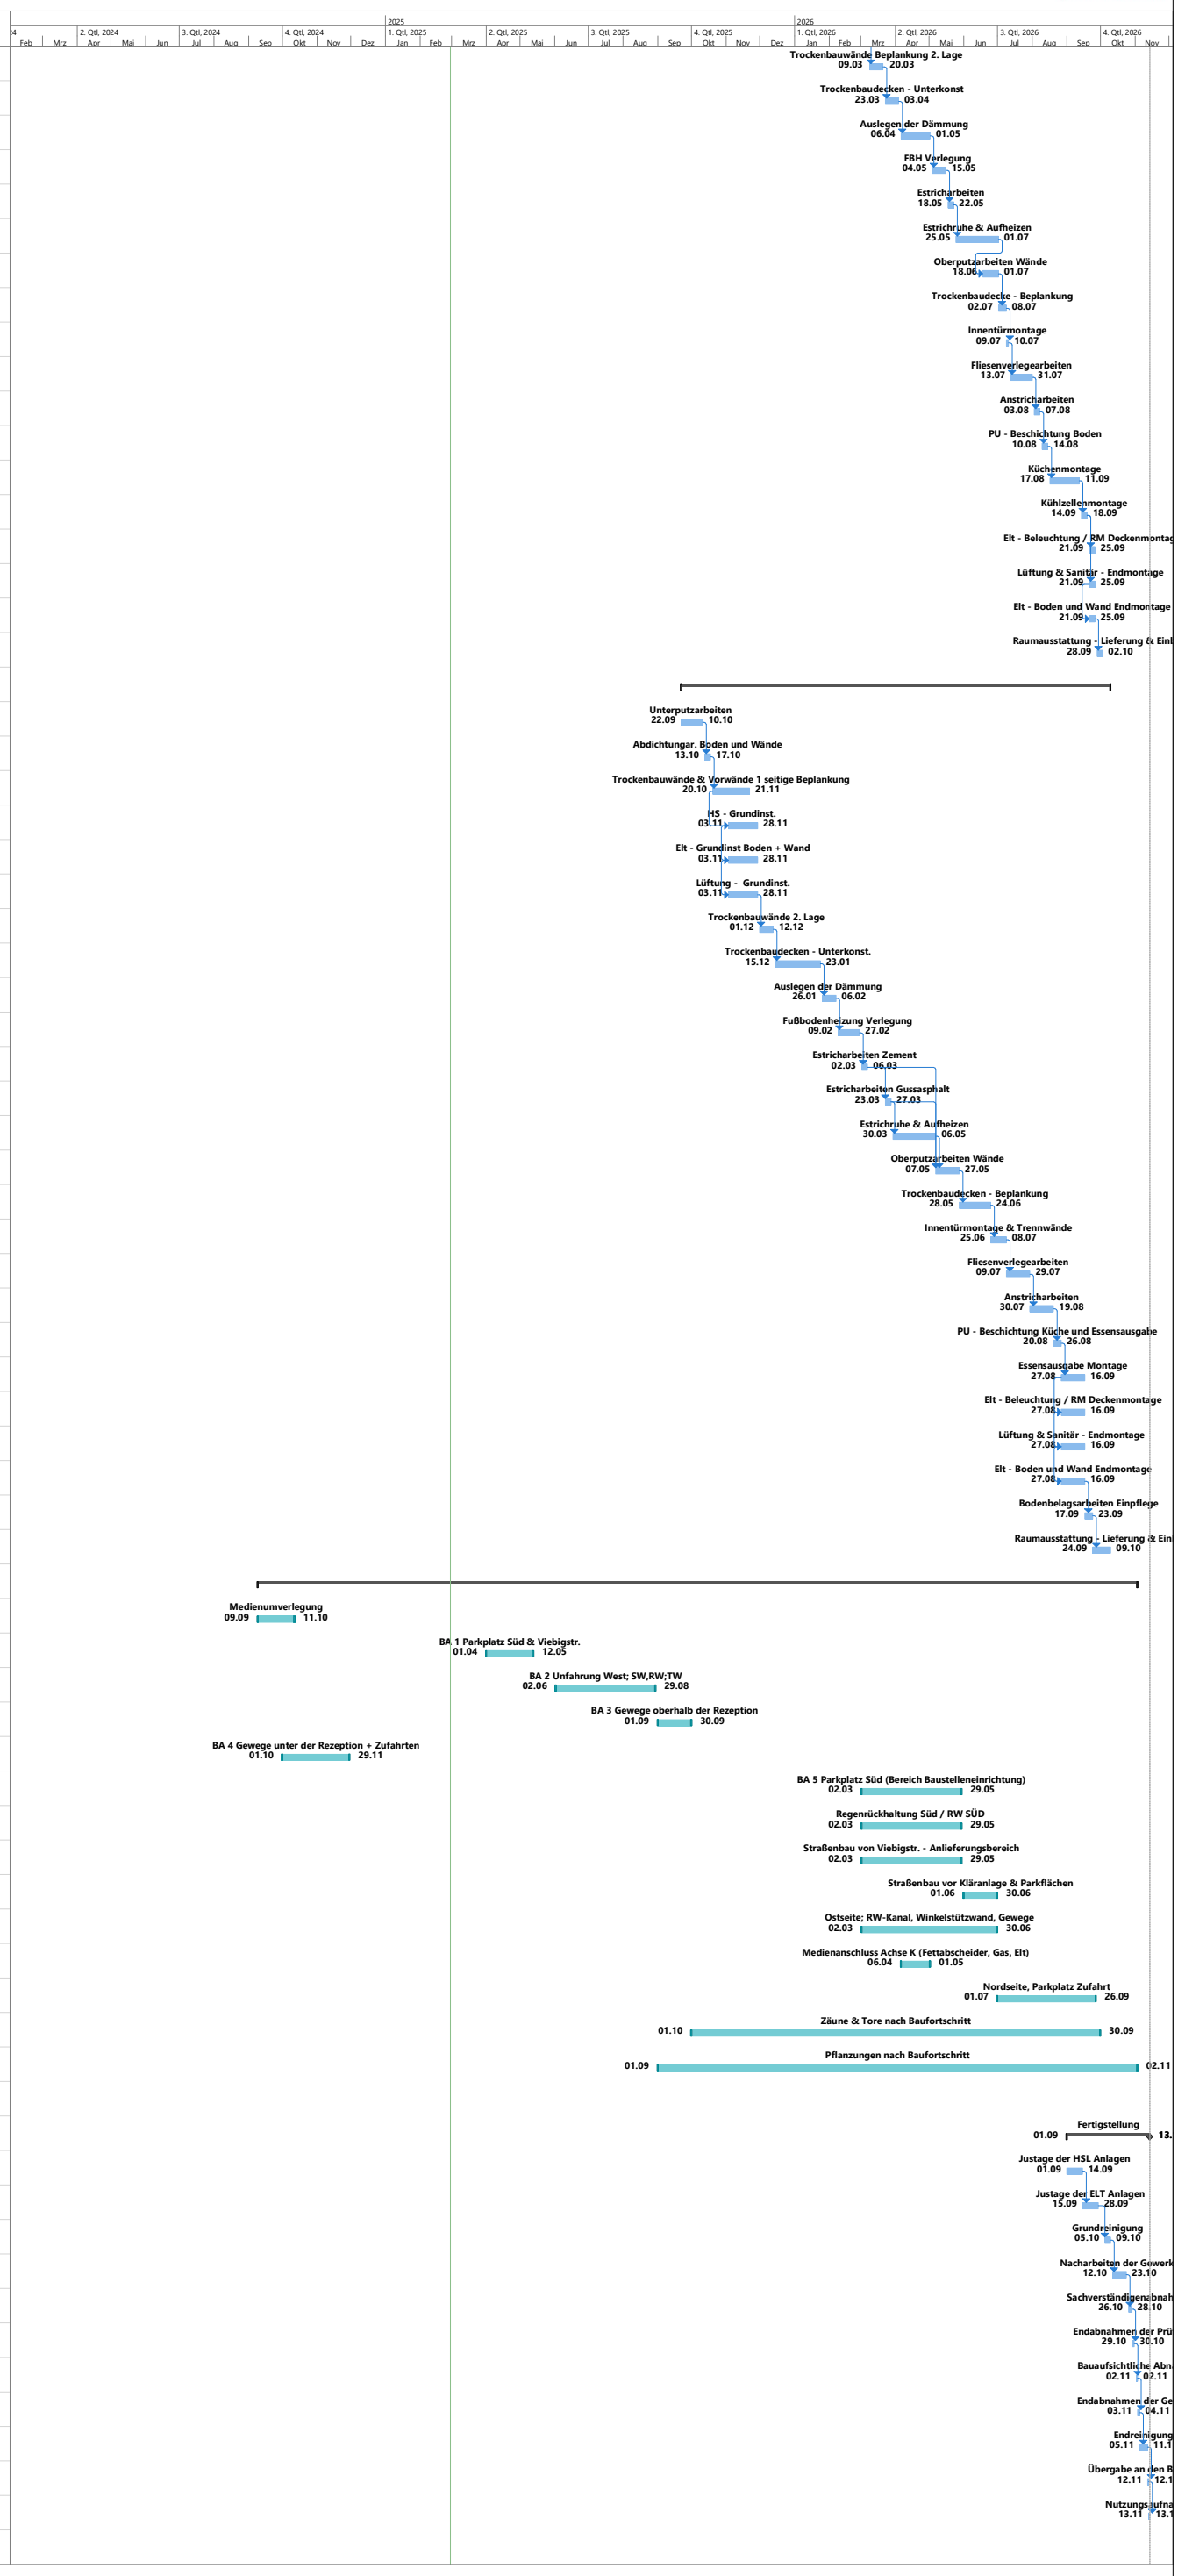

Projekt: GUT-DRAUF-KOMPLEX
Datum: 21.02.2025

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt
