Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	**Genehmigungen**	**202 Tage?**	**Don 22.02.24**	**Fre 29.11.24**	
12					
13	**Tiefbau-/ Haustechnikplanung für Medienumverlegung**	**1970 Tage**	**Die 28.03.17**	**Mon 14.10.24**	
24					
25	**Hochbauplanung bis Vergabe Bauhauptleistung**	**345 Tage**	**Die 04.06.24**	**Mon 13.10.25**	
41	**Ausschreibung und Vergabe**	**365 Tage?**	**Fre 12.07.24**	**Don 18.12.25**	
88	**Rohbau / Dach / Fassade 1. und 2. BA**	**369 Tage**	**Mon 25.11.24**	**Don 28.05.26**	
89					
90	**Rohbau / Dach MZH**	**210 Tage**	**Mon 25.11.24**	**Fre 26.09.25**	
91	Baustelleneinrichtung	10 Tage	Mon 25.11.24	Fre 06.12.24	
92	Fundamente Mehrzweckhalle	9 Tage	Mon 09.12.24	Don 19.12.24	
93	Einbau Bodenpolster Mensa	4 Tage	Mon 09.12.24	Don 12.12.24	91
94	Einbau Bodenpolster Mehrzweckhalle	5 Tage	Die 07.01.25	Mon 13.01.25	
95	Grundleitung Mensa	20 Tage	Mon 13.01.25	Fre 07.02.25	
96	Bodenplatte Mehrzweckhalle	6 Tage	Die 14.01.25	Die 21.01.25	
97	Herstellung Wände STB Mehrzweckhalle	93 Tage	Mit 22.01.25	Fre 30.05.25	
98	**Dacharbeiten MZH**	**40 Tage**	**Mon 04.08.25**	**Fre 26.09.25**	
99	**Bindermontage**	**5 Tage**	**Mon 04.08.25**	**Fre 08.08.25**	**144**
100	Dach: Trapezblech, Dämmung und Abdichtung	20 Tage	Mon 11.08.25	Fre 05.09.25	99
101	RWA Herstellung	10 Tage	Mon 08.09.25	Fre 19.09.25	100
102	Fertigstellung Dach inkl. Dichtigkeitsprüfung	5 Tage	Mon 22.09.25	Fre 26.09.25	101
103	**Rohbau / Dach / Gesellschaftsbau**	**333 Tage**	**Die 28.01.25**	**Don 28.05.26**	
104	Bodenplatte Mensa	24 Tage	Die 28.01.25	Fre 28.02.25	
105	Mauerwerksarbeiten Mensa EG	30 Tage	Mon 03.03.25	Fre 11.04.25	104
106	Decke über EG & Laubengangmontage	20 Tage	Mon 14.04.25	Fre 09.05.25	105
107	Mauerwerksarbeiten Mensa OG	10 Tage	Mon 12.05.25	Fre 23.05.25	106
108	Decke über OG	20 Tage	Mon 12.05.25	Fre 06.06.25	107EA-10 Tage
109	Rohbauarbeiten Dach & Attika Treppenhauskopf	10 Tage	Mon 09.06.25	Fre 20.06.25	108
110	Küchensockel Herstellung				
111					
112	**Dacharbeiten Gesellschaftsbau**	**215 Tage**	**Mon 16.06.25**	**Fre 01.05.26**	**109**
113	Dachabdichtungsarbeiten Regensicherheit	10 Tage	Mon 16.06.25	Fre 27.06.25	
114	Dachabdichtungsarbeiten Dämmung, abschnittsweise	60 Tage	Mon 30.06.25	Fre 19.09.25	113
115	Lieferung Dachhauben	3 Tage	Mon 28.07.25	Mit 30.07.25	
116	Estrich & Fundamente Lüftungszentrale Ink. Begehbarkeit	28 Tage	Mon 21.07.25	Mit 27.08.25	
117	Dachzentrale Montage	10 Tage	Don 28.08.25	Mit 10.09.25	116
118	Haustechnikagregate Montage	10 Tage	Don 02.10.25	Mit 15.10.25	117EA+15 Tage
119	Montage Dachaufbauten Laufanlage	10 Tage	Don 16.10.25	Mit 29.10.25	118
120	Fertigstellung Dacharbeiten Dichtigkeitsprüftung	5 Tage	Don 30.10.25	Mit 05.11.25	119
121	Montage PV Anlage	20 Tage	Mon 06.04.26	Fre 01.05.26	
122	**Travo**	**25 Tage**	**Mon 28.07.25**	**Fre 29.08.25**	
123	Fundamentherstellung	3 Tage	Mon 28.07.25	Mit 30.07.25	
124	Travolieferung	5 Tage	Mon 25.08.25	Fre 29.08.25	
125	**Achse K Westseite Fassade**	**173 Tage**	**Mon 17.03.25**	**Mit 12.11.25**	
126	Abdichtungarbeiten + Dämmung Achse K	10 Tage	Mon 17.03.25	Fre 28.03.25	
127	Verfüllung Achse K	10 Tage	Mon 26.05.25	Fre 06.06.25	126
128	**Medienverlegung TW; RW, FW**	**15 Tage**	**Mon 02.06.25**	**Fre 20.06.25**	**127EA-5 Tage**
129	Aufstellung Gerüst Achse K	4 Tage	Mon 23.06.25	Don 26.06.25	128
130	Fenster & Türenmontage Achse K	10 Tage	Mon 08.09.25	Fre 19.09.25	100;129
131	WDVS Arbeiten Achse K	35 Tage	Mon 22.09.25	Fre 07.11.25	130
132	Teilrückbau Gerüst Achse K MZH	3 Tage	Mon 10.11.25	Mit 12.11.25	131
133	**Achse 11 Nordseite Fassade**	**161 Tage**	**Mon 07.04.25**	**Mon 17.11.25**	
134	Abdichtungarbeiten + Dämmung Achse 11	15 Tage	Mon 07.04.25	Fre 25.04.25	126EA+5 Tage
135	Verfüllung & Entwässerungsleitungen Achse 11	15 Tage	Mon 19.05.25	Fre 06.06.25	134
136	Aufstellung Gerüst Achse 11	5 Tage	Mon 09.06.25	Fre 13.06.25	135
137	Fenster & Türenmontage	10 Tage	Mon 08.09.25	Fre 19.09.25	100
138	WDVS Arbeiten	35 Tage	Mon 22.09.25	Fre 07.11.25	137
139	Rückbau Gerüst Achse A MZH	1 Tag	Mon 17.11.25	Mon 17.11.25	101;138EA+5 Tage
140	**Achse A Ostseite Fassade**	**264 Tage**	**Mon 05.05.25**	**Don 28.05.26**	
141	Abdichtungarbeiten + Dämmung Achse A	10 Tage	Mon 05.05.25	Fre 16.05.25	134EA+5 Tage
142	Herstelllung Stützwand Rampe inkl. Verfüllung	15 Tage	Mon 19.05.25	Fre 06.06.25	141
143	Verfüllung Achse A	10 Tage	Mon 09.06.25	Fre 20.06.25	142
144	Aufstellung Gerüst Achse A	5 Tage	Mon 23.06.25	Fre 27.06.25	143
145	Fenster & Türenmontage	10 Tage	Mon 08.09.25	Fre 19.09.25	
146	WDVS Arbeiten	35 Tage	Mon 22.09.25	Fre 07.11.25	145
147	Rückbau Gerüst Achse A MZH	3 Tage	Mon 10.11.25	Mit 12.11.25	146
148	Sockelherstellung Rampe	10 Tage	Fre 17.10.25	Don 30.10.25	147
149	Pflasterarbeiten Rampe & Entwässeringsleitungen	20 Tage	Fre 01.05.26	Don 28.05.26	
150	**Achse 1 Südseite Fassade**	**129 Tage**	**Mon 19.05.25**	**Don 13.11.25**	
151	Abdichtungarbeiten + Dämmung Achse 1	10 Tage	Mon 19.05.25	Fre 30.05.25	141
152	Verfüllung Achse 1	10 Tage	Mon 02.06.25	Fre 13.06.25	151
153	Aufstellung Gerüst Achse 1	5 Tage	Mon 16.06.25	Fre 20.06.25	152
154	Fenster & Türenmontage	10 Tage	Mon 08.09.25	Fre 19.09.25	
155	WDVS Arbeiten	35 Tage	Mon 22.09.25	Fre 07.11.25	154
156	Rückbau Gerüst Gesellsaftbau	4 Tage	Mon 10.11.25	Don 13.11.25	119;155
157	**Innenausbau**	**288 Tage**	**Mon 15.09.25**	**Mit 11.11.26**	
158	**Halle**	**275 Tage**	**Mon 29.09.25**	**Fre 06.11.26**	
159	Unterputzarbeiten Wandanschlussbereiche	5 Tage	Mon 29.09.25	Fre 03.10.25	101EA+5 Tage

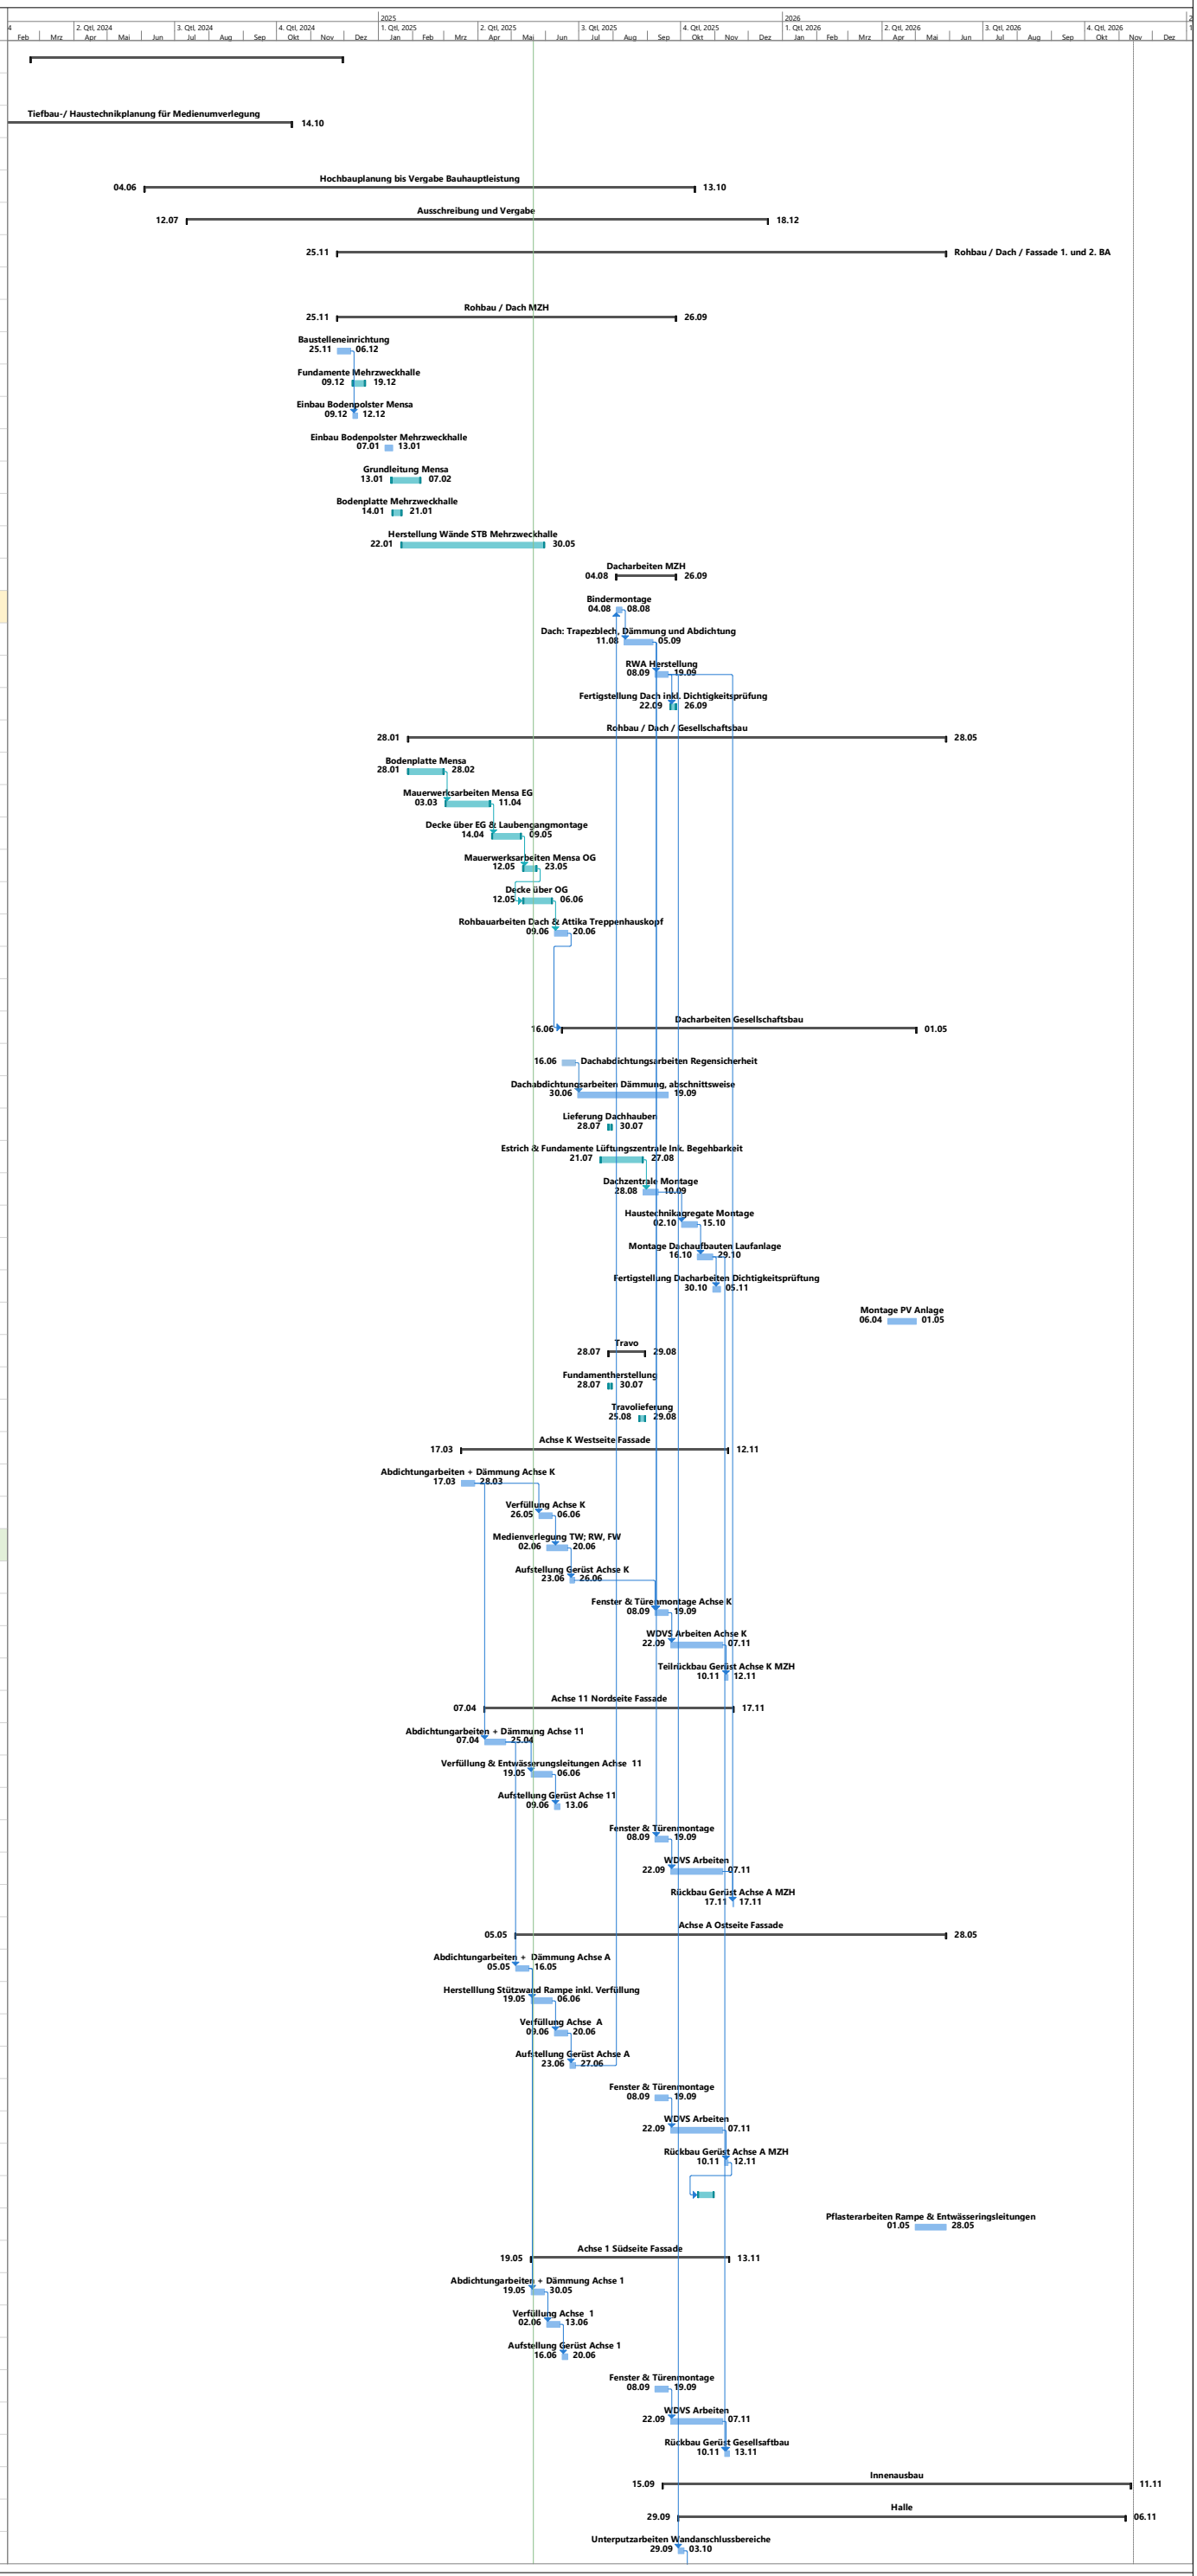

Projekt: GUT-DRAUF-KOMPLEX
Datum: 22.05.2025

Vorgang · Meilenstein · Projektsammelvorgang · Inaktiver Meilenstein · Manueller Vorgang · Manueller Sammelrollup · Nur Anfang · Externe Vorgänge · Stichtag · Manueller Fortschritt
Unterbrechung · Sammelvorgang · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Sammelvorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelvorgang · Nur Ende · Externer Meilenstein · In Arbeit

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
160	Innengerüst aufstellen	5 Tage	Mon 06.10.25	Fre 10.10.25	159
161	Elt - Grundinst	15 Tage	Mon 13.10.25	Fre 31.10.25	160
162	Lüftungsinst. Hallendecke	15 Tage	Mon 03.11.25	Fre 21.11.25	161
163	Elt - Grundinst Decke	10 Tage	Mon 24.11.25	Fre 05.12.25	162
164	Nachbearbeitung Sichtbetonwände	10 Tage	Mon 08.12.25	Fre 19.12.25	163
165	Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage	10 Tage	Mon 12.01.26	Fre 23.01.26	164
166	Akustikpanäle Wände Montage	10 Tage	Mon 26.01.26	Fre 06.02.26	165
167	Innengerüst Rückbau	5 Tage	Mon 09.02.26	Fre 13.02.26	166
168	Abdichtungar. Boden und Wände	10 Tage	Mon 16.02.26	Fre 27.02.26	167
169	Höhenausgleich und Schutzschicht Boden herstellen	20 Tage	Mon 02.03.26	Fre 27.03.26	168
170	Innentürmontage	10 Tage	Mon 30.03.26	Fre 10.04.26	169
171	Auslegen der Dämmung	5 Tage	Mon 13.04.26	Fre 17.04.26	170
172	FBH Verlegung Halle	30 Tage	Mon 20.04.26	Fre 29.05.26	171
173	Sportbodenaufbau herstellen	20 Tage	Mon 01.06.26	Fre 26.06.26	172
174	Prallschutzwände Montage	20 Tage	Mon 29.06.26	Fre 24.07.26	173
175	Bodenbelagsarbeiten	15 Tage	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26	174
176	Markierungsarbeiten	5 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26	175
177	Elt - Boden und Wand Endmontage	20 Tage	Mon 24.08.26	Fre 18.09.26	176
178	Raumtrennvorhangmontage	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26	177
179	Einbauten Montage	20 Tage	Mon 28.09.26	Fre 23.10.26	178
180	Raumausstattung - Lieferung & Einbau	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26	179
181	**UG Sanitärbereich & HT**	**250 Tage**	**Mon 15.09.25**	**Fre 18.09.26**	
182	Putzstreifen für Anschluss der Trockenbauwände	5 Tage	Mon 15.09.25	Fre 19.09.25	
183	Abdichtungar. Boden und Wände	10 Tage	Mon 22.09.25	Fre 03.10.25	182
184	TBW & Vorwände 1 seitige Beplankung	20 Tage	Mon 06.10.25	Fre 31.10.25	183
185	HS - Grundinst.	25 Tage	Mon 20.10.25	Fre 21.11.25	184AA+10 Tage
186	Elt - Grundinst Boden + Wand	25 Tage	Mon 20.10.25	Fre 21.11.25	185AA
187	Lüftung - Grundinst.	25 Tage	Mon 20.10.25	Fre 21.11.25	186AA
188	Trockenbauwände Beplankung 2. Lage	20 Tage	Mon 24.11.25	Fre 19.12.25	187
189	Unterputzarbeiten	15 Tage	Mon 12.01.26	Fre 30.01.26	188
190	Trockenbaudecken - Unterkonst	15 Tage	Mon 02.02.26	Fre 20.02.26	189
191	Auslegen der Dämmung	15 Tage	Mon 23.02.26	Fre 13.03.26	190
192	Fußbodenheizung Verlegung	15 Tage	Mon 09.03.26	Fre 27.03.26	191EA-5 Tage
193	Estricharbeiten	5 Tage	Mon 30.03.26	Fre 03.04.26	192
194	Estrichruhe und Estrichaufheizen	28 Tage	Mon 06.04.26	Mit 13.05.26	193
195	Oberputzarbeiten Wände	19 Tage	Don 30.04.26	Die 26.05.26	194EA-10 Tage
196	Trockenbaudecken - Beplankung	15 Tage	Mit 27.05.26	Die 16.06.26	195
197	Innentürmontage	10 Tage	Mit 03.06.26	Die 16.06.26	196EE
198	Aufzugmontage	10 Tage	Mit 27.05.26	Die 09.06.26	195
199	Fliesenverlegearbeiten	20 Tage	Mit 17.06.26	Die 14.07.26	196
200	Anstricharbeiten	20 Tage	Mit 08.07.26	Die 04.08.26	199EA-5 Tage
201	Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage	15 Tage	Mit 29.07.26	Die 18.08.26	200EA-5 Tage
202	Lüftung Sanitär Endmontage	15 Tage	Mit 29.07.26	Die 18.08.26	200EA-5 Tage
203	Elt - Boden und Wand Endmontage	15 Tage	Mit 29.07.26	Die 18.08.26	200EA-5 Tage
204	Bodenbelagsarbeiten	15 Tage	Mit 19.08.26	Die 08.09.26	203
205	Raumausstattung - Lieferung & Einbau	8 Tage	Mit 09.09.26	Fre 18.09.26	204
206	**UG Bowlingbereich**	**273 Tage**	**Mon 06.10.25**	**Mit 11.11.26**	
207	Putzanschlüsse für Trockenbau	5 Tage	Mon 06.10.25	Fre 10.10.25	182
208	Abdichtungar. Boden und Wände	5 Tage	Mon 27.10.25	Fre 31.10.25	207EA+10 Tage
209	TBW & Vorwände 1 seitige Beplankung	20 Tage	Mon 03.11.25	Fre 28.11.25	208
210	HS - Grundinst.	20 Tage	Mon 03.11.25	Fre 28.11.25	209AA
211	Elt - Grundinst Boden + Wand	20 Tage	Mon 01.12.25	Fre 16.01.26	209AA;210
212	Lüftung - Grundinst.	20 Tage	Mon 19.01.26	Fre 13.02.26	209AA;211
213	Trockenbauwände Beplankung 2. Lage	10 Tage	Mon 16.02.26	Fre 27.02.26	212
214	Unterputzarbeiten	10 Tage	Mon 09.03.26	Fre 20.03.26	213
215	Trockenbaudecken - Unterkonst	10 Tage	Mon 23.03.26	Fre 03.04.26	214
216	Auslegen der Dämmung	5 Tage	Mon 06.04.26	Fre 10.04.26	215
217	FBH Verlegung	5 Tage	Mon 13.04.26	Fre 17.04.26	216
218	Estricharbeiten (Gussasphalt)	3 Tage	Mon 20.04.26	Mit 22.04.26	217
219	Oberputzarbeiten Wände	5 Tage	Don 30.04.26	Mit 06.05.26	218EA+5 Tage
220	Trockenbaudecken - Beplankung	10 Tage	Don 07.05.26	Mit 20.05.26	219
221	Innentürmontage	5 Tage	Don 21.05.26	Mit 27.05.26	220
222	Fliesenverlegearbeiten	10 Tage	Don 28.05.26	Mit 10.06.26	221
223	Anstricharbeiten	10 Tage	Don 11.06.26	Mit 24.06.26	222
224	Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage	10 Tage	Don 25.06.26	Mit 08.07.26	223
225	Lüftung Endmontage	10 Tage	Don 09.07.26	Mit 22.07.26	224
226	Elt - Boden und Wand Endmontage	10 Tage	Don 23.07.26	Mit 05.08.26	225
227	Bowlingbahn Montage	30 Tage	Don 06.08.26	Mit 16.09.26	226
228	Bodenbelagsarbeiten (Sockelleisten)	5 Tage	Don 17.09.26	Mit 23.09.26	227
229	Raumausstattung - Lieferung & Einbau	15 Tage	Don 24.09.26	Mit 14.10.26	228
230	Funktionsprüfung und Nacharbeiten	20 Tage	Don 15.10.26	Mit 11.11.26	228;229
231	<Neuer Vorgang>				
232	**OG Küchenbereich**	**240 Tage**	**Mon 20.10.25**	**Fre 09.10.26**	
233	Putzanschlüsse für Trockenbau	5 Tage	Mon 20.10.25	Fre 24.10.25	
234	Abdichtungar. Boden und Wände Küche	10 Tage	Mon 27.10.25	Fre 07.11.25	233
235	TBW & Vorwände 1 seitige Beplankung	25 Tage	Mon 10.11.25	Fre 12.12.25	234
236	Lüftung - Grundinst.	20 Tage	Mon 15.12.25	Fre 30.01.26	235
237	HS - Grundinst. + Bodeneinläufe	20 Tage	Mon 02.02.26	Fre 27.02.26	236

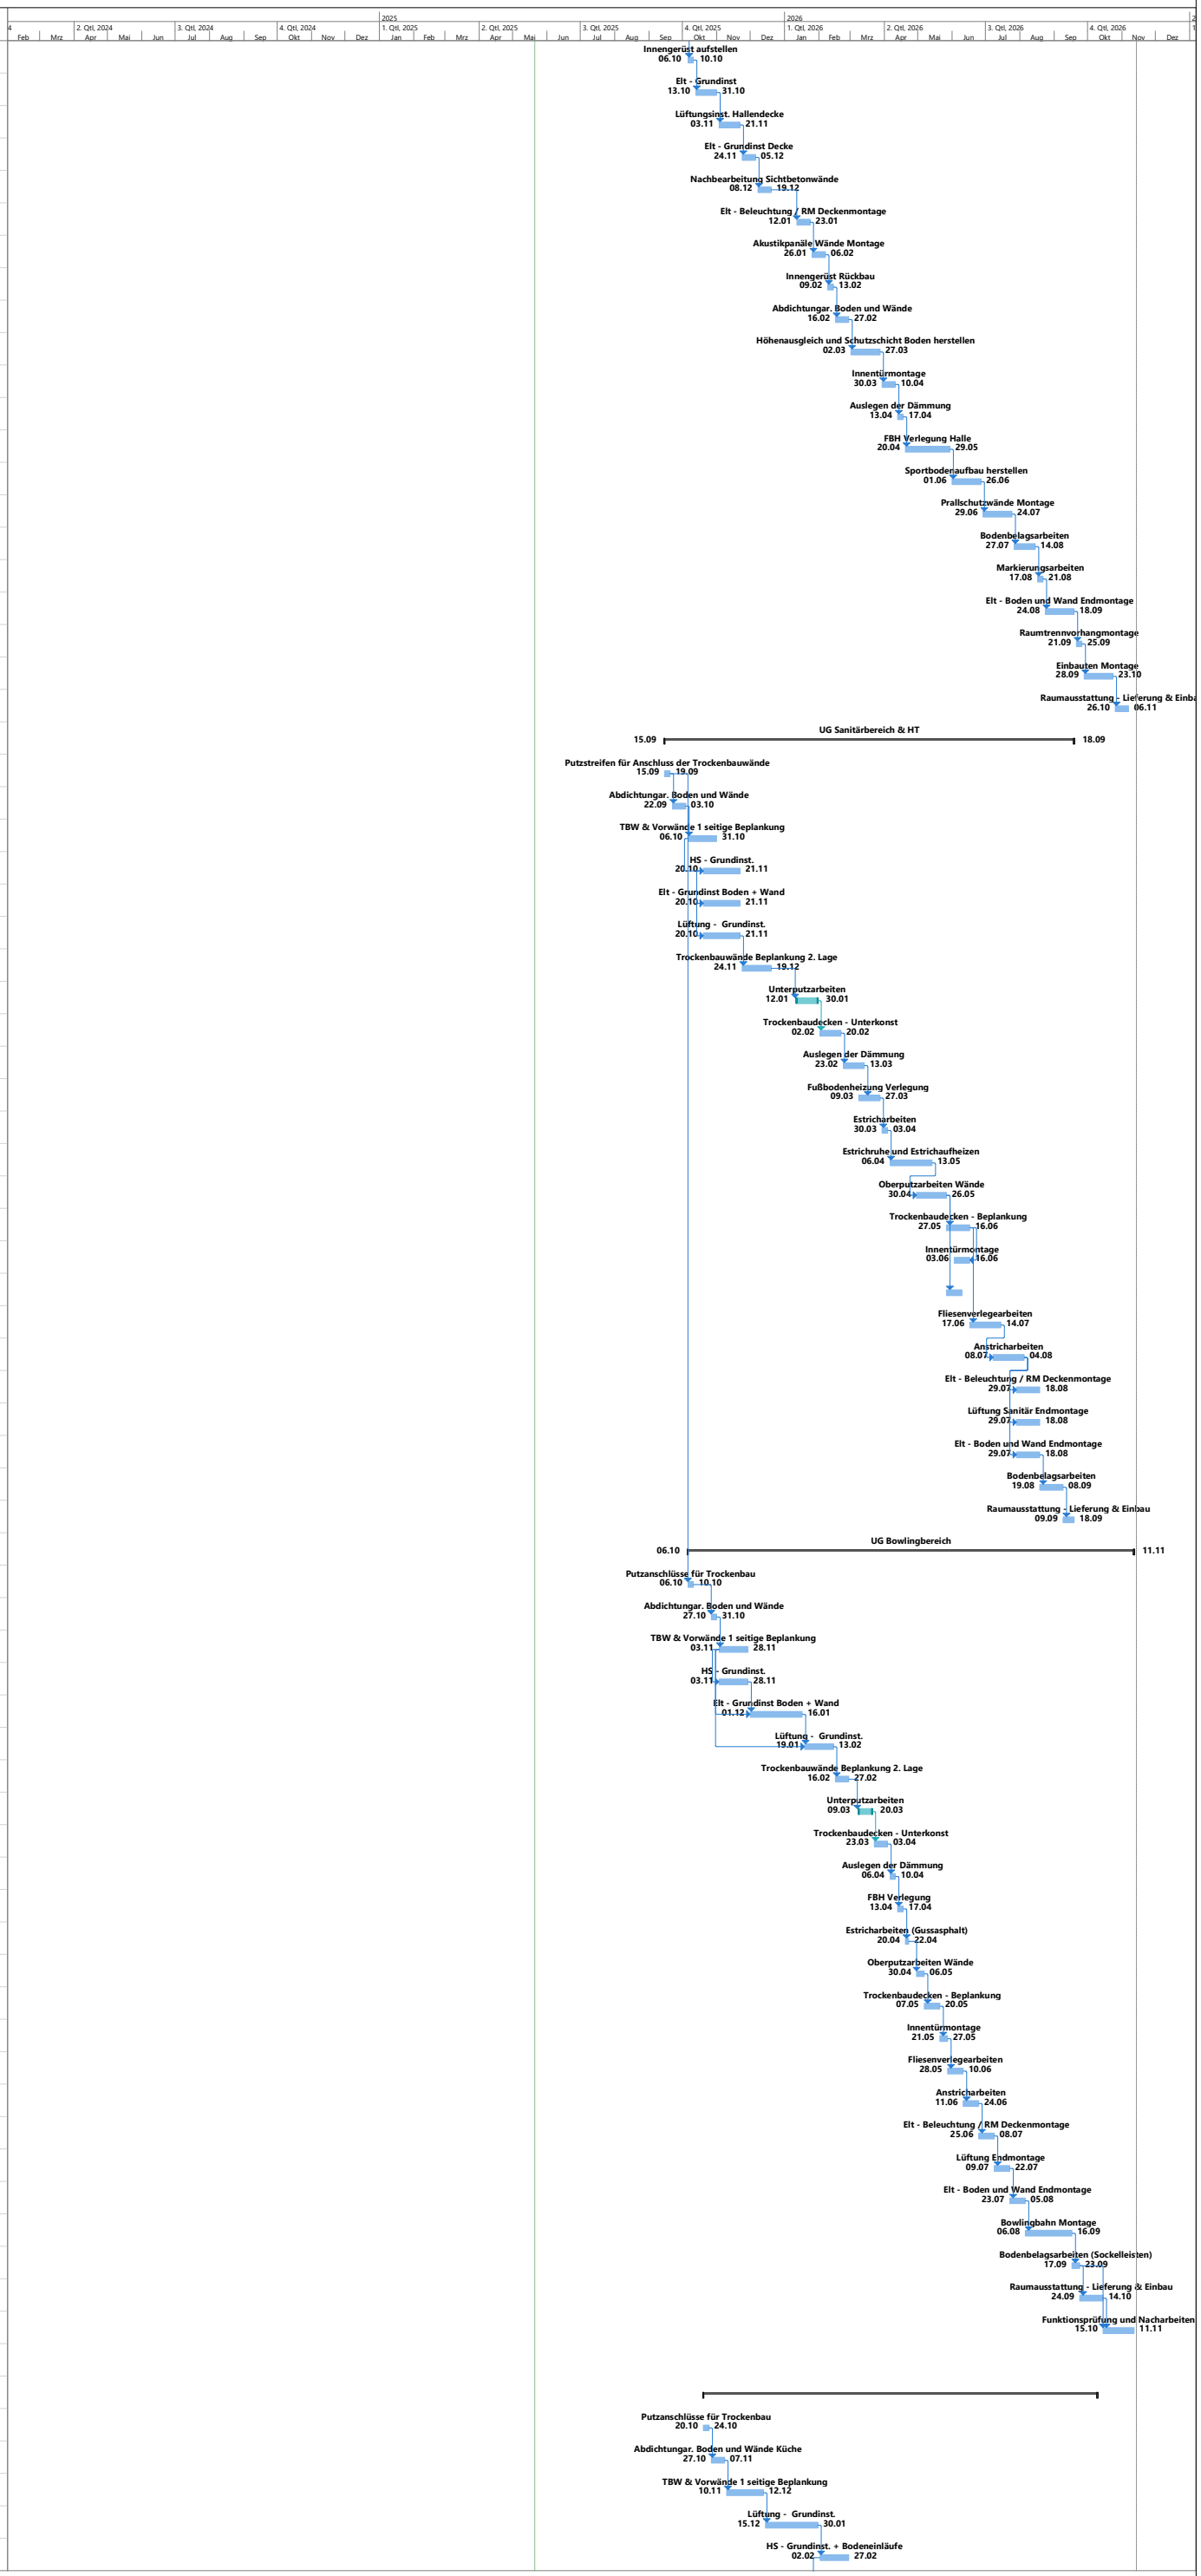

Projekt: GUT-DRAUF-KOMPLEX
Datum: 22.05.2025

Vorgang, Unterbrechung, Meilenstein, Sammelvorgang, Projektsammelvorgang, Inaktiver Vorgang, Inaktiver Meilenstein, Inaktiver Sammelvorgang, Manueller Vorgang, Nur Dauer, Manueller Sammelrollup, Manueller Sammelvorgang, Nur Anfang, Nur Ende, Externe Vorgänge, Externer Meilenstein, Stichtag, In Arbeit, Manueller Fortschritt
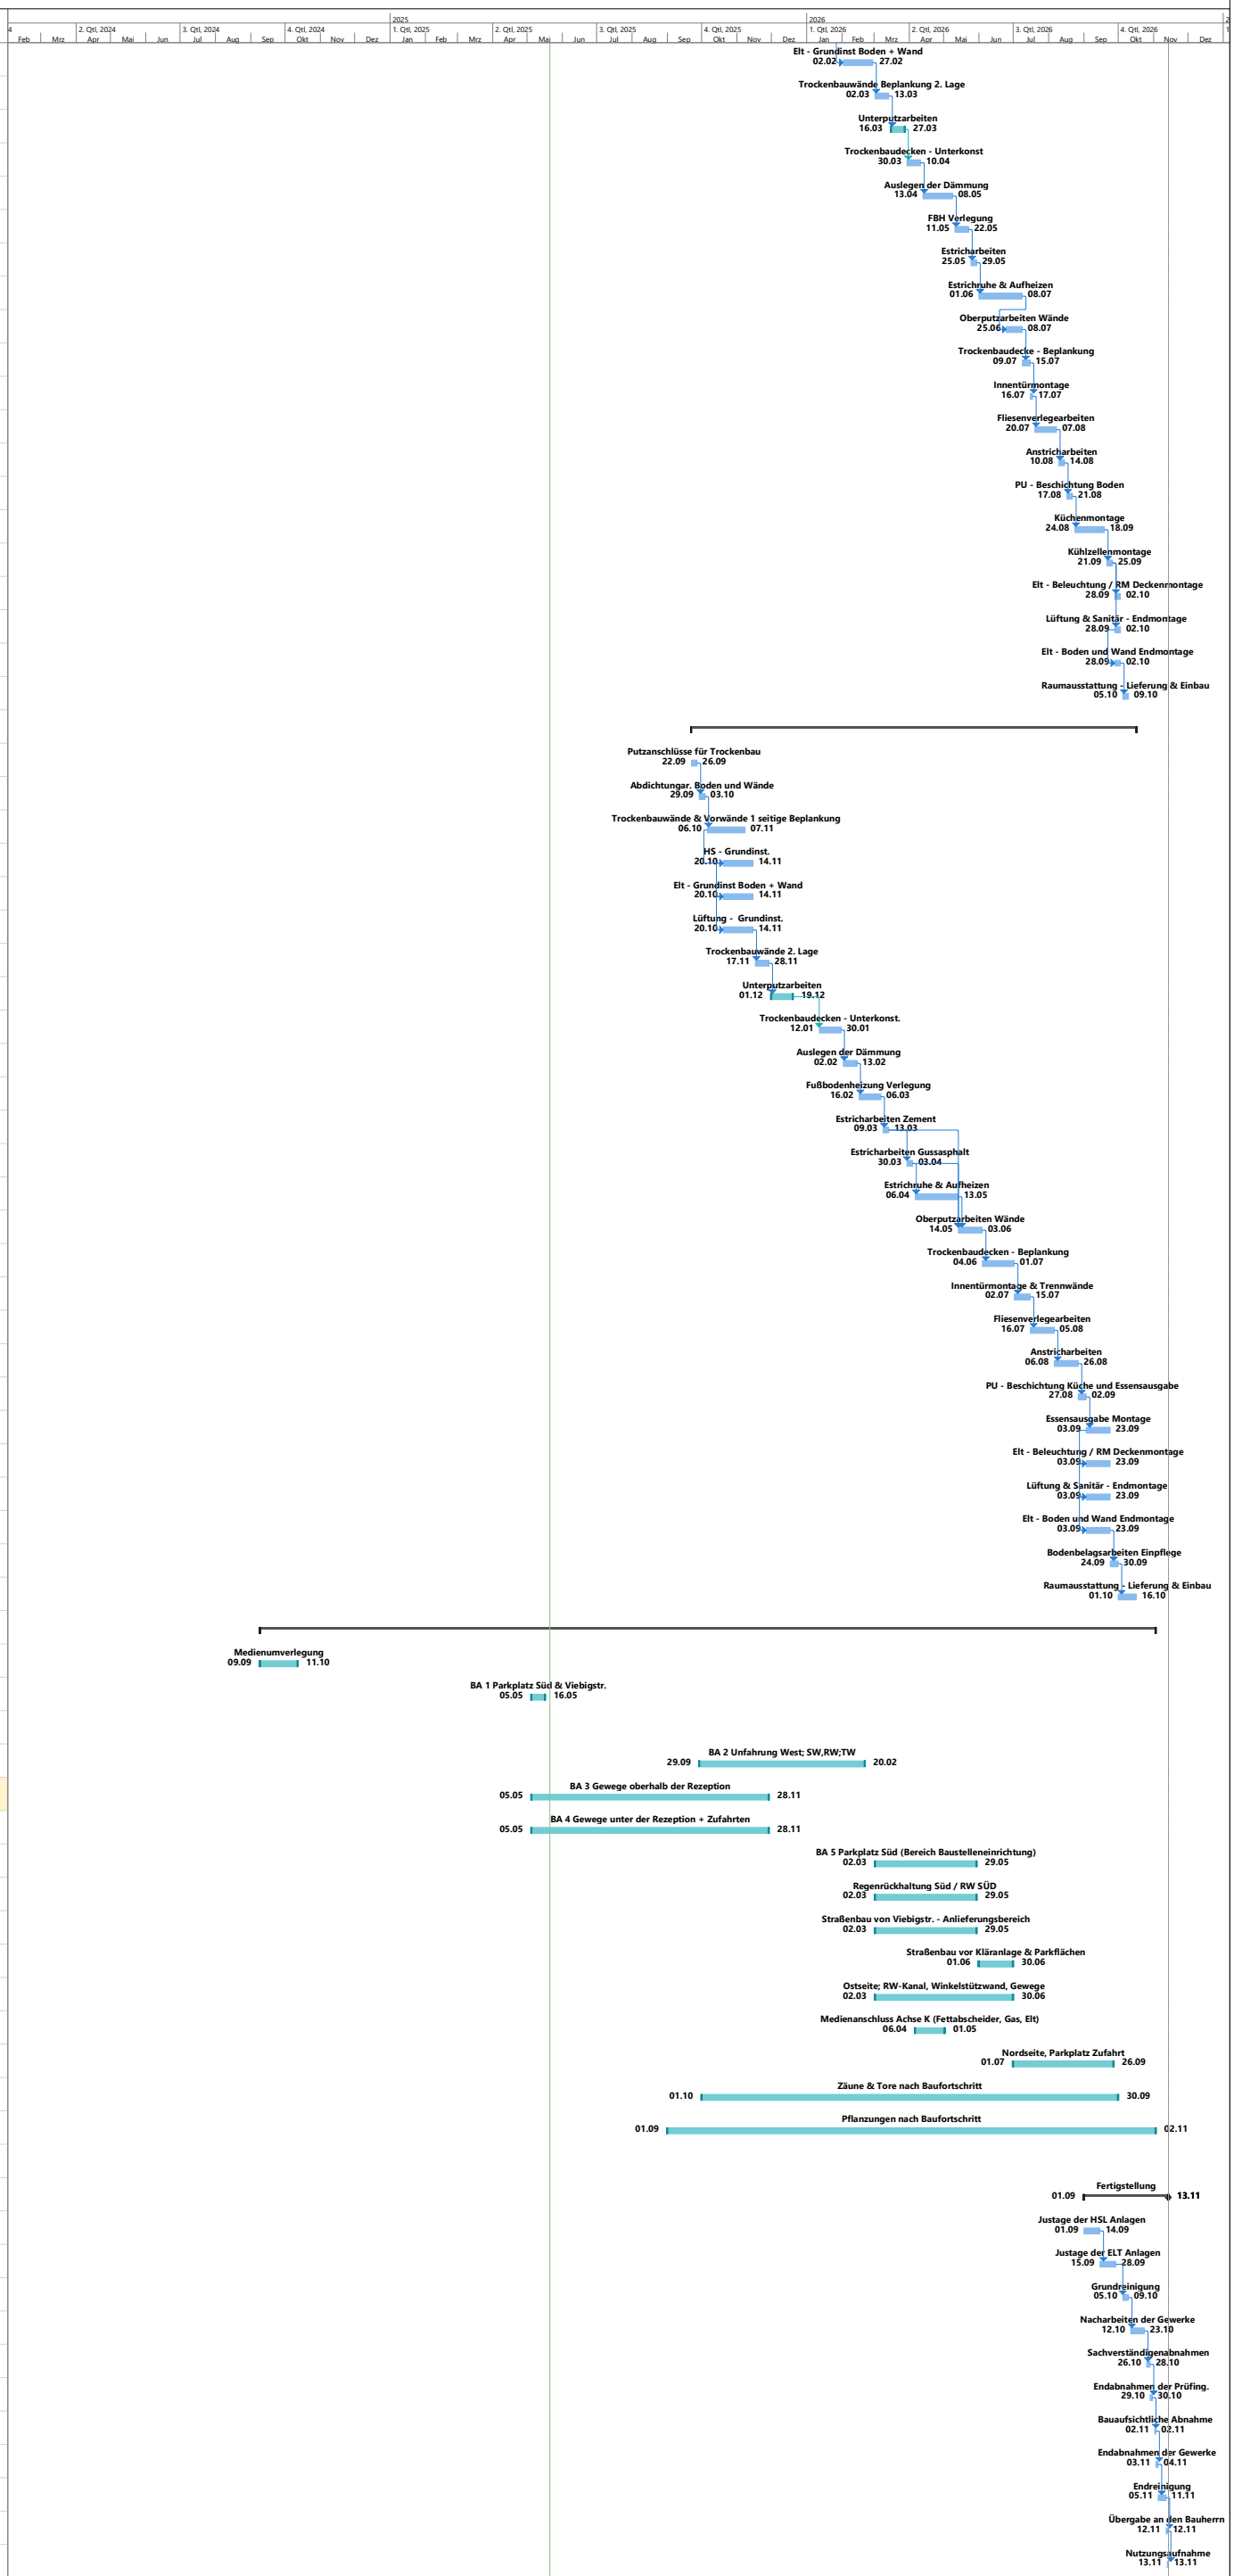
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
238	Elt - Grundinst Boden + Wand	20 Tage	Mon 02.02.26	Fre 27.02.26	237AA
239	Trockenbauwände Beplankung 2. Lage	10 Tage	Mon 02.03.26	Fre 13.03.26	238
240	Unterputzarbeiten	10 Tage	Mon 16.03.26	Fre 27.03.26	239
241	Trockenbaudecken - Unterkonst	10 Tage	Mon 30.03.26	Fre 10.04.26	240
242	Auslegen der Dämmung	20 Tage	Mon 13.04.26	Fre 08.05.26	241
243	FBH Verlegung	10 Tage	Mon 11.05.26	Fre 22.05.26	242
244	Estricharbeiten	5 Tage	Mon 25.05.26	Fre 29.05.26	243
245	Estrichruhe & Aufheizen	28 Tage	Mon 01.06.26	Mit 08.07.26	244
246	Oberputzarbeiten Wände	10 Tage	Don 25.06.26	Mit 08.07.26	245EA-10 Tage
247	Trockenbaudecke - Beplankung	5 Tage	Don 09.07.26	Mit 15.07.26	246
248	Innentürmontage	2 Tage	Don 16.07.26	Fre 17.07.26	247
249	Fliesenverlegearbeiten	15 Tage	Mon 20.07.26	Fre 07.08.26	248
250	Anstricharbeiten	5 Tage	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26	249
251	PU - Beschichtung Boden	5 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26	250
252	Küchenmontage	20 Tage	Mon 24.08.26	Fre 18.09.26	251
253	Kühlzellenmontage	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26	252
254	Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26	253
255	Lüftung & Sanitär - Endmontage	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26	253
256	Elt - Boden und Wand Endmontage	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26	255AA
257	Raumausstattung - Lieferung & Einbau	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26	256
258	**OG Mensabereich & Essenausgabe**	**265 Tage**	**Mon 22.09.25**	**Fre 16.10.26**	
259	Putzanschlüsse für Trockenbau	5 Tage	Mon 22.09.25	Fre 26.09.25	
260	Abdichtungar. Boden und Wände	5 Tage	Mon 29.09.25	Fre 03.10.25	259
261	Trockenbauwände & Vorwände 1 seitige Beplankung	25 Tage	Mon 06.10.25	Fre 07.11.25	260
262	HS - Grundinst.	20 Tage	Mon 20.10.25	Fre 14.11.25	261AA+10 Tage
263	Elt - Grundinst Boden + Wand	20 Tage	Mon 20.10.25	Fre 14.11.25	262AA
264	Lüftung - Grundinst.	20 Tage	Mon 20.10.25	Fre 14.11.25	263AA
265	Trockenbauwände 2. Lage	10 Tage	Mon 17.11.25	Fre 28.11.25	264
266	Unterputzarbeiten	15 Tage	Mon 01.12.25	Fre 19.12.25	265
267	Trockenbaudecken - Unterkonst.	15 Tage	Mon 12.01.26	Fre 30.01.26	266
268	Auslegen der Dämmung	10 Tage	Mon 02.02.26	Fre 13.02.26	267
269	Fußbodenheizung Verlegung	15 Tage	Mon 16.02.26	Fre 06.03.26	268
270	Estricharbeiten Zement	5 Tage	Mon 09.03.26	Fre 13.03.26	269
271	Estricharbeiten Gussasphalt	5 Tage	Mon 30.03.26	Fre 03.04.26	270EA+10 Tage
272	Estrichruhe & Aufheizen	28 Tage	Mon 06.04.26	Mit 13.05.26	271
273	Oberputzarbeiten Wände	15 Tage	Don 14.05.26	Mit 03.06.26	270EA+5 Tage;271;272
274	Trockenbaudecken - Beplankung	20 Tage	Don 04.06.26	Mit 01.07.26	273
275	Innentürmontage & Trennwände	10 Tage	Don 02.07.26	Mit 15.07.26	274
276	Fliesenverlegearbeiten	15 Tage	Don 16.07.26	Mit 05.08.26	275
277	Anstricharbeiten	15 Tage	Don 06.08.26	Mit 26.08.26	276
278	PU - Beschichtung Küche und Essensausgabe	5 Tage	Don 27.08.26	Mit 02.09.26	277
279	Essensausgabe Montage	15 Tage	Don 03.09.26	Mit 23.09.26	278
280	Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage	15 Tage	Don 03.09.26	Mit 23.09.26	279AA
281	Lüftung & Sanitär - Endmontage	15 Tage	Don 03.09.26	Mit 23.09.26	280AA
282	Elt - Boden und Wand Endmontage	15 Tage	Don 03.09.26	Mit 23.09.26	281AA
283	Bodenbelagsarbeiten Einpflege	5 Tage	Don 24.09.26	Mit 30.09.26	282
284	Raumausstattung - Lieferung & Einbau	12 Tage	Don 01.10.26	Fre 16.10.26	283
285	**Tiefbau & Außenanlagen**	**536 Tage**	**Mon 09.09.24**	**Mon 02.11.26**	
286	Medienumverlegung	25 Tage	Mon 09.09.24	Fre 11.10.24	
287	BA 1 Parkplatz Süd & Viebigstr.	10 Tage	Mon 05.05.25	Fre 16.05.25	
288	Neuer Terminplan IB RISCH - notwendig				
289	BA 2 Unfahrung West; SW,RW;TW	90 Tage	Mon 29.09.25	Fre 20.02.26	
290	BA 3 Gewege oberhalb der Rezeption	150 Tage	Mon 05.05.25	Fre 28.11.25	
291	BA 4 Gewege unter der Rezeption + Zufahrten	150 Tage	Mon 05.05.25	Fre 28.11.25	
292	BA 5 Parkplatz Süd (Bereich Baustelleneinrichtung)	65 Tage	Mon 02.03.26	Fre 29.05.26	
293	Regenrückhaltung Süd / RW SÜD	65 Tage	Mon 02.03.26	Fre 29.05.26	
294	Straßenbau von Viebigstr. - Anlieferungsbereich	65 Tage	Mon 02.03.26	Fre 29.05.26	
295	Straßenbau vor Kläranlage & Parkflächen	22 Tage	Mon 01.06.26	Die 30.06.26	
296	Ostseite; RW-Kanal, Winkelstützwand, Gewege	87 Tage	Mon 02.03.26	Die 30.06.26	
297	Medienanschluss Achse K (Fettabscheider, Gas, Elt)	20 Tage	Mon 06.04.26	Fre 01.05.26	
298	Nordseite, Parkplatz Zufahrt	64 Tage	Mit 01.07.26	Sam 26.09.26	
299	Zäune & Tore nach Baufortschritt	246 Tage	Mit 01.10.25	Mit 30.09.26	
300	Pflanzungen nach Baufortschritt	291 Tage	Mon 01.09.25	Mon 02.11.26	
301					
302	**Fertigstellung**	**54 Tage**	**Die 01.09.26**	**Fre 13.11.26**	
303	Justage der HSL Anlagen	10 Tage	Die 01.09.26	Mon 14.09.26	
304	Justage der ELT Anlagen	10 Tage	Die 15.09.26	Mon 28.09.26	303
305	Grundreinigung	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26	304
306	Nacharbeiten der Gewerke	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26	305
307	Sachverständigenabnahmen	3 Tage	Mon 26.10.26	Mit 28.10.26	306
308	Endabnahmen der Prüfing.	2 Tage	Don 29.10.26	Fre 30.10.26	307
309	Bauaufsichtliche Abnahme	1 Tag	Mon 02.11.26	Mon 02.11.26	308
310	Endabnahmen der Gewerke	2 Tage	Die 03.11.26	Mit 04.11.26	309
311	Endreinigung	5 Tage	Don 05.11.26	Mit 11.11.26	310
312	Übergabe an den Bauherrn	1 Tag	Don 12.11.26	Don 12.11.26	311
313	Nutzungsaufnahme	1 Tag	Fre 13.11.26	Fre 13.11.26	312
314
