Rahmenterminplan

Neubau Kindertagesstätte Haiger-Sechshelden

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Zuschlag	19at	Mi, 15.10.25	Mo, 10.11.25
1.1	Zuschlagsentscheidung nach § 18 EU VOB/A in Verbindung mit § 16d EU, Abs. 2, Satz 1	2at	Mi, 15.10.25	Do, 16.10.25
1.2	Mitteilung an erfolgreiche Bieter / Absage an nicht bestätigte Bieter nach § 19 EU VOB/A	2at	Fr, 17.10.25	Mo, 20.10.25
1.3	Informations- und Wartepflicht (mind. 10 KT gem. § 134, Abs 2 GWB) in Verbindung mit § 19 EU Abs. 2 VOB/A	9at	Di, 21.10.25	Fr, 31.10.25
1.4	Zuschlagserteilung / Vertragsabschluss	5at	Mo, 03.11.25	Fr, 07.11.25
1.5	Bekanntmachungspflichten nach § 39 VgV in Verbindung mit § 18 EU Abs. 3	1at	Mo, 10.11.25	Mo, 10.11.25
2	Planung GU	119kt	Di, 11.11.25	Mo, 09.03.26
2.1	GU Vorlauf	15at	Di, 11.11.25	Mo, 01.12.25
2.2	Kick-Off	1at	Di, 02.12.25	Di, 02.12.25
2.3	GU Werkplanung Holzrahmenbau	50at	Di, 02.12.25	Mo, 09.02.26
2.4	Prüfung Werkplanung Prüfstatiker	20at	Di, 10.02.26	Mo, 09.03.26
2.5	Schnittstellen Abstimmung Werkplanung Gründung EMB/GU	20at	Di, 13.01.26	Mo, 09.02.26
3	Vergabeverfahren Erd-, Kanal- und Betonarbeiten (EKB, Gründung)	92at	Mo, 05.05.25	Di, 09.09.25
3.1	Vorbereitung der Vergabe	16at	Mo, 05.05.25	Mo, 26.05.25
3.2	Prüfung / Veröffentlicheung	15at	Di, 27.05.25	Mo, 16.06.25
3.3	Angebotsfrist	21at	Di, 17.06.25	Di, 15.07.25
3.4	Submission	1at	Mi, 16.07.25	Mi, 16.07.25
3.5	Prüfen der Angebote	10at	Mi, 16.07.25	Di, 29.07.25
3.6	Beschlüsse und Beauftragung (Verlängerte Zuschlags- & Bindefrist ?)	30at	Mi, 30.07.25	Di, 09.09.25
4	Vorleistungen Erd-, Kanal- u. Betonarbeiten	158at	Mi, 10.09.25	Fr, 17.04.26
4.1	Vorlauf, Arbeitsvorbereitung	10at	Mi, 10.09.25	Di, 23.09.25
4.2	Baustelleneinrichtung	10at	Mo, 22.09.25	Fr, 03.10.25
4.3	Erdarbeiten (witterungsabhängig!)	35at	Mi, 01.10.25	Di, 18.11.25
4.4	Grobplanum fertig	1at	Mo, 17.11.25	Mo, 17.11.25
4.5	WINTERPAUSE vorraussichtlich keine Erdarbeiten möglich!!	60at	Di, 18.11.25	Mo, 09.02.26
4.6	Schnittstellen Abstimmung Werkplanung Erd-, Kanal & Betonarbeiten /GU	20at	Di, 13.01.26	Mo, 09.02.26
4.7	Freigabe Werkplanung Erd-, Kanal- und Betonarbeiten duch GU	1at	Mo, 09.02.26	Mo, 09.02.26
4.8	Entwässerung,Gründung, Bodenplatte, Rohbau Technikgebäude (witterungsabhängig!)	49at	Di, 10.02.26	Fr, 17.04.26
5	Ausführung GU	183at	Di, 10.03.26	Do, 19.11.26
5.1	Holzbau Lieferung und Vorfertigung	50at	Di, 10.03.26	Mo, 18.05.26
5.2	Montage	20at	Di, 19.05.26	Mo, 15.06.26
5.3	Gebäudehülle regendicht geschlossen	10at	Di, 09.06.26	Mo, 22.06.26
5.4	Fassade/Außenhülle	60at	Di, 23.06.26	Mo, 14.09.26
5.5	Ausbau	80at	Di, 21.07.26	Mo, 09.11.26
5.6	Abnahme, IBN, Übergabe	8at	Di, 10.11.26	Do, 19.11.26

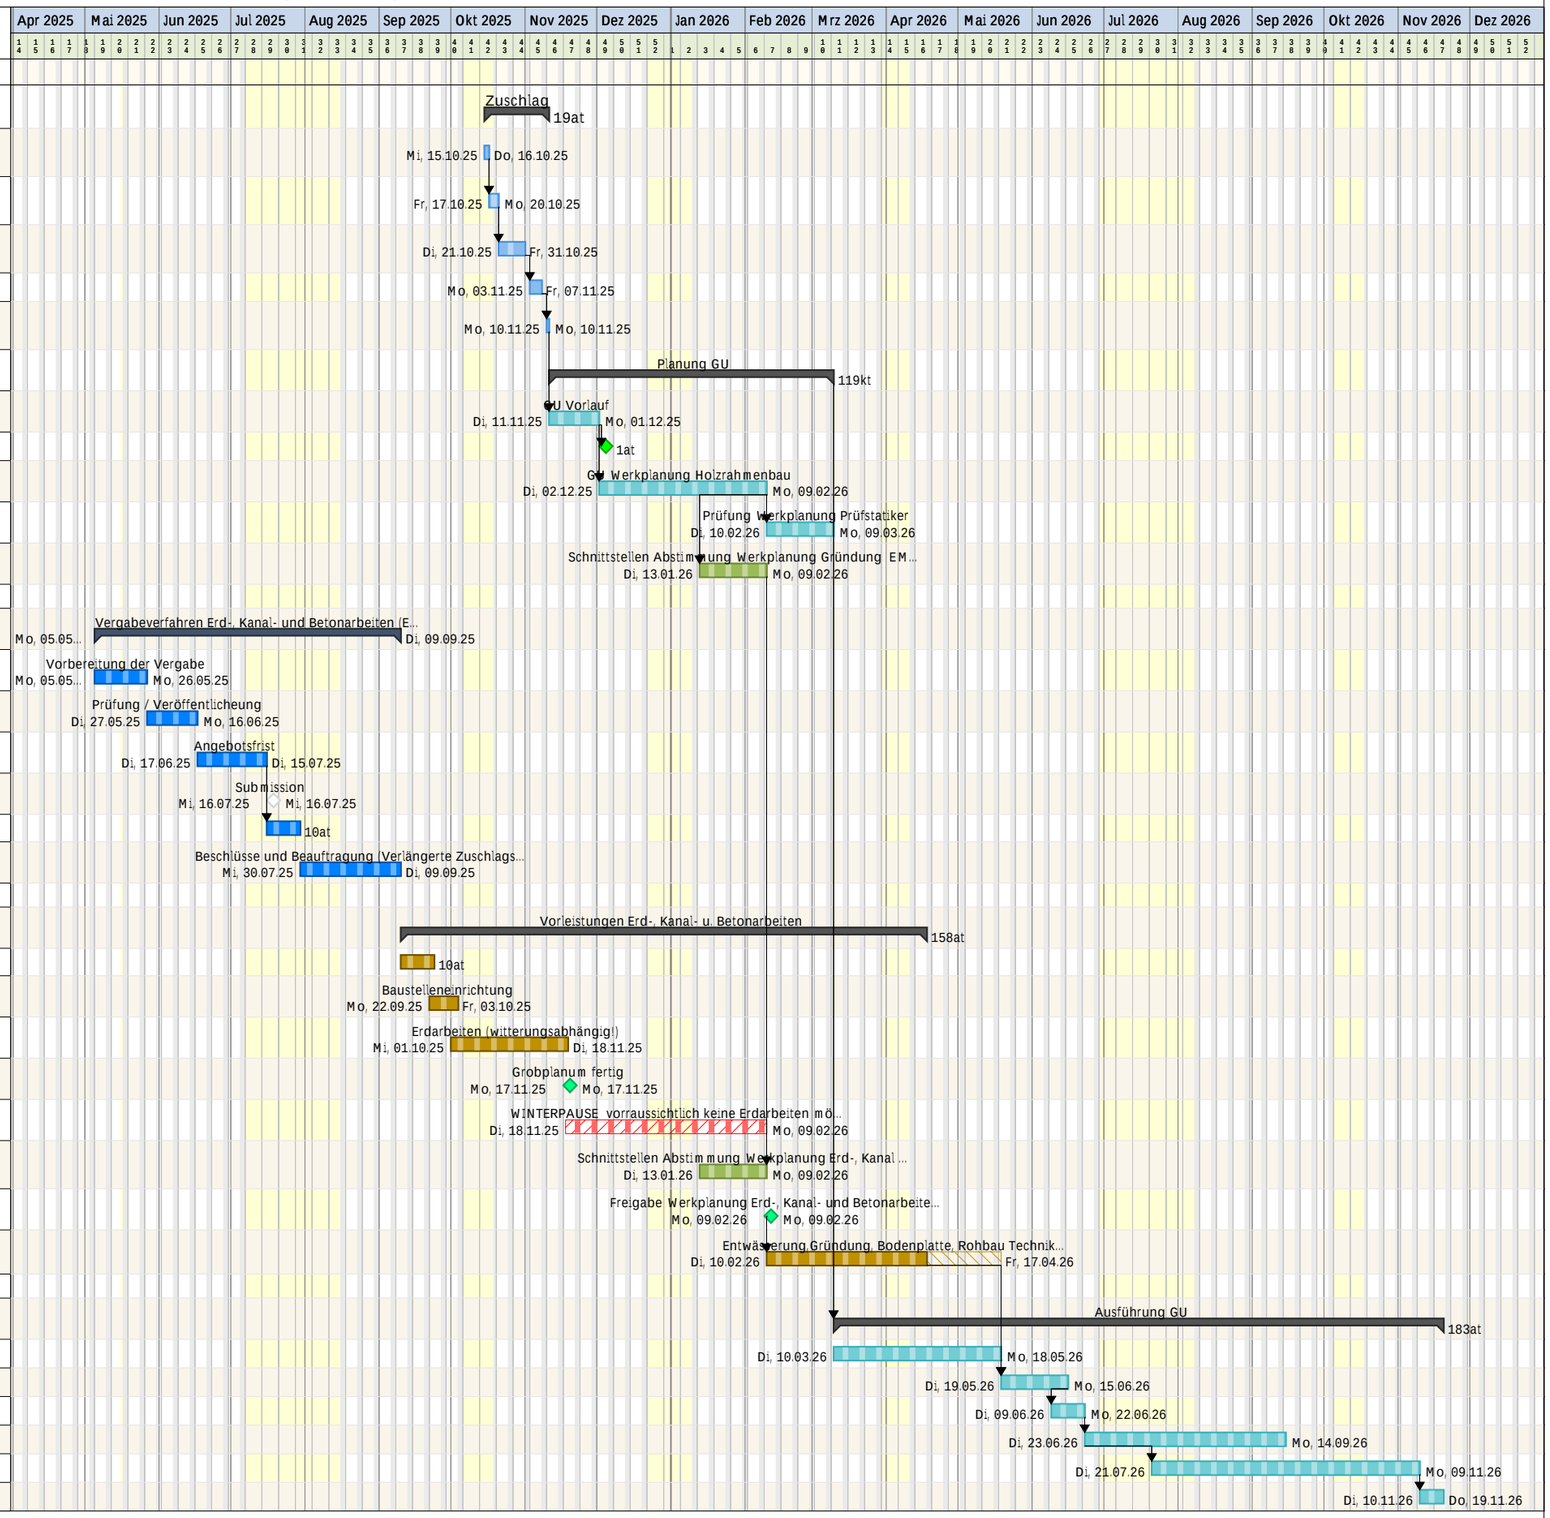

Projektzeitrahmen von Mi, 08.01.25 bis Do, 31.12.26
Kalender: MSProject-Import (eingebettet)
Druckdatum: 16.05.2025 11:48
Filter:

Vorlauf Beauftragung GU
Planung & Ausführung GU
Meilenstein
Schnittstellenplanung GU / Erd-, Kanal-, Betonarbeiten
Vorlauf Beauftragung Erd-, Kanal-, Betonarbeiten
angenommene Arbeitsunterbrechung
Erd-, Kanal-, Betonarbeiten
Schulferien

pmb.m.pro-Plan 7.7.0.8.525 Serien Nr.: 1119 Lizenz für Werner Architekten Dillenburg
