WAHB
Klarvlage Sitzed1

Bauzeitenplan Körschtalmühlsaufsatz

Stand: 04.06.2025

Nr.		Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1		**Blockheizkraftwerk Planung LP 5 - 7**	**141 Tage**	**05.01.25**	**07.01.25**	
172						
172		**Brandschutz**	**413 Tage**	**30.09.25**	**11.07.27**	
173		**Deckenbelag**	**317 Tage**	**30.09.25**	**19.11.26**	
174		Grundierung	5 Tage	30.09.25	30.09.25	
175		**Los 1: Bauschlosserarbeitung und Gerüstbauarbeiten**	**247 Tage**	**29.10.25**	**30.10.26**	
176		Baustellenerschließung & Container	159 Tage	29.10.25	01.04.26	174:FA+20 Tage
177		Baustellenüberwachung	159 Tage	29.11.25	17.04.26	174:FA+30 Tage
178		**Gerüstarbeiten**	**157 Tage**	**30.04.26**	**30.10.26**	
179		**Fußballplatz**	**99 Tage**	**30.04.26**	**08.07.26**	
180		Vorsorgegerüst 1B1	5 Tage	30.04.26	04.05.26	340
181		Vorsorgegerüst FB2	5 Tage	04.06.26	10.06.26	347
182		Fassadengerüst FB1	5 Tage	29.06.26	03.07.26	344
183		Fassadengerüst FB2	5 Tage	02.07.26	08.07.26	349
184		**Schlosserzeugnisfußballplatz**	**80 Tage**	**09.07.26**	**30.10.26**	
185		Vorsorgegerüst	5 Tage	09.07.26	15.07.26	353
186		Fassadengerüste	20 Tage	01.10.26	28.10.26	211
187		**Los 2: Tief- und Rohrbauarbeiten**	**253 Tage**	**30.04.25**	**07.04.26**	
188		**Baustelleneinrichtung**	**40 Tage**	**30.04.25**	**30.11.25**	
189		Verkehrssicherungsmaßnahmen	40 Tage	30.04.25	26.11.25	156
190		**Erdarbeiten**	**205 Tage**	**27.11.25**	**30.09.26**	
191		Baustelle allgemein	10 Tage	27.11.25	10.12.25	189
192		**Verkehrsrücken**	**115 Tage**	**08.01.26**	**24.06.26**	
193		Aushub Schlammeinfüllung	10 Tage	08.01.26	21.01.26	214
194		Anfüllen Schlammeinfüllung	5 Tage	26.06.26	04.07.26	209
195		Aushub Becken und Pumpwerk	5 Tage	26.02.26	04.03.26	194MA
196		Anfüllen	5 Tage	26.06.26	04.07.26	192
197		**Gedeckter**	**34 Tage**	**04.05.26**	**21.07.26**	
198		Auswechseln	10 Tage	04.05.26	18.05.26	194AE
199		Anfüllung (ev. Schotter) bis dahin	5 Tage	08.07.26	04.07.26	198
200		Anfüllen	5 Tage	21.07.26	21.07.26	195
201		Gedeckel	5 Tage	08.07.26	04.07.26	198
202		**Technikgebäude Faulung**	**40 Tage**	**11.12.25**	**05.02.26**	**191**
203		Aushub	5 Tage	11.12.25	17.12.25	181
204		Anfüllen	5 Tage	28.08.26	05.02.26	191MA+5 Tage
205		**Fußballplatz**	**153 Tage**	**29.01.25**	**02.09.25**	
206		Aushub Schlammeinfüllung	10 Tage	29.01.25	12.02.25	242BE
207		Anfüllen Schlammeinfüllung	5 Tage	04.06.26	10.06.26	247
208		Anfüllen	5 Tage	27.08.25	02.09.25	250
209		**Schlosserzeugnisfußballplatz**	**80 Tage**	**04.06.26**	**30.09.26**	
210		Aushub	10 Tage	04.06.26	18.06.26	252BE
211		Anfüllen	5 Tage	24.08.26	30.08.26	256
212		**Verkehrsrücken**	**83 Tage**	**11.12.25**	**25.03.26**	
213		**Vorbereitungsarbeiten**	**85 Tage**	**11.12.25**	**25.03.26**	
214		Entsorgen	10 Tage	11.12.25	01.01.26	191
215		Zehren	5 Tage	19.03.26	25.03.26	220:FA+15 Tage
216		**Wasserhaltungsarbeiten**	**260 Tage**	**15.10.25**	**13.08.26**	
217		Baustelle allgemein	20 Tage	15.10.25	11.08.26	174:FA+15 Tage
218		Verkehrsrücken	50 Tage	08.01.26	18.03.26	214
219		Technikgebäude Faulung	40 Tage	26.02.26	24.04.26	208
220		Schlammeinfüllgebäude	30 Tage	18.06.26	29.07.26	219
221		**Fotovoltaikanlagenbeleuchten**	**30 Tage**	**27.08.26**	**07.10.26**	
222		Bereich Faulung	30 Tage	27.08.26	07.10.26	293
223		**Druckrohrleitungsarbeiten: außerhalb von Erdreichen**	**44 Tage**	**07.08.26**	**07.10.26**	
224		Verkehrsrücken	30 Tage	07.08.26	17.08.26	292
225		Bereich Faulung	30 Tage	27.08.26	07.10.26	293
226		Schlammeinfüllgebäude	5 Tage	24.08.26	30.08.26	211BA
227		**Brunnenarbeiten**	**163 Tage**	**18.12.25**	**22.08.26**	
228		**Verkehrsrücken**	**160 Tage**	**22.01.26**	**17.08.26**	
229		Schlammschacht	20 Tage	22.01.26	05.02.26	193
230		Becken	40 Tage	20.03.26	27.05.26	225
231		Pumpwerk	15 Tage	28.05.26	17.06.26	230
232		Neuverdichtigkeitsprüfung	15 Tage	28.05.26	17.06.26	230
233		**Gedeckelten**	**23 Tage**	**16.08.26**	**30.07.26**	
234		Gewächshaustunnel	10 Tage	28.06.26	01.07.26	231
235		Betonstatik	10 Tage	01.07.26	20.07.26	199
236		**Gedeckel**	**9 Tage**	**03.07.26**	**08.07.26**	
237		Fundament	5 Tage	03.07.26	08.07.26	234
238		**Technikgebäude Faulung**	**76 Tage**	**18.12.25**	**30.04.26**	
239		Gefälle	30 Tage	18.12.25	11.02.26	203
240		Decke EG	15 Tage	19.03.26	09.04.26	242
241		**Fußballplatz 1**	**165 Tage**	**13.01.26**	**15.07.26**	
242		Spritz	10 Tage	13.02.26	25.02.26	239
243		Wände	35 Tage	26.02.26	17.04.26	242
244		Decke	15 Tage	21.04.26	10.05.26	243
245		Neuverdichtigkeitsprüfung	20 Tage	18.06.26	15.07.26	244:FA+20 Tage
246		**Fußballplatz 2**	**70 Tage**	**20.05.26**	**31.08.26**	
247		Spritz	10 Tage	20.05.26	03.06.26	244
248		Wände	35 Tage	04.06.26	22.07.26	247
249		Decke	15 Tage	11.06.26	01.07.26	181
250		Neuverdichtigkeitsprüfung	20 Tage	30.07.26	26.08.26	249:FA+20 Tage
251		**Schlosserzeugnisfußballplatz**	**70 Tage**	**30.06.26**	**21.09.26**	
252		Trichter	5 Tage	18.06.26	24.06.26	231
253		Spritz	10 Tage	25.06.26	08.07.26	252
254		Wände	10 Tage	09.07.26	22.07.26	253
255		Decke	15 Tage	16.07.26	29.07.26	180
256		Neuverdichtigkeitsprüfung	30 Tage	27.08.26	23.08.26	255:FA+20 Tage
257		**Klaarwerkstein**	**99 Tage**	**19.02.26**	**02.07.26**	
258		**Vorbereiten**	**30 Tage**	**16.05.26**	**02.07.26**	
259		Gedeckelnde	5 Tage	18.06.26	24.06.26	231
260		Klarer	10 Tage	29.06.26	08.07.26	259
261		**Technikgebäude Faulung**	**50 Tage**	**19.02.26**	**04.05.26**	
262		Eingrenzen	20 Tage	19.02.26	18.03.26	239:FA+5 Tage
263		Gießen	5 Tage	19.04.26	17.04.26	243
264		Klarer	10 Tage	20.04.26	04.05.26	263
265		**Los 3: Beh- und Ausbauarbeiten**	**313 Tage**	**13.05.26**	**26.10.26**	
266		**Dienstarbeiten**	**50 Tage**	**13.05.26**	**21.07.26**	
267		Verkehrsrücken	5 Tage	16.07.26	22.07.26	259:FA+15 Tage
268		Technikgebäude Faulung	5 Tage	22.05.26	26.05.26	263:FA+15 Tage
269		**Elektroinstallationsarbeiten - Fassadenleuchten**	**98 Tage**	**04.08.26**	**19.10.26**	
270		Verkehrsrücken	5 Tage	23.07.26	29.07.26	267
271		Technikgebäude Faulung	5 Tage	04.06.26	10.06.26	263:FA+17 Tage
272		Fußballplatz	20 Tage	21.08.26	23.09.26	270
273		Schlammeinfüllgebäude	10 Tage	06.10.26	19.10.26	264:FA+15 Tage
274		**Klimaarbeiten**	**46 Tage**	**11.08.26**	**05.08.26**	
275		Verkehrsrücken	5 Tage	30.07.26	05.08.26	273
276		Technikgebäude Faulung	5 Tage	11.06.26	17.06.26	271
277		**Los 4: Aufzugsarbeiten**	**114 Tage**	**20.03.26**	**16.09.26**	
278		**Einrichtarbeiten**	**55 Tage**	**20.05.26**	**05.09.26**	
279		Verkehrsrücken	20 Tage	30.06.26	03.09.26	275
280		Technikgebäude Faulung	20 Tage	18.06.26	15.07.26	276
281		**Fliesen- und Plattenarbeiten**	**45 Tage**	**30.07.26**	**30.09.26**	
282		Verkehrsrücken	10 Tage	05.08.26	16.08.26	279
283		Technikgebäude Faulung	20 Tage	16.07.26	12.08.26	280
284		**Malerarbeiten**	**40 Tage**	**20.08.26**	**30.09.26**	
285		Verkehrsrücken	5 Tage	21.08.26	26.08.26	276MA+5 Tage
286		Technikgebäude Faulung	5 Tage	20.09.26	26.09.26	280MA+5 Tage
287		**Los 5: Metall- und Stahlbauarbeiten**	**98 Tage**	**30.06.26**	**26.10.26**	
288		**Stahlbauarbeiten**	**55 Tage**	**30.06.26**	**14.10.26**	
289		Fußballplatz	15 Tage	24.08.26	14.10.26	272
290		**Metallbauarbeiten**	**95 Tage**	**30.06.26**	**26.10.26**	
291		Verkehrsrücken	10 Tage	06.08.26	19.08.26	275
292		Technikgebäude Fußballplatz	10 Tage	18.06.26	01.07.26	276
293		Fußballplatz	10 Tage	15.10.26	28.10.26	289
294		Schlosserzeugnisfußplatz	10 Tage	24.08.26	07.10.26	256
295		**Los 6: Dachbauarbeiten**	**45 Tage**	**10.09.26**	**05.11.26**	
296		**Verkehrserzeugnisarbeiten**	**45 Tage**	**10.09.26**	**05.11.26**	
297		Verkehrsrücken	15 Tage	18.08.26	08.10.26	224
298		Bereich Faulung	30 Tage	08.10.26	05.11.26	297
299		**Pflanzarbeiten und Pflanzenbeleg, Entfernung**	**24 Tage**	**10.09.26**	**10.11.26**	
300		Verkehrsrücken	15 Tage	18.08.26	08.10.26	224
301		Bereich Faulung	30 Tage	08.10.26	10.11.26	225
302						
303		**Maschinenarbeiten**	**413 Tage**	**08.10.25**	**11.07.27**	
304		**Los 7: Maschinentechnik ausserhalb Schlammeinfüllung**	**275 Tage**	**08.01.26**	**17.02.27**	
305		Werkplanung	60 Tage	08.01.26	31.03.26	126;135;142;1
306		Fertigung	119 Tage	02.04.26	23.06.26	305
307		Montage Verkehrsrücken	20 Tage	06.06.26	03.08.26	370
308		Montage Technikgebäude Faulung	30 Tage	03.08.26	14.10.26	307
309		**Montage Fußballplatz**	**30 Tage**	**15.10.26**	**03.12.26**	
310		Montage Gasaufbereitung	20 Tage	14.01.27	17.02.27	313
311		Montage Schlammeinfüllgebäude	20 Tage	03.12.26	15.01.27	311
312		**Los 8: Maschinentechnik Klaarwerkstein/Montage Verkehrsrücken**	**215 Tage**	**27.11.25**	**14.10.26**	
313		Werkplanung	30 Tage	27.11.25	21.01.26	195
314		Montage Klarwerk etc.	20 Tage	17.08.26	14.10.26	382
315		**Los 9: Maschinentechnik Schlammentwässerungsanlage**	**302 Tage**	**04.02.25**	**13.03.27**	
316		Werkplanung	30 Tage	04.12.25	28.01.26	142
317		Montage	40 Tage	18.01.27	13.03.27	
318		**Los 10: Maschinentechnik Belüftung und Gebläse Belüftung**	**347 Tage**	**20.02.26**	**13.07.27**	
319		Werkplanung	30 Tage	20.02.26	01.04.26	145BA+45 Tag
320		Montage	60 Tage	19.04.27	13.07.27	321AA-10 Tag
321		**Los 11: Maschinentechnik Zusatzarbeiten**	**163 Tage**	**18.12.25**	**24.08.26**	
322		Werkplanung	30 Tage	18.12.25	11.02.26	155
323		Montage	25 Tage	21.07.26	24.08.26	395
324		**Los 12: Gasversorgung, Heizungstechnik**	**105 Tage**	**08.01.26**	**02.04.27**	
325		Werkplanung	20 Tage	08.01.26	04.02.26	168
326		Montage	40 Tage	04.02.27	02.04.27	306;312EA-10
327		**Los 13: Elektrotechnik**	**413 Tage**	**08.10.25**	**11.07.27**	
328		Auftragsvergabe	5 Tage	08.10.25	06.10.25	159
329		Projektierung Schaltanlagen Ind. Prüfgeb	15 Tage	23.04.26	04.06.26	305EA-5 Tage
330		Pfeifen-Verbindungsleitung 4/6/10 Tage	20 Tage	29.06.26	03.08.26	331
331		Bestellung u. Montage der Schaltschränke	20 Tage	29.06.26	28.08.26	331
332		Programmierung SPS und PLS	20 Tage	03.08.26	09.12.26	332
333		Pfeifen-Verbindungsleitung 4/6/10 Tage	20 Tage	29.06.26	02.08.26	331
334		Lieferung und Aufstellung Schaltschränke	20 Tage	03.08.26	26.08.26	333;332
335		Kabelverlegung Außenbereich inkl. Installationen	19.8 Tage	17.08.26	30.06.27	334;336EE+10 Tage
336		Kabelverlegung Technikgebäude inkl. Installationen	19.8 Tage	25.10.26	01.06.27	336EE+10 Tage;336
337		Datenpunktliste	15 Tage	26.09.27	16.06.27	337;338EE+10
338		**Inbetriebnahme und Probebetrieb**	**85 Tage**	**30.08.27**	**10.02.27**	
339		Inbetriebnahme	20 Tage	16.06.27	13.07.27	339
340		Probebetrieb	60 Tage	14.07.27	06.10.27	341
341		Abnahme	5 Tage	06.10.27	12.10.27	342
342		**Schlussabrechnung**	**55 Tage**	**15.10.27**	**11.01.28**	
343		Verlage der Schlussrechnungen	10 Tage	15.10.27	26.10.27	343
344		Prüfung der Schlussrechnungen	30 Tage	27.10.27	07.12.27	345
345		Schlussstellung	5 Tage	05.01.28	11.01.28	346EA+10 Tag
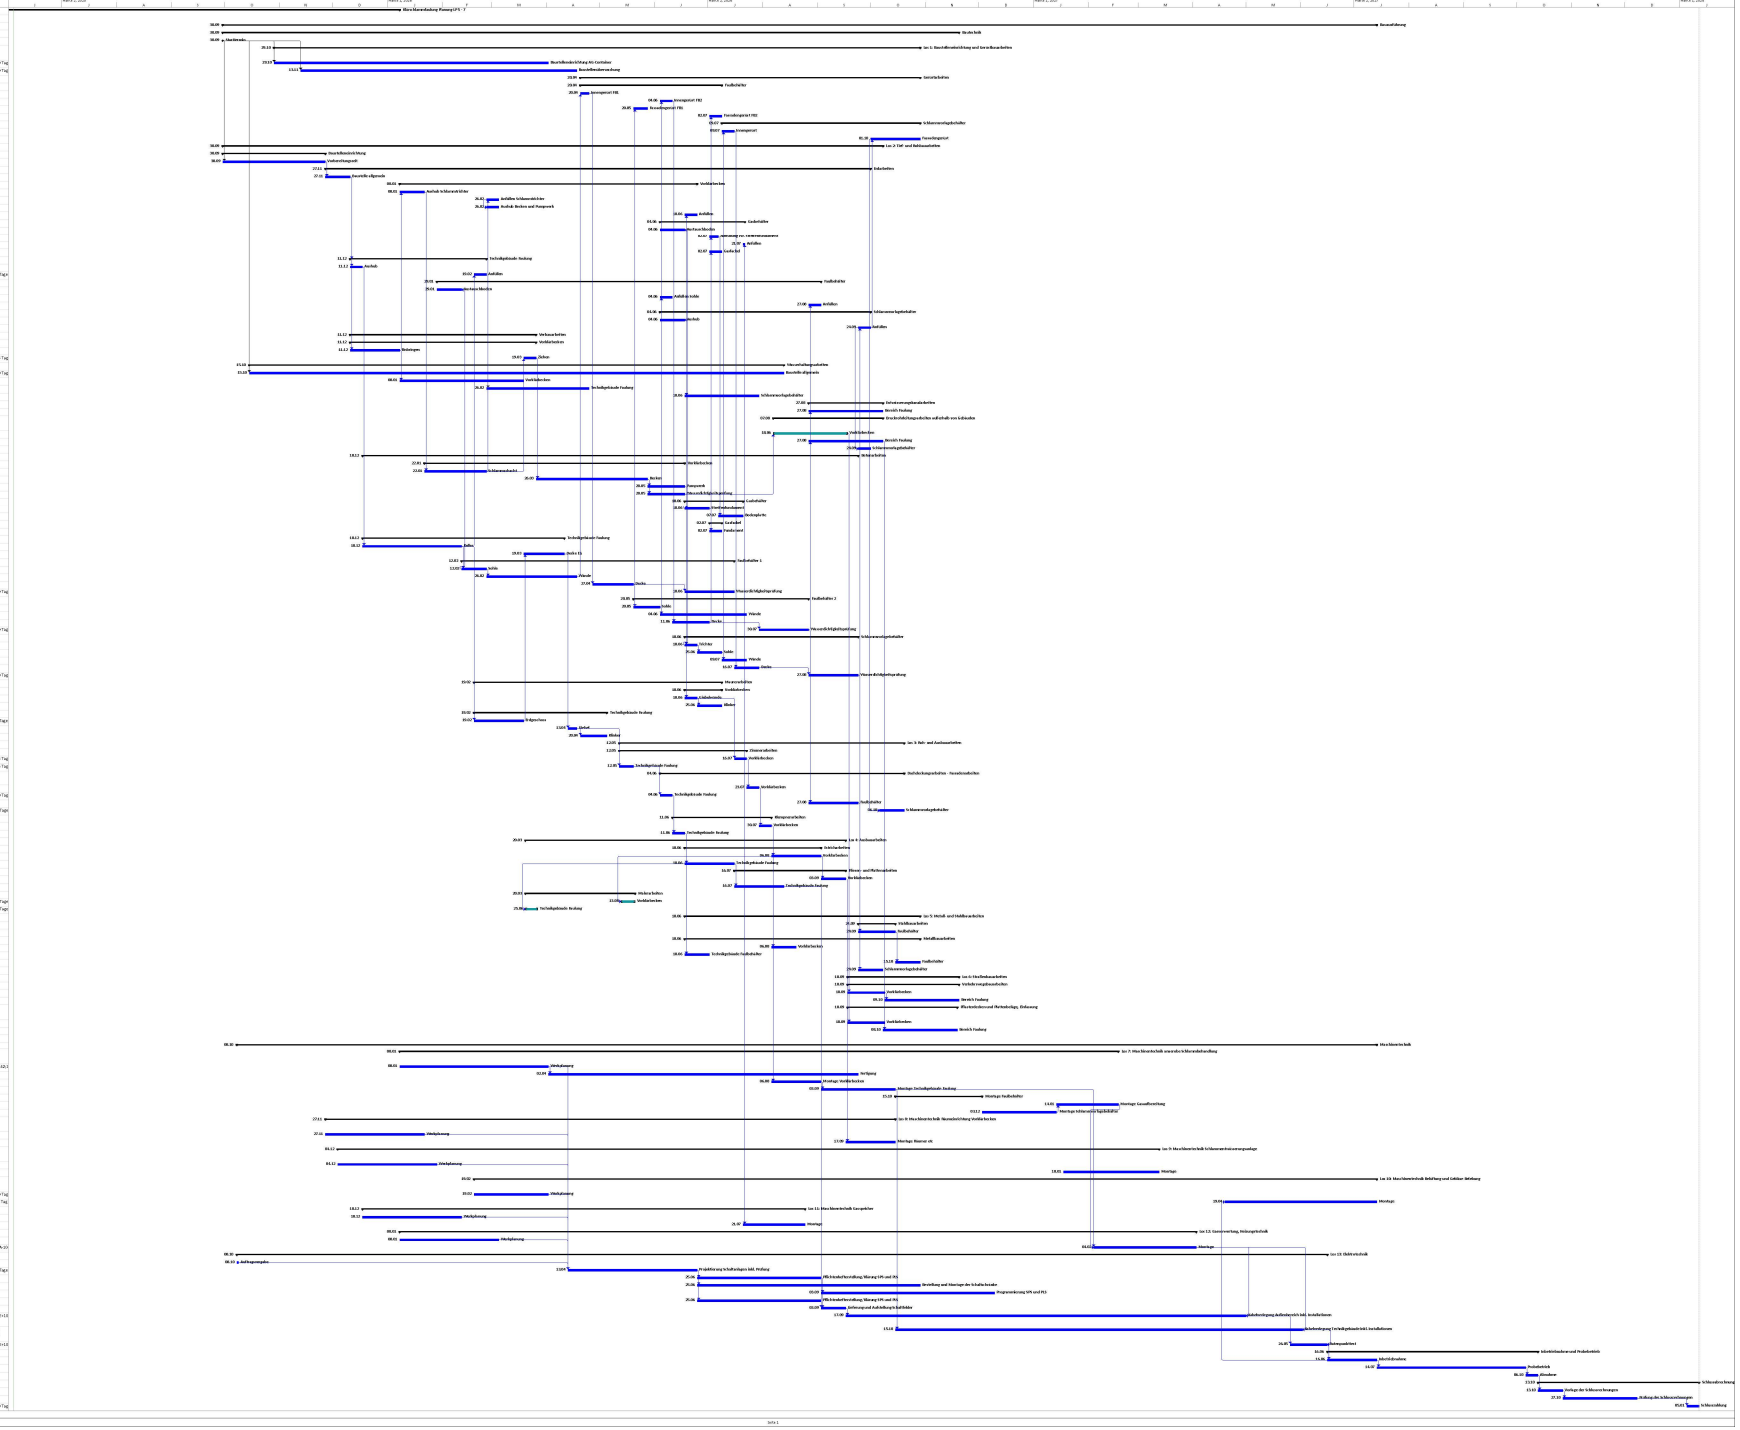
HJ1 2025 | HJ2 | HJ1 2026 | HJ2 | HJ1 2027 | HJ2 | HJ1 2028
