Neubau Grundschule Döbeln Ost
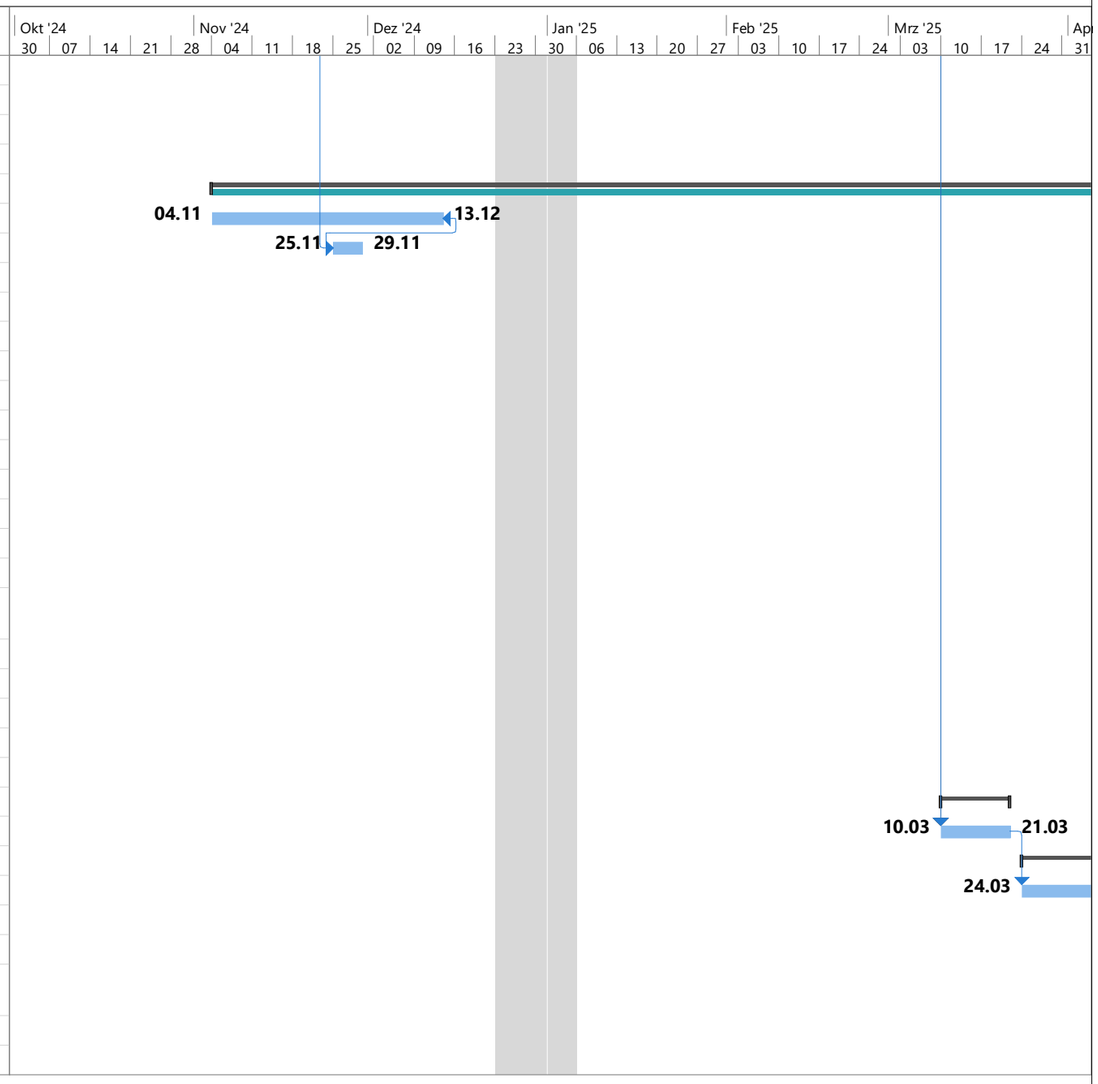
Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
109		**Feinmontage**	**8 Wochen**	**Mon 25.05.26**	**Fre 17.07.26**	121	117EE;72EE;111;112
110		Mängelbeseitigung / IB /Probebetrieb	45 Tage	Fre 12.06.26	Don 13.08.26		
111		**Abnahmen / Fertigstellung Sanitär / Heizung**	**0 Tage**	**Fre 17.07.26**	**Fre 17.07.26**	**109**	127AA
112		**Abnahmen / Fertigstellung Lüftung / GA**	**0 Tage**	**Fre 17.07.26**	**Fre 17.07.26**	**109**	
113		**Aufzug**	**410 Tage**	**Mon 04.11.24**	**Fre 26.06.26**		
114		Werkplanung	6 Wochen	Mon 04.11.24	Fre 13.12.24	115AE	
115		Übergabe Einbauteile	1 Woche	Mon 25.11.24	Fre 29.11.24	15AA	114AE
116		Montage	4 Wochen	Mon 22.09.25	Fre 17.10.25	51AA	
117		Inbetriebnahme	1 Woche	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26	109EE	
118		**Fliesen**	**4 Wochen**	**Mon 16.02.26**	**Fre 13.03.26**	87	
119		**Innentüren**	**16 Wochen**	**Mon 23.02.26**	**Fre 12.06.26**	122EE;87	
120		**Bodenbeläge**	**45 Tage**	**Mon 13.04.26**	**Fre 12.06.26**		
121		EG	6 Wochen	Mon 13.04.26	Fre 22.05.26	124AA+2 Wochen	109
122		OG	6 Wochen	Mon 04.05.26	Fre 12.06.26	125AA+2 Wochen	119EE;126
123		**Maler**	**75 Tage**	**Mon 30.03.26**	**Fre 10.07.26**		
124		EG	4 Wochen	Mon 30.03.26	Fre 24.04.26	63AA+2 Wochen	121AA+2 Wochen
125		OG	4 Wochen	Mon 20.04.26	Fre 15.05.26	69AA+2 Wochen	122AA+2 Wochen
126		Nacharbeiten	4 Wochen	Mon 15.06.26	Fre 10.07.26	122	
127		**Nacharbeiten, Komplettierung, Inbetriebnahmen, Mangelbeseitigung, Abnahmen**	**4 Wochen**	**Mon 20.07.26**	**Fre 14.08.26**	111AA	128EE;12EE
128		**Möblierung, Ausstattung**	**4,8 Wochen**	**Die 30.06.26**	**Fre 31.07.26**	127EE	33AA;42AA
129		**Baureinigung**	**55 Tage**	**Mon 01.06.26**	**Fre 14.08.26**		
130		Vorreinigung Inbetriebnahme	22 Tage	Mon 01.06.26	Die 30.06.26		
131		Feinreinigung Übergabe	15 Tage	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26		
132		**Umzug Schule**	**15 Tage?**	**Mon 27.07.26**	**Fre 14.08.26**		
133		**Erdarbeiten, Rest aus Los Erschließung / Erdarbeiten**	**10 Tage**	**Mon 10.03.25**	**Fre 21.03.25**		
134		Verfüllung Arbeitsraum	2 Wochen	Mon 10.03.25	Fre 21.03.25	18;19	136;25
135		**Außenanlagen**	**410 Tage**	**Mon 24.03.25**	**Fre 30.10.26**		
136		Unterbau Laufbahn und Spielfeld	4 Monate	Mon 24.03.25	Fre 11.07.25	134	137
137		Vorbereitung Ost	3 Monate	Mon 14.07.25	Fre 03.10.25	136	
138		Anschluss an Gebäude West, Nord, Ost	2 Monate	Mon 19.01.26	Fre 13.03.26	27	139AA;140AA
139		Spielfeld, Oberflächen usw. West, Nord, Ost, Innenhof	6 Monate	Mon 02.03.26	Fre 14.08.26	138AA	
140		Außenanlage Süd-West	6 Monate	Mon 19.01.26	Fre 03.07.26	138AA	141EA-4 Wochen
141		Außenanlage Süd-Ost	6 Monate	Mon 18.05.26	Fre 30.10.26	140EA-4 Wochen
