3GS - Sanierung 3.Grundschule in Riesa - 1. Bauabschnitt

Nr.	Vorgang	Los Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressc
1								
2								
3								
4			**Gebäudefreimachung (verantw. BH / Schule)**	**36 Tage**	**Mon 30.06.25**	**Mon 18.08.25**		
5			Auszug Schule	16 Tage	Mon 30.06.25	Mon 21.07.25		
6			Rückbau Containeranlagen	15 Tage	Mon 30.06.25	Fre 18.07.25		
7			Auszug Schule / Beräumung	15 Tage	Mon 30.06.25	Fre 18.07.25		
8			Rückbau Container	21 Tage	Mon 21.07.25	Mon 18.08.25	7	
9			Auszug Schule	15 Tage	Mon 30.06.25	Fre 18.07.25		
10			Rückbau Container	20 Tage	Mon 21.07.25	Fre 15.08.25	9	
11		**GS-00**	**Gebäudefreimachung verantw. BH**	**35 Tage**	**Mon 30.06.25**	**Fre 15.08.25**		
12			Auszug Schule	15 Tage	Mon 30.06.25	Fre 18.07.25		
13			Rückbau Container	20 Tage	Mon 21.07.25	Fre 15.08.25	12	
14		**GS-01**	**Zentrale Baustelleneinrichtung**	**528 Tage**	**Mon 14.07.25**	**Mit 21.07.27**		
15			Büro- und Sanitärcontainer	513 Tage	Mon 14.07.25	Mit 30.06.27		
16			Baustromversorgung Gebäude	441 Tage	Mon 21.07.25	Mon 29.03.27	12EA-3 Tage	
17			Baufeldfreimachung			Mit 21.07.27	15	
18			Bautafel	528 Tage	Mon 14.07.25	Mit 21.07.27		
19		**GS-02**	**Abbruch EG bis 2. OG (nichtstatischer Abbruch)**	**135 Tage**	**Mon 21.07.25**	**Fre 23.01.26**		
26		**GS-03**	**Bauleistungen (Rohbau)**	**1 Tag**	**Mon 30.06.25**	**Mon 30.06.25**		
32			**Abbrucharbeiten im Gebäude (statisch relavanter Abbr.)**	**215 Tage**	**Mon 30.06.25**	**Fre 24.04.26**		
40			**Herstellung Atrien / Zufahrt Innenhöfe I und II**	**93 Tage**	**Mon 28.07.25**	**Mit 03.12.25**		
47			**Herstellung Innenhof I Achse D_H/10-14**	**159 Tage?**	**Mon 30.06.25**	**Don 05.02.26**		
63			**Herstellung Innenhof II Achse D-H/5-9**	**171 Tage**	**Don 21.08.25**	**Don 16.04.26**		
78			**Foyer**	**97 Tage**	**Mon 19.01.26**	**Die 02.06.26**		
94			**Herstellung neuer Geschoßdecken Achse I-K/10-12**	**137 Tage?**	**Mon 30.06.25**	**Die 06.01.26**		
100			**Grundleitungen im Gebäude**	**39 Tage**	**Die 03.03.26**	**Fre 24.04.26**		
105			**Grundleitungen außerhalb Gebäude**					
107			**Abdichtung Außenwände Schule**	**45 Tage**	**Mon 22.09.25**	**Fre 21.11.25**		
114			**Abdichtung Außenwände Foyer**	**11 Tage**	**Mit 06.05.26**	**Mit 20.05.26**		
118			**Maurerarbeiten**	**130 Tage?**	**Mon 01.12.25**	**Fre 29.05.26**		
123		**GS-04**	**Metallbauarbeiten**					
134		**GS-05**	**Schlosserarbeiten**	**72 Tage**	**Mon 05.01.26**	**Die 14.04.26**		
141		**GS-06**	**Fenster und Aussentüren**	**379 Tage**	**Die 06.01.26**	**Fre 18.06.27**		
156		**GS-07**	**Gerüstbau**	**252 Tage**	**Mon 24.11.25**	**Die 10.11.26**		
174		**GFS-0E**	**Dachabdichtungsarbeiten**	**134 Tage**	**Mon 05.01.26**	**Don 09.07.26**		
183		**GS-09**	**Fassade WDVS-Putz-Beschichtung**	**96 Tage**	**Mon 11.05.26**	**Mon 21.09.26**		
188		**GS-10**	**Äußerer Sonnenschutz**	**15 Tage**	**Die 18.08.26**	**Mon 07.09.26**		
190		**GS-11**	**Trockenbau**	**291 Tage**	**Die 12.05.26**	**Die 22.06.27**		
203		**GS-12**	**Innenputz**	**65 Tage**	**Mon 01.06.26**	**Fre 28.08.26**		
208		**GS-13**	**Fliesenleger**	**75 Tage**	**Don 10.09.26**	**Mit 23.12.26**		
213		**GS-14**	**Tischler**	**191 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Mon 28.06.27**		
217		**GS-15**	**Verdunklungsanlagen**	**49 Tage**	**Mon 03.05.27**	**Don 08.07.27**		
220		**GS- 16**	**Malerarbeiten**	**155 Tage**	**Don 10.09.26**	**Mit 14.04.27**		
229		**GS-17**	**Estricharbeiten**	**82 Tage**	**Die 18.08.26**	**Mit 09.12.26**		
236		**GS-18**	**Bodenlager**	**111 Tage**	**Mon 30.11.26**	**Mon 03.05.27**		
244		**GS-19**	**Schließanlage**	**62 Tage?**	**Mon 12.04.27**	**Die 06.07.27**		
248		**GS-20**	**Flucht- und Rettungswegpläne**	**36 Tage**	**Mon 24.05.27**	**Mon 12.07.27**		
251		**GS-21**	**Beschilderung**	**47 Tage?**	**Mon 03.05.27**	**Die 06.07.27**		
255			**Feinreinigung**					
260			**TGA**					
320		**GS-50**	**Möblierung**					
323			**Abnahme / Übergabe an BH**	**65 Tage**	**Mon 24.05.27**	**Mon 23.08.27**		
324			Sachverständigenabnahmen	5 Tage	Mon 07.06.27	Fre 11.06.27		
325			VOB-Abnahmen	20 Tage	Mon 24.05.27	Fre 18.06.27		
326			Restleistungen / Mängelbeseitigungen nach Abnahme	15 Tage	Mon 21.06.27	Fre 09.07.27	325EA-10 Tage	
327			Nutzungsfreigabe / Übergabe an BH	2 Tage	Fre 30.07.27	Mon 02.08.27	326	
328			Umzug Lehrer	14 Tage	Die 03.08.27	Fre 20.08.27	327	
329			Nutzungsbeginn / Schulbeginn 2027	0 Tage	Mon 23.08.27	Mon 23.08.27	328	

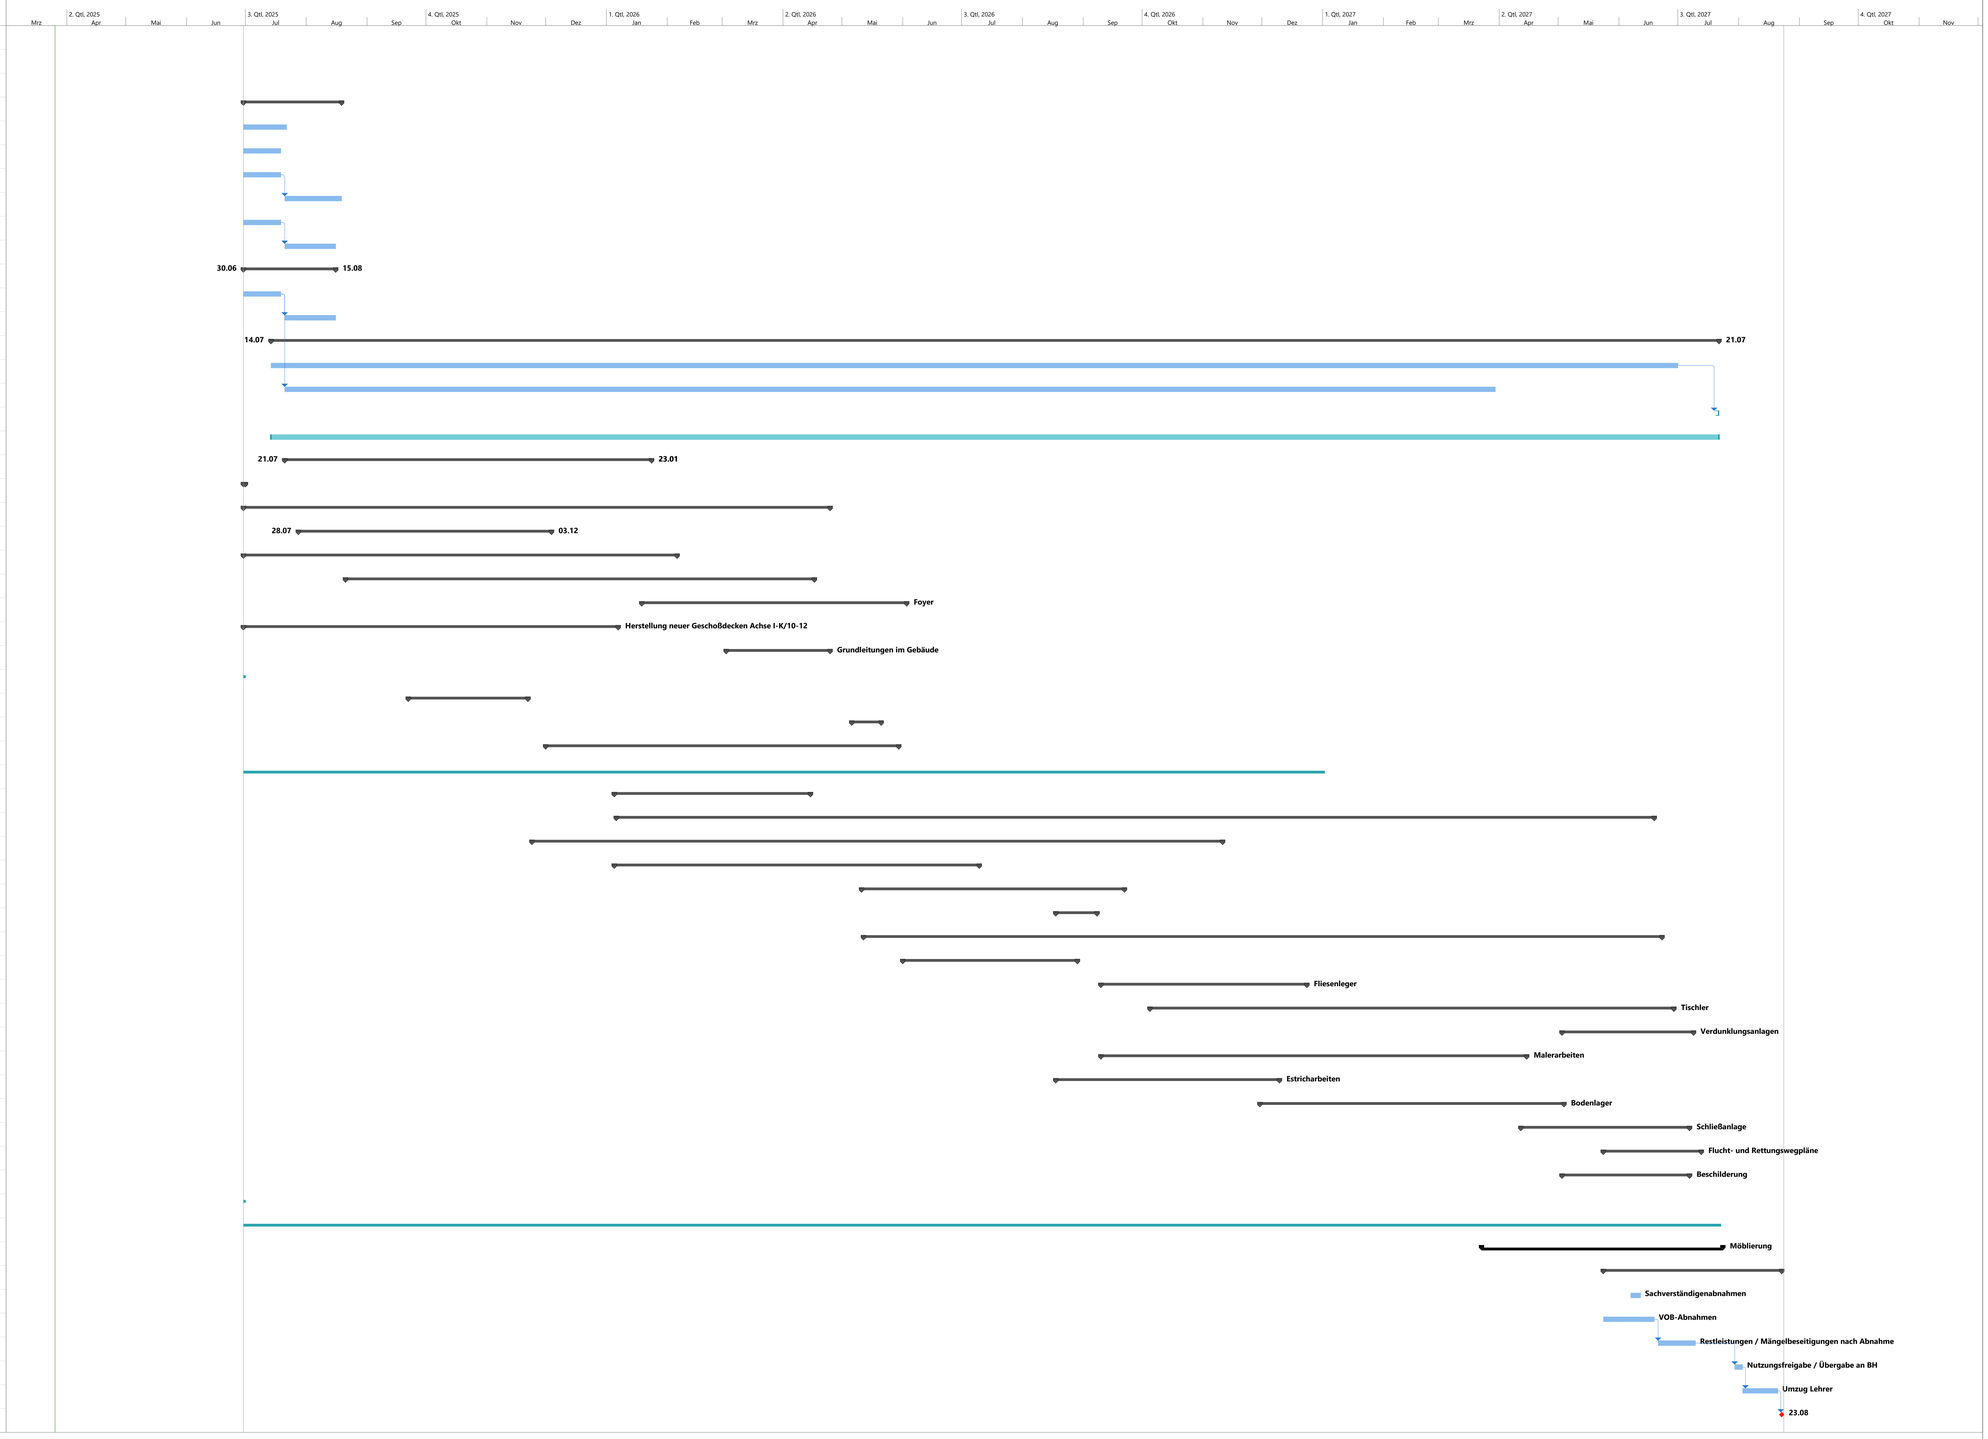

Projekt: 2025-03-26-4107_48_3
Datum: Mit 26.03.25

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit
