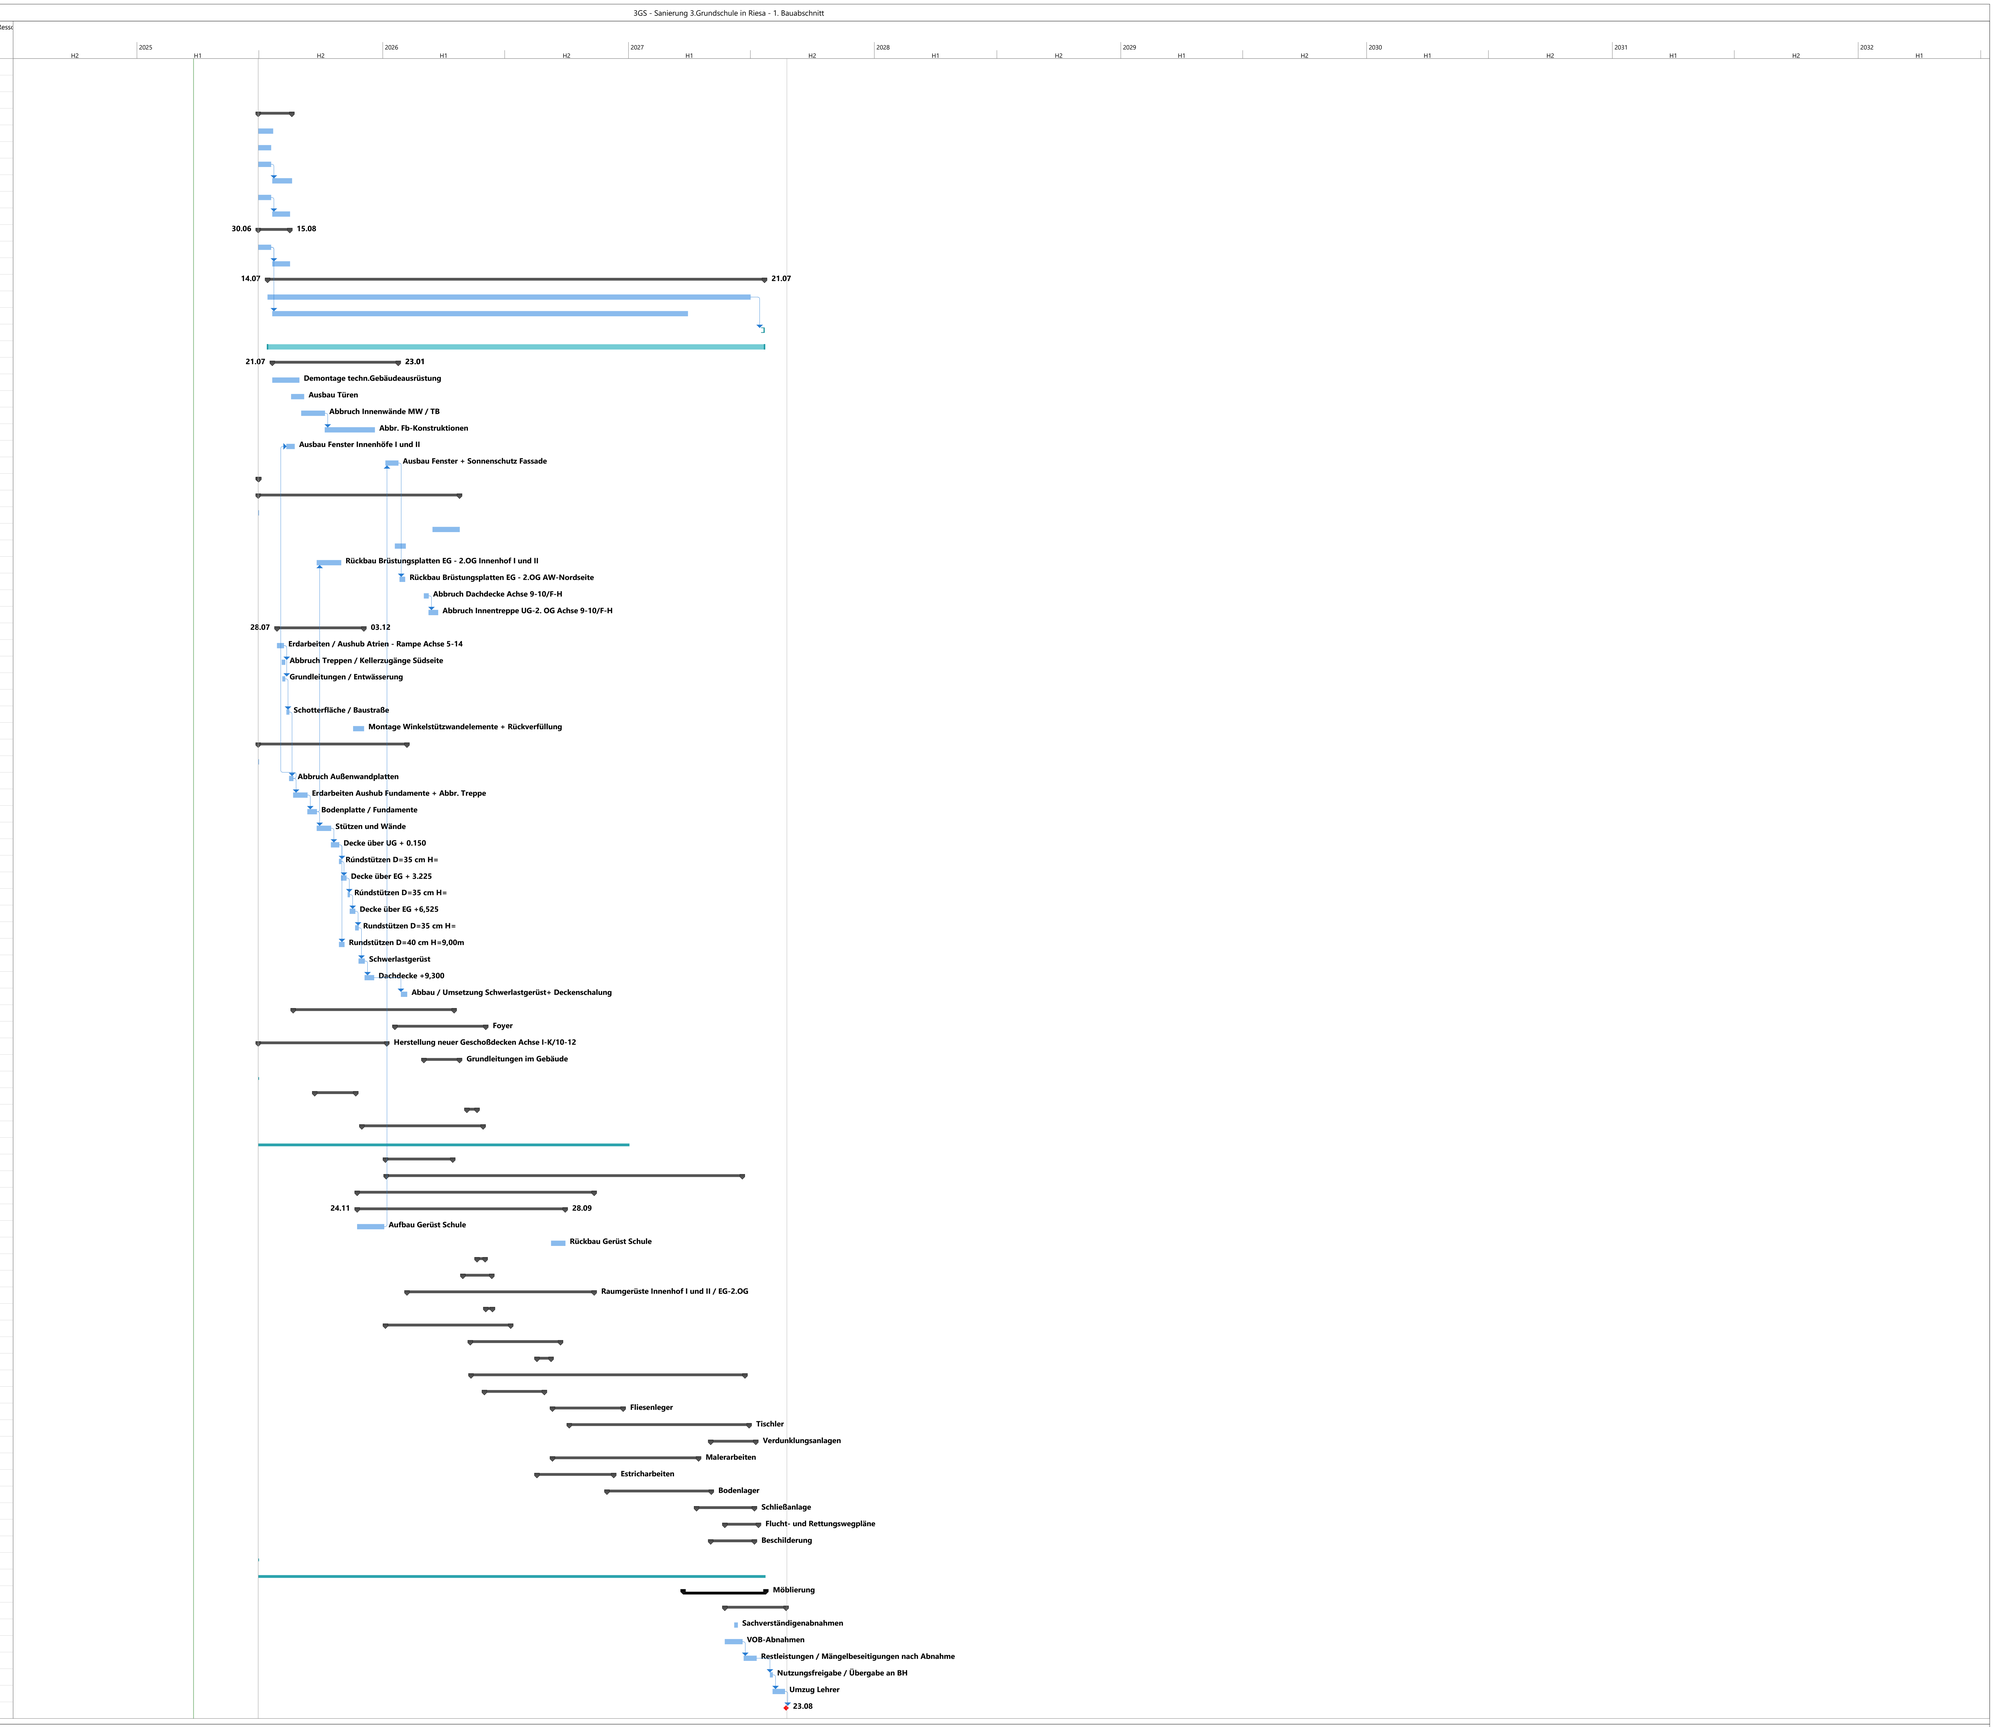Nr.	Vorgang	Los Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressc
1								
2								
3								
4			**Gebäudefreimachung (verantw. BH / Schule)**	**36 Tage**	**Mon 30.06.25**	**Mon 18.08.25**		
5			Auszug Schule	16 Tage	Mon 30.06.25	Mon 21.07.25		
6			Rückbau Containeranlagen	15 Tage	Mon 30.06.25	Fre 18.07.25		
7			Auszug Schule / Beräumung	15 Tage	Mon 30.06.25	Fre 18.07.25		
8			Rückbau Container	21 Tage	Mon 21.07.25	Mon 18.08.25	7	
9			Auszug Schule	15 Tage	Mon 30.06.25	Fre 18.07.25		
10			Rückbau Container	20 Tage	Mon 21.07.25	Fre 15.08.25	9	
11		**GS-00**	**Gebäudefreimachung verantw. BH**	**35 Tage**	**Mon 30.06.25**	**Fre 15.08.25**		
12			Auszug Schule	15 Tage	Mon 30.06.25	Fre 18.07.25		
13			Rückbau Container	20 Tage	Mon 21.07.25	Fre 15.08.25	12	
14		**GS-01**	**Zentrale Baustelleneinrichtung**	**528 Tage**	**Mon 14.07.25**	**Mit 21.07.27**		
15			Büro- und Sanitärcontainer	513 Tage	Mon 14.07.25	Mit 30.06.27		
16			Baustromversorgung Gebäude	441 Tage	Mon 21.07.25	Mon 29.03.27	12EA-3 Tage	
17			Baufeldfreimachung			Mit 21.07.27	15	
18			Bautafel	528 Tage	Mon 14.07.25	Mit 21.07.27		
19		**GS-02**	**Abbruch EG bis 2. OG (nichtstatischer Abbruch)**	**135 Tage**	**Mon 21.07.25**	**Fre 23.01.26**		
20			Demontage techn.Gebäudeausrüstung	30 Tage	Mon 21.07.25	Fre 29.08.25		
21			Ausbau Türen	15 Tage	Mon 18.08.25	Fre 05.09.25		
22			Abbruch Innenwände MW / TB	25 Tage	Die 02.09.25	Mon 06.10.25		
23			Abbr. Fb-Konstruktionen	54 Tage	Die 07.10.25	Fre 19.12.25	22	
24			Ausbau Fenster Innenhöfe I und II	10 Tage	Mon 11.08.25	Fre 22.08.25	49EA-10 Tage	
25			Ausbau Fenster + Sonnenschutz Fassade	15 Tage	Mon 05.01.26	Fre 23.01.26	158	
26		**GS-03**	**Bauleistungen (Rohbau)**	**1 Tag**	**Mon 30.06.25**	**Mon 30.06.25**		
32			**Abbrucharbeiten im Gebäude (statisch relavanter Abbr.)**	**215 Tage**	**Mon 30.06.25**	**Fre 24.04.26**		
33			Erdarbeiten Aushub Atrien	1 Tag	Mon 30.06.25	Mon 30.06.25		
34			Wanddurchbrüche UG - 2. OG	30 Tage	Mon 16.03.26	Fre 24.04.26		
35			Abbruch tragenden IW R.1.30 und 2.15	12 Tage	Mon 19.01.26	Die 03.02.26		
36			Rückbau Brüstungsplatten EG - 2.OG Innenhof I und II	26 Tage	Don 25.09.25	Don 30.10.25	51	
37			Rückbau Brüstungsplatten EG - 2.OG AW-Nordseite	6 Tage	Mon 26.01.26	Mon 02.02.26	25	
38			Abbruch Dachdecke Achse 9-10/F-H	5 Tage	Die 03.03.26	Mon 09.03.26	76	
39			Abbruch Innentreppe UG-2. OG Achse 9-10/F-H	10 Tage	Die 10.03.26	Mon 23.03.26	38	
40			**Herstellung Atrien / Zufahrt Innenhöfe I und II**	**93 Tage**	**Mon 28.07.25**	**Mit 03.12.25**		
41			Erdarbeiten / Aushub Atrien - Rampe Achse 5-14	8 Tage	Mon 28.07.25	Mit 06.08.25		
42			Abbruch Treppen / Kellerzugänge Südseite	5 Tage	Mon 04.08.25	Fre 08.08.25	41EA-3 Tage	
43			Grundleitungen / Entwässerung	4 Tage	Die 05.08.25	Fre 08.08.25	41EA-2 Tage	
44			Offene Wasserhaltung					
45			Schotterfläche / Baustraße	4 Tage	Mon 11.08.25	Don 14.08.25	43	
46			Montage Winkelstützwandelemente + Rückverfüllung	12 Tage	Die 18.11.25	Mit 03.12.25	112	
47			**Herstellung Innenhof I Achse D_H/10-14**	**159 Tage?**	**Mon 30.06.25**	**Don 05.02.26**		
48			Abbruch Außenwandplatten Achse D-E/10-14	1 Tag	Mon 30.06.25	Mon 30.06.25		
49			Abbruch Außenwandplatten	4 Tage	Fre 15.08.25	Mit 20.08.25	45	
50			Erdarbeiten Aushub Fundamente + Abbr. Treppe	15 Tage	Don 21.08.25	Mit 10.09.25	49	
51			Bodenplatte / Fundamente	10 Tage	Don 11.09.25	Mit 24.09.25	50	
52			Stützen und Wände	15 Tage	Don 25.09.25	Mit 15.10.25	51	
53			Decke über UG + 0.150	8 Tage	Don 16.10.25	Mon 27.10.25	52	
54			Ründstützen D=35 cm H=	3 Tage	Die 28.10.25	Don 30.10.25	53	
55			Decke über EG + 3.225	6 Tage?	Fre 31.10.25	Fre 07.11.25	54	
56			Ründstützen D=35 cm H=	3 Tage	Mon 10.11.25	Mit 12.11.25	55	
57			Decke über EG +6,525	6 Tage	Don 13.11.25	Don 20.11.25	56	
58			Rundstützen D=35 cm H=	3 Tage	Fre 21.11.25	Die 25.11.25	57	
59			Rundstützen D=40 cm H=9,00m	6 Tage	Die 28.10.25	Die 04.11.25	53	
60			Schwerlastgerüst	7 Tage	Mit 26.11.25	Don 04.12.25	58	
61			Dachdecke +9,300	10 Tage	Fre 05.12.25	Don 18.12.25	60	
62			Abbau / Umsetzung Schwerlastgerüst+ Deckenschalung	7 Tage	Mit 28.01.26	Don 05.02.26	61EA+28 Tage	
63			**Herstellung Innenhof II Achse D-H/5-9**	**171 Tage**	**Don 21.08.25**	**Don 16.04.26**		
78			**Foyer**	**97 Tage**	**Mon 19.01.26**	**Die 02.06.26**		
94			**Herstellung neuer Geschoßdecken Achse I-K/10-12**	**137 Tage?**	**Mon 30.06.25**	**Die 06.01.26**		
100			**Grundleitungen im Gebäude**	**39 Tage**	**Die 03.03.26**	**Fre 24.04.26**		
105			**Grundleitungen außerhalb Gebäude**					
107			**Abdichtung Außenwände Schule**	**45 Tage**	**Mon 22.09.25**	**Fre 21.11.25**		
114			**Abdichtung Außenwände Foyer**	**11 Tage**	**Mit 06.05.26**	**Mit 20.05.26**		
118			**Maurerarbeiten**	**130 Tage?**	**Mon 01.12.25**	**Fre 29.05.26**		
123		**GS-04**	**Metallbauarbeiten**					
134		**GS-05**	**Schlosserarbeiten**	**72 Tage**	**Mon 05.01.26**	**Die 14.04.26**		
141		**GS-06**	**Fenster und Aussentüren**	**379 Tage**	**Die 06.01.26**	**Fre 18.06.27**		
156		**GS-07**	**Gerüstbau**	**252 Tage**	**Mon 24.11.25**	**Die 10.11.26**		
157			**Fassadengerüste Schule**	**221 Tage**	**Mon 24.11.25**	**Mon 28.09.26**		
158			Aufbau Gerüst Schule	30 Tage	Mon 24.11.25	Fre 02.01.26	113	
159			Rückbau Gerüst Schule	15 Tage	Die 08.09.26	Mon 28.09.26	189	
160			**Fassadengerüst Foyer**	**8 Tage**	**Don 21.05.26**	**Mon 01.06.26**		
163			**Fassadengerüst Foyer Dachdecke**	**31 Tage**	**Don 30.04.26**	**Don 11.06.26**	**92**	
166			**Raumgerüste Innenhof I und II / EG-2.OG**	**198 Tage**	**Fre 06.02.26**	**Die 10.11.26**		
171			**Raumgerüst Foyer**	**8 Tage**	**Mit 03.06.26**	**Fre 12.06.26**		
174		**GFS-0E**	**Dachabdichtungsarbeiten**	**134 Tage**	**Mon 05.01.26**	**Don 09.07.26**		
183		**GS-09**	**Fassade WDVS-Putz-Beschichtung**	**96 Tage**	**Mon 11.05.26**	**Mon 21.09.26**		
188		**GS-10**	**Äußerer Sonnenschutz**	**15 Tage**	**Die 18.08.26**	**Mon 07.09.26**		
190		**GS-11**	**Trockenbau**	**291 Tage**	**Die 12.05.26**	**Die 22.06.27**		
203		**GS-12**	**Innenputz**	**65 Tage**	**Mon 01.06.26**	**Fre 28.08.26**		
208		**GS-13**	**Fliesenleger**	**75 Tage**	**Don 10.09.26**	**Mit 23.12.26**		
213		**GS-14**	**Tischler**	**191 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Mon 28.06.27**		
217		**GS-15**	**Verdunklungsanlagen**	**49 Tage**	**Mon 03.05.27**	**Don 08.07.27**		
220		**GS- 16**	**Malerarbeiten**	**155 Tage**	**Don 10.09.26**	**Mit 14.04.27**		
229		**GS-17**	**Estricharbeiten**	**82 Tage**	**Die 18.08.26**	**Mit 09.12.26**		
236		**GS-18**	**Bodenlager**	**111 Tage**	**Mon 30.11.26**	**Mon 03.05.27**		
244		**GS-19**	**Schließanlage**	**62 Tage?**	**Mon 12.04.27**	**Die 06.07.27**		
248		**GS-20**	**Flucht- und Rettungswegpläne**	**36 Tage**	**Mon 24.05.27**	**Mon 12.07.27**		
251		**GS-21**	**Beschilderung**	**47 Tage?**	**Mon 03.05.27**	**Die 06.07.27**		
255			**Feinreinigung**					
260			**TGA**					
320		**GS-S0**	**Möblierung**					
323			**Abnahme / Übergabe an BH**	**65 Tage**	**Mon 24.05.27**	**Mon 23.08.27**		
324			Sachverständigenabnahmen	5 Tage	Mon 07.06.27	Fre 11.06.27		
325			VOB-Abnahmen	20 Tage	Mon 24.05.27	Fre 18.06.27		
326			Restleistungen / Mängelbeseitigungen nach Abnahme	15 Tage	Mon 21.06.27	Fre 09.07.27	325EA-10 Tage	
327			Nutzungsfreigabe / Übergabe an BH	2 Tage	Fre 30.07.27	Mon 02.08.27	326	
328			Umzug Lehrer	14 Tage	Die 03.08.27	Fre 20.08.27	327	
329			Nutzungsbeginn / Schulbeginn 2027	0 Tage	Mon 23.08.27	Mon 23.08.27	328
