Rahmenterminplan KiTa
Stand: Fre 14.03.25

Neubau KiTa St. Cosmas und Damian

Rahmenterminplan 01

Wolters Partner Architekten GmbH
mit
DÖPPER . MEDDING
Projektingenieure.Baubetrieb GmbH
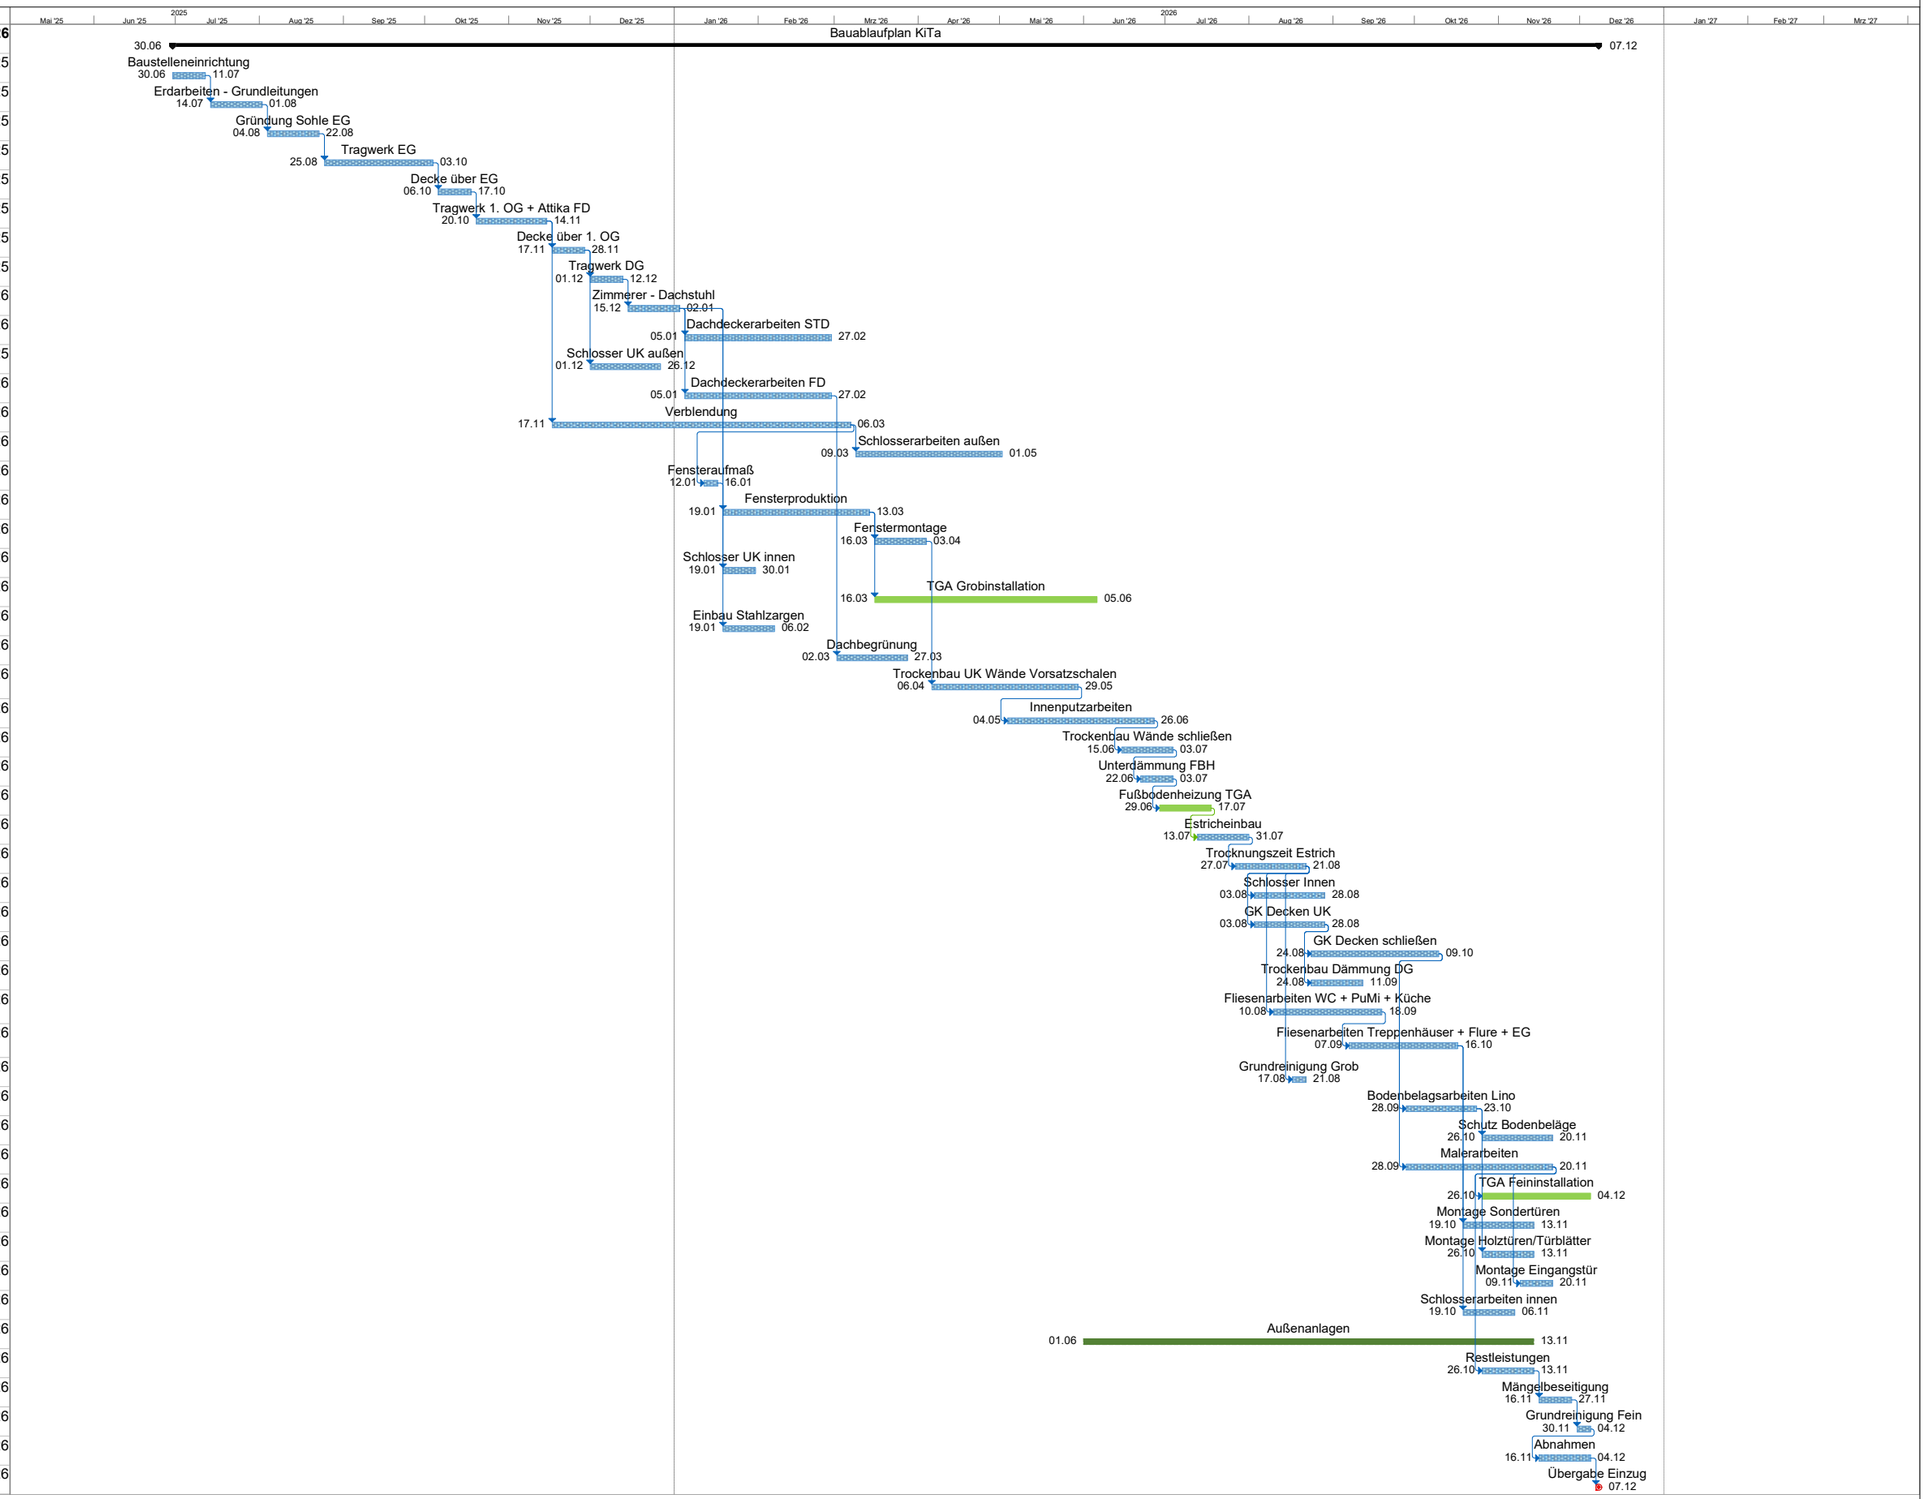
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Bauablaufplan KiTa**	**376 Tage**	**Mon 30.06.25**	**Mon 07.12.26**
2	Baustelleneinrichtung	10 Tage	Mon 30.06.25	Fre 11.07.25
3	Erdarbeiten - Grundleitungen	15 Tage	Mon 14.07.25	Fre 01.08.25
4	Gründung Sohle EG	15 Tage	Mon 04.08.25	Fre 22.08.25
5	Tragwerk EG	30 Tage	Mon 25.08.25	Fre 03.10.25
6	Decke über EG	10 Tage	Mon 06.10.25	Fre 17.10.25
7	Tragwerk 1. OG + Attika FD	20 Tage	Mon 20.10.25	Fre 14.11.25
8	Decke über 1. OG	10 Tage	Mon 17.11.25	Fre 28.11.25
9	Tragwerk DG	10 Tage	Mon 01.12.25	Fre 12.12.25
10	Zimmerer - Dachstuhl	15 Tage	Mon 15.12.25	Fre 02.01.26
11	Dachdeckerarbeiten STD	40 Tage	Mon 05.01.26	Fre 27.02.26
12	Schlosser UK außen	20 Tage	Mon 01.12.25	Fre 26.12.25
13	Dachdeckerarbeiten FD	40 Tage	Mon 05.01.26	Fre 27.02.26
14	Verblendung	80 Tage	Mon 17.11.25	Fre 06.03.26
15	Schlosserarbeiten außen	40 Tage	Mon 09.03.26	Fre 01.05.26
16	Fensteraufmaß	5 Tage	Mon 12.01.26	Fre 16.01.26
17	Fensterproduktion	40 Tage	Mon 19.01.26	Fre 13.03.26
18	Fenstermontage	15 Tage	Mon 16.03.26	Fre 03.04.26
19	Schlosser UK innen	10 Tage	Mon 19.01.26	Fre 30.01.26
20	TGA Grobinstallation	60 Tage	Mon 16.03.26	Fre 05.06.26
21	Einbau Stahlzargen	15 Tage	Mon 19.01.26	Fre 06.02.26
22	Dachbegrünung	20 Tage	Mon 02.03.26	Fre 27.03.26
23	Trockenbau UK Wände Vorsatzschalen	40 Tage	Mon 06.04.26	Fre 29.05.26
24	Innenputzarbeiten	40 Tage	Mon 04.05.26	Fre 26.06.26
25	Trockenbau Wände schließen	15 Tage	Mon 15.06.26	Fre 03.07.26
26	Unterdämmung FBH	10 Tage	Mon 22.06.26	Fre 03.07.26
27	Fußbodenheizung TGA	15 Tage	Mon 29.06.26	Fre 17.07.26
28	Estricheinbau	15 Tage	Mon 13.07.26	Fre 31.07.26
29	Trocknungszeit Estrich	20 Tage	Mon 27.07.26	Fre 21.08.26
30	Schlosser Innen	20 Tage	Mon 03.08.26	Fre 28.08.26
31	GK Decken UK	20 Tage	Mon 03.08.26	Fre 28.08.26
32	GK Decken schließen	35 Tage	Mon 24.08.26	Fre 09.10.26
33	Trockenbau Dämmung DG	15 Tage	Mon 24.08.26	Fre 11.09.26
34	Fliesenarbeiten WC + PuMi + Küche	30 Tage	Mon 10.08.26	Fre 18.09.26
35	Fliesenarbeiten Treppenhäuser + Flure + EG	30 Tage	Mon 07.09.26	Fre 16.10.26
36	Grundreinigung Grob	5 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26
37	Bodenbelagsarbeiten Lino	20 Tage	Mon 28.09.26	Fre 23.10.26
38	Schutz Bodenbeläge	20 Tage	Mon 26.10.26	Fre 20.11.26
39	Malerarbeiten	40 Tage	Mon 28.09.26	Fre 20.11.26
40	TGA Feininstallation	30 Tage	Mon 26.10.26	Fre 04.12.26
41	Montage Sondertüren	20 Tage	Mon 19.10.26	Fre 13.11.26
42	Montage Holztüren/Türblätter	15 Tage	Mon 26.10.26	Fre 13.11.26
43	Montage Eingangstür	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26
44	Schlosserarbeiten innen	15 Tage	Mon 19.10.26	Fre 06.11.26
45	Außenanlagen	120 Tage	Mon 01.06.26	Fre 13.11.26
46	Restleistungen	15 Tage	Mon 26.10.26	Fre 13.11.26
47	Mängelbeseitigung	10 Tage	Mon 16.11.26	Fre 27.11.26
48	Grundreinigung Fein	5 Tage	Mon 30.11.26	Fre 04.12.26
49	Abnahmen	15 Tage	Mon 16.11.26	Fre 04.12.26
50	Übergabe Einzug	1 Tag	Mon 07.12.26	Mon 07.12.26
