O+M Architekten GmbH BDA

Neubau Grundschule Döbeln Ost

O+M ARCHITEKTEN
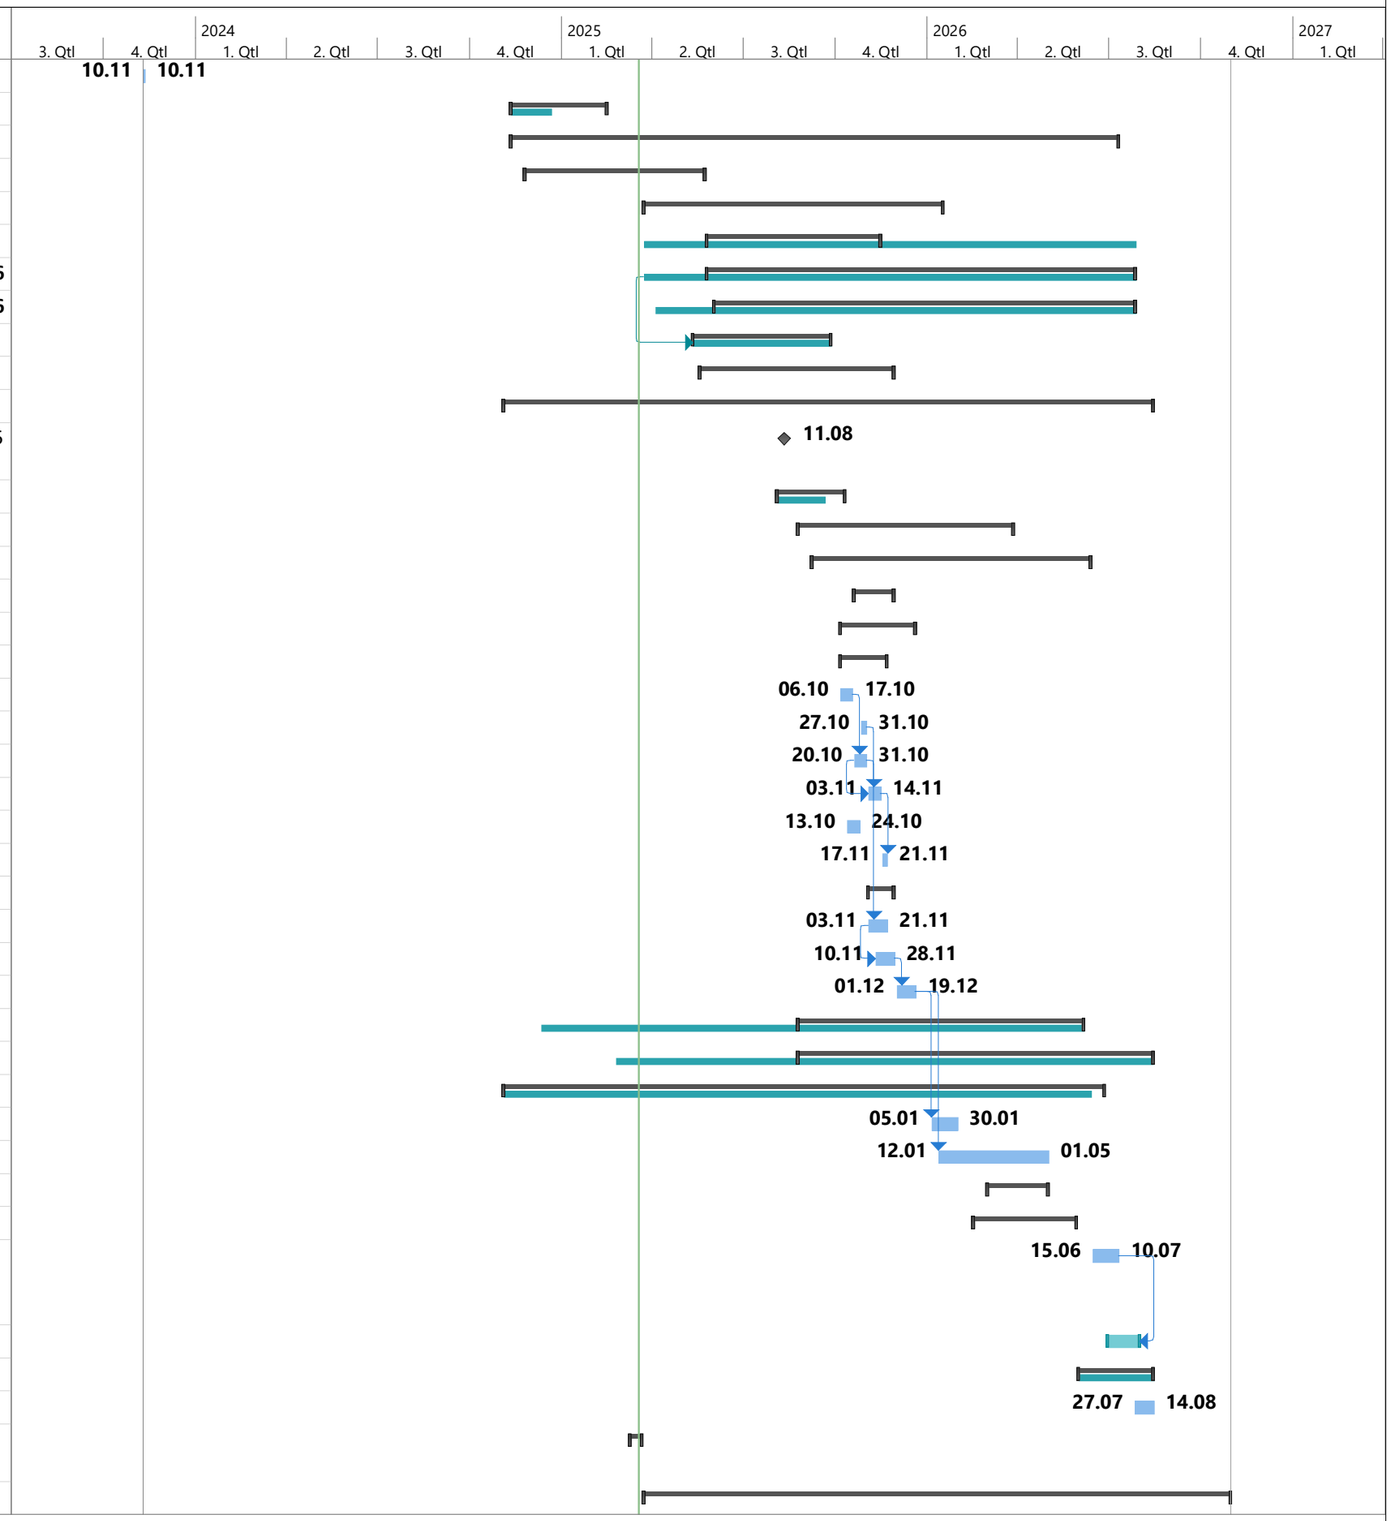
Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		Vorbereitende Arbeiten	1 Tag?	Fre 10.11.23	Fre 10.11.23
2		**Erdarbeiten Baugrube**	**60 Tage**	**Mon 11.11.24**	**Fre 14.02.25**
8		**Baustelleneinrichtung allgemein**	**415 Tage**	**Mon 11.11.24**	**Fre 10.07.26**
13		**Rohbau**	**120 Tage**	**Mon 25.11.24**	**Fre 23.05.25**
25		**Gerüstbau**	**205 Tage**	**Mon 24.03.25**	**Fre 16.01.26**
28		**Gebäudehülle**	**125 Tage**	**Mon 26.05.25**	**Fre 14.11.25**
29		**Fenster Kunststoff**	**296 Tage**	**Mon 26.05.25**	**Mon 27.07.26**
34		**Alu-Glasfassaden EG+OG + Sonnenschutz**	**291 Tage**	**Mon 02.06.25**	**Mon 27.07.26**
38		**Dach**	**100 Tage**	**Mon 12.05.25**	**Fre 26.09.25**
41		**Fassade**	**140 Tage**	**Mon 19.05.25**	**Fre 28.11.25**
45		**Innenausbau**	**445 Tage?**	**Mon 04.11.24**	**Fre 14.08.26**
46		Beginn, Haus wetterdicht, Zwischenabdichtung Dach, nach Sommerferien	0 Tage	Mon 11.08.25	Mon 11.08.25
47		**Innenputz**	**50 Tage**	**Mon 04.08.25**	**Fre 10.10.25**
52		**Trockenbau**	**145 Tage**	**Mon 25.08.25**	**Fre 27.03.26**
65		**Mobile Trennwand**	**190 Tage**	**Mon 08.09.25**	**Fre 12.06.26**
68		**Schlosser**	**30 Tage**	**Mon 20.10.25**	**Fre 28.11.25**
71		**Estricheinbau**	**55 Tage**	**Mon 06.10.25**	**Fre 19.12.25**
72		**EG**	**35 Tage**	**Mon 06.10.25**	**Fre 21.11.25**
73		Grunddämmung Räume Fb-Heizung	2 Wochen	Mon 06.10.25	Fre 17.10.25
74		Estricheinbau Heizestrich	1 Woche	Mon 27.10.25	Fre 31.10.25
75		Dämmung Räume ohne Fb-Heizung	2 Wochen	Mon 20.10.25	Fre 31.10.25
76		Estrich Räume ohne Heizestrich	2 Wochen	Mon 03.11.25	Fre 14.11.25
77		Trockenestrichplatten	2 Wochen	Mon 13.10.25	Fre 24.10.25
78		Spachteln Trockenestrich	1 Woche	Mon 17.11.25	Fre 21.11.25
79		**OG**	**20 Tage**	**Mon 03.11.25**	**Fre 28.11.25**
80		Dämmung	3 Wochen	Mon 03.11.25	Fre 21.11.25
81		Estricheinbau	3 Wochen	Mon 10.11.25	Fre 28.11.25
82		Restarbeiten, Trocknung	3 Wochen	Mon 01.12.25	Fre 19.12.25
83		**Elektro**	**195 Tage?**	**Mon 25.08.25**	**Fre 05.06.26**
92		**TGA**	**245 Tage?**	**Mon 25.08.25**	**Fre 14.08.26**
111		**Aufzug**	**410 Tage**	**Mon 04.11.24**	**Fre 26.06.26**
116		**Fliesen**	**4 Wochen**	**Mon 05.01.26**	**Fre 30.01.26**
117		**Innentüren**	**16 Wochen**	**Mon 12.01.26**	**Fre 01.05.26**
118		**Bodenbeläge**	**45 Tage**	**Mon 02.03.26**	**Fre 01.05.26**
121		**Maler**	**75 Tage**	**Mon 16.02.26**	**Fre 29.05.26**
125		**Nacharbeiten, Komplettierung, Inbetriebnahmen, Mangelbeseitigung, Abnahmen**	**4 Wochen**	**Mon 15.06.26**	**Fre 10.07.26**
126		**Möblierung, Ausstattung**	**4,8 Wochen**	**Die 30.06.26**	**Fre 31.07.26**
127		**Baureinigung**	**55 Tage**	**Mon 01.06.26**	**Fre 14.08.26**
130		**Umzug Schule**	**15 Tage?**	**Mon 27.07.26**	**Fre 14.08.26**
131		**Erdarbeiten, Rest aus Los Erschließung / Erdarbeiten**	**10 Tage**	**Mon 10.03.25**	**Fre 21.03.25**
133		**Außenanlagen**	**410 Tage**	**Mon 24.03.25**	**Fre 30.10.26**
