Projektnummer: 362

Zeitplan

STH-RH, Braunschweig Stöckheim-Süd VORABZUG RAHMENTERMINPLAN

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer
5	**Bauzeiten**	473at	Mo, 16.12.24	Mo, 02.11.26	Voraussetzung: Baugenehmigung ist ohne Planän-derungserfordernis erteilt, ein evt. Winterausfall ist hier nicht berücksichtigt, minimaler Puffer!
5.1	**Erweiterte Rohbau-, Erd-, Kanalarbeiten**	155at	Mo, 16.12.24	Mi, 30.07.25	ggf. Winterausfall
5.1.1	BE, Roden	5at	Mo, 16.12.24	Fr, 20.12.24	AN Erweiteter Rohbau
5.1.2	Abschieben	2at	Mo, 13.01.25	Di, 14.01.25	AN Erweiteter Rohbau
5.1.3	Baugrube, Wasserhaltung, Abnahme Planunm	10at	Mo, 20.01.25	Fr, 31.01.25	AN Erweiteter Rohbau
5.1.4	Kanalarbeiten	13at	Di, 18.02.25	Do, 06.03.25	AN Erweiteter Rohbau
5.1.5	Einbau Gründungspolster, Abnahme Polster	30at	Mo, 03.02.25	Fr, 14.03.25	AN Erweiteter Rohbau
5.1.6	Unterfahrt, Bodenkanal, Pumpensumpf, Streifenfundamente	15at	Mo, 24.02.25	Fr, 14.03.25	AN Erweiteter Rohbau
5.1.7	Sohle, Wände EG	33at	Mo, 17.03.25	Mo, 05.05.25	AN Erweiteter Rohbau
5.1.8	Decke EG, Wände 1. OG	26at	Mo, 28.04.25	Mi, 04.06.25	AN Erweiteter Rohbau
5.1.9	Decke 1. OG, Wände 2. OG	26at	Mi, 28.05.25	Fr, 04.07.25	AN Erweiteter Rohbau
5.1.10	Decke 2. OG, Wände DG (Staffel)	21at	Mo, 30.06.25	Mo, 28.07.25	AN Erweiteter Rohbau
5.1.11	Dach	9at	Fr, 18.07.25	Mi, 30.07.25	AN Erweiteter Rohbau
5.2	Gerüstbauarbeiten	113at	Mo, 16.06.25	Fr, 21.11.25	AN Gerüstarbeiten
5.3	Aufzugsanlagen	152at	Mo, 06.01.25	Di, 12.08.25	
5.3.1	Erstellen Werkplanung Aufzugsanlagen	28at	Mo, 06.01.25	Mi, 12.02.25	AN Aufzug
5.3.2	Prüfung/ Freigabe Werkplanung Aufzugsanlagen	20at	Do, 13.02.25	Mi, 12.03.25	iwp
5.3.3	Lieferzeit Aufzugsanlage	82at	Do, 13.03.25	Fr, 11.07.25	AN Aufzug
5.3.4	frühestens: Montage/ Inbetriebnahme Aufzugsanlage	12at	Mo, 14.07.25	Di, 29.07.25	AN Aufzug
5.3.5	TÜV Aufzugsanlage	5at	Mi, 30.07.25	Di, 05.08.25	AN Aufzug, TÜV, iwp
5.3.6	Abnahme Aufzugsanlage	5at	Mi, 06.08.25	Di, 12.08.25	AN Aufzug, iwp, AG
5.4	Dacharbeiten	64at	Mo, 07.07.25	Do, 02.10.25	ggf. Winterausfall
5.5	WDVS	108at	Mo, 14.07.25	Fr, 12.12.25	
5.6	Fenster / Aussentüren	188at	Mo, 21.07.25	Fr, 17.04.26	
5.7	Metallbau / Schlosser	93at	Mo, 04.08.25	Fr, 12.12.25	
5.8	Ausbauarbeiten TB Rohinstallation	58at	Mo, 11.08.25	Do, 30.10.25	
5.9	TGA Rohinstallation	58at	Mo, 11.08.25	Do, 30.10.25	
5.10	Ausbauarbeiten Putz	35at	Mo, 03.11.25	Fr, 19.12.25	
5.11	Ausbauarbeiten Estrich	37at	Mo, 22.12.25	Fr, 13.02.26	
5.12	Ausbauarbeiten TB fertig	43at	Mo, 16.02.26	Fr, 17.04.26	
5.13	TGA Fertigmontagen	43at	Mo, 16.02.26	Fr, 17.04.26	
5.14	Ausbauarbeiten Fliesen, Türen, Maler, Bodenbeläge	55at	Mo, 30.03.26	Fr, 19.06.26	
5.15	TGA Endmontagen	23at	Mo, 04.05.26	Fr, 05.06.26	
5.16	Fertigstellung Hochbau (Prognose)	1at	Fr, 19.06.26	Fr, 19.06.26	
5.17	Freianlagen	237at	Mo, 24.11.25	Fr, 30.10.26	
5.18	Mängelbeseitigung	128at	Mi, 25.02.26	Fr, 28.08.26	
5.19	Zuarbeit Unterlagen für "Bestätigung nach Durchführung"	50at	Mo, 22.06.26	Fr, 28.08.26	KPN
5.20	Zuarbeit Unterlagen für "Bestätigung nach Durchführung"	50at	Mo, 22.06.26	Fr, 28.08.26	FPL
5.21	**"P U F F E R...P U F F E R...P U F F E R"**	50at	Mo, 22.06.26	Fr, 28.08.26	
5.22	"Bestätigung nach Durchführung" (Förderung)	10at	Mo, 31.08.26	Fr, 11.09.26	Hr. Bode
5.23	Bearbeitungszeit AG für Förderantrag	11at	Mo, 14.09.26	Mo, 28.09.26	AG
5.24	Hochladen Förderunterlagen	1at	Mo, 28.09.26	Mo, 28.09.26	AG
5.25	Bezug geplant (Annahme KPN)	1at	Mo, 02.11.26	Mo, 02.11.26	AG

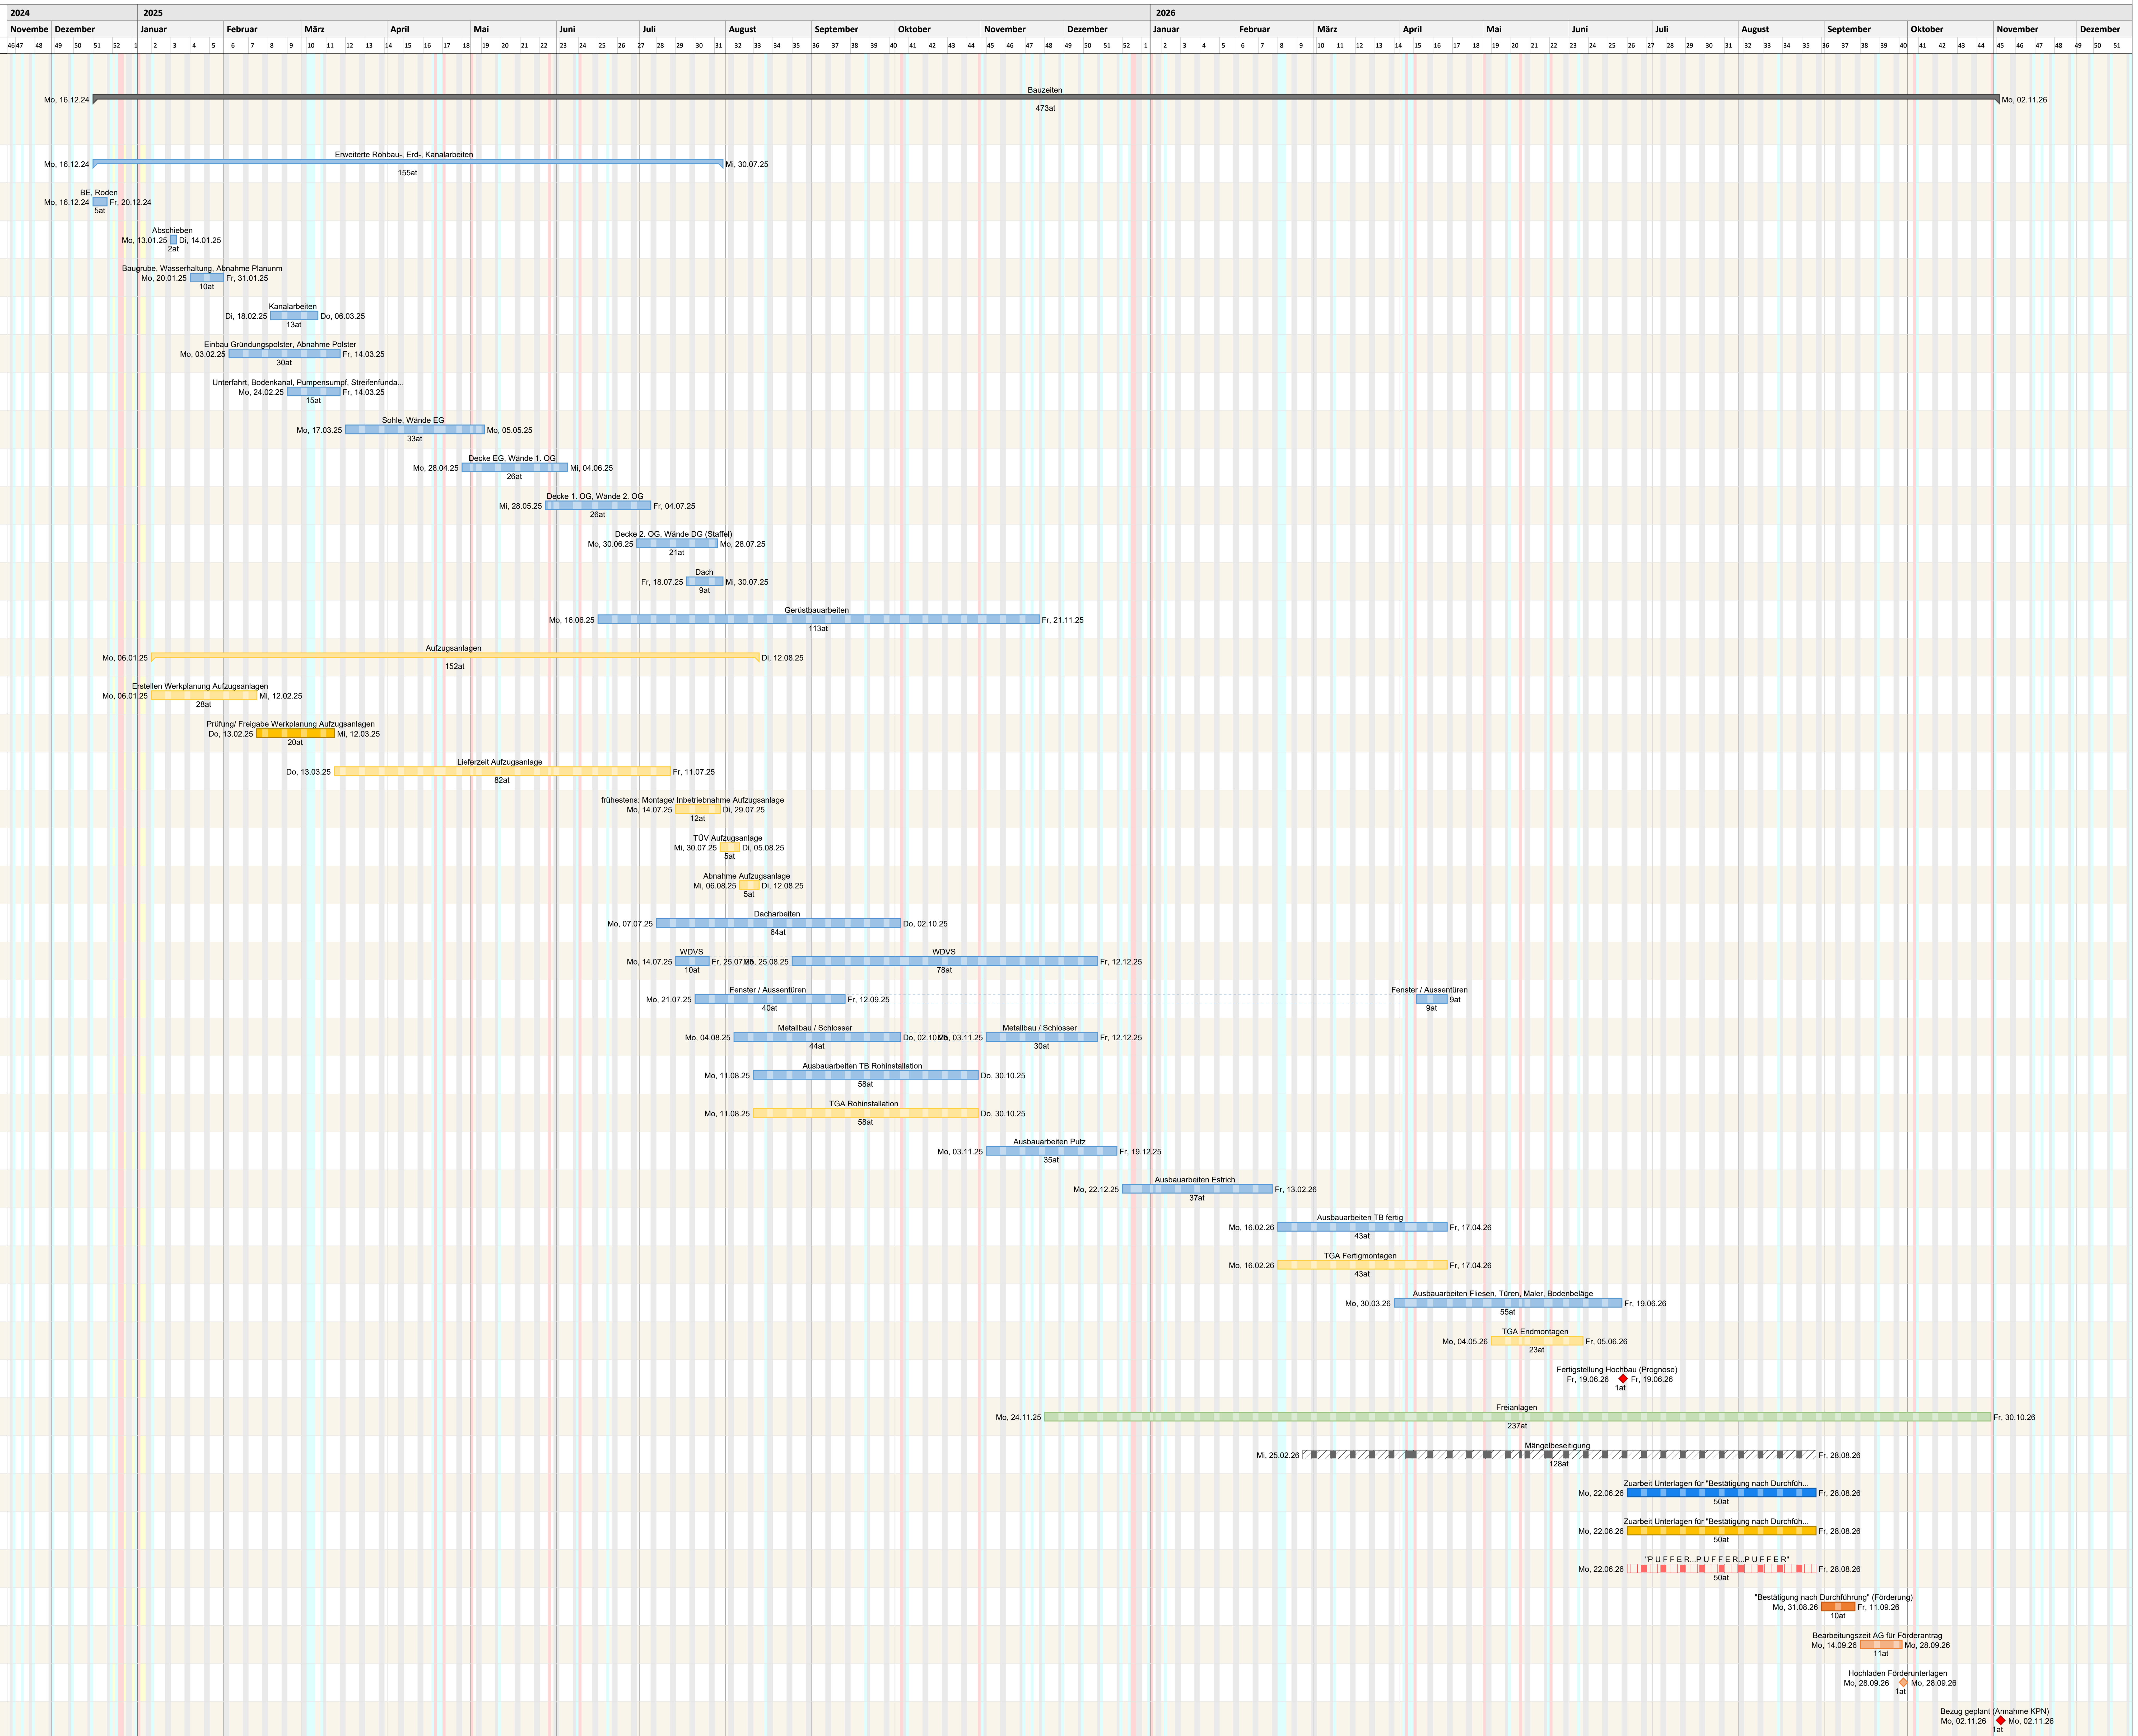

Projektzeitrahmen von Mo, 17.04.23 bis Do, 31.12.26
Kalender: Niedersachsen (eingebettet)
Druckdatum: 14.04.2025 11:53
Filter:
Bearbeiter: KPN

erstellt mit pro-Plan 2024 (24.0.0.2) Serien Nr.: PPL24-F262818524C4 Lizenz für KPN ARCHITEKTEN BDAPLANUNGSGESELLSCHAFT MBH, Braun

Frankfurter Str. 2
Braunschweig
Tel. +49 531 1231250
Fax +49 531 12312525
email@kpn-architekten.de
