Nr.	Vorgangsvorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgängerelemente
1					
2	**Bauherr**	**175 Tage**	**Mo 01.04.24**	**Fr 29.11.24**	
3	Einrichtung Bauamtsg	5 Tage	Mo 29.07.24	Fr 02.08.24	Einrichtung Bauamtsg
4	Umzug KiTa Spatzenhaus	10 Tage	Mo 07.10.24	Fr 18.10.24	Umzug KiTa Spatzenh
5					
6	**Behörde**	**65 Tage**	**Mo 05.08.24**	**Fr 01.11.24**	
7	Genehmigungsstreitraum	65 Tage	Mo 05.08.24	Fr 01.11.24	Genehmigungsstreitra
8					
9	**Planung**	**220 Tage**	**Mo 01.04.24**	**Fr 31.01.25**	
10	**Ausführungsplanung Block 1 - Abbruch/Baustellenvorrichtung**	**60 Tage**	**Mo 01.04.24**	**Fr 21.06.24**	
11	Baustellenvorrichtung	60 Tage	Mo 01.04.24	Fr 21.06.24	Planung Baustellenvor
12	Abbruchplanung	20 Tage	Mo 13.05.24	Fr 07.06.24	Abbruchplanung
13					
14	**Ausführungsplanung Block 2 - Rohbau, Äußere Hülle**	**55 Tage**	**Mo 29.07.24**	**Fr 11.10.24**	
15	Architekt: Ausführungsplanung Rohbau	55 Tage	Mo 29.07.24	Fr 11.10.24	Architekt: Ausführungsplanung Rohbau
16	Tragwerk: Ausführungsplanung	50 Tage	Mo 29.07.24	Fr 04.10.24	Tragwerk: Ausführungsplanung
17					
18	**Ausführungsplanung Block 3 - Innenputz/Innenbäume u. Fensterbänke/Trockenbau/TGA**	**55 Tage**	**So 18.08.24**	**Do 31.10.24**	
19	Ausführungsplanung	55 Tage	So 18.08.24	Do 31.10.24	Ausführungsplanung
20					
21	**Ausführungsplanung Block 4 - Aufbau/Freianlage**	**65 Tage**	**Mo 04.11.24**	**Fr 31.01.25**	
22	Ausführungsplanung	65 Tage	Mo 04.11.24	Fr 31.01.25	Ausführungsplanung
23					
24	**Vergabe**	**240 Tage**	**Mo 24.06.24**	**Fr 23.05.25**	
25	**Vergabeblock 1 - Abbruch/Baustellenvorrichtung**	**65 Tage**	**Mo 24.06.24**	**Fr 20.09.24**	
26	Erstellung LVs	20 Tage	Mo 24.06.24	Fr 19.07.24	Erstellung LVs
27	Veröffentlichung Bauherr	1 Tag	Fr 26.07.24	Fr 26.07.24	Veröffentlichung Bau
28	Angebotsphase	14 Tage	Mo 29.07.24	Do 15.08.24	Angebotsphase
29	Submission	1 Tag	Fr 16.08.24	Fr 16.08.24	Submission
30	Auswertung/Bietergespräche	10 Tage	Mo 19.08.24	Fr 30.08.24	Auswertung/Bietergs
31	Vergabevorschlag	2 Tage	Mo 02.09.24	Di 03.09.24	Vergabevorschlag
32	Beschluss Stadtrat	5 Tage	Do 12.09.24	Do 12.09.24	Beschluss Stadtrat
33	Beauftragung	5 Tage	Mo 16.09.24	Fr 20.09.24	Beauftragung
34					
35	**Vergabeblock 2 Rohbau/Äußere Hülle**	**75 Tage**	**Mo 09.09.24**	**Fr 20.12.24**	
36	Erstellung LVs	20 Tage	Mo 09.09.24	Do 17.10.24	Erstellung LVs
37	Veröffentlichung Bauherr	1 Tag	Fr 18.10.24	Fr 18.10.24	37 Veröffentlichung Bau
38	Angebotsphase	19 Tage	Mo 21.10.24	Do 14.11.24	38 Angebotsphase
39	Submission	1 Tag	Fr 15.11.24	Fr 15.11.24	39 Submission
40	Auswertung/Bietergespräche	10 Tage	Mo 18.11.24	Fr 29.11.24	Auswertung/Bietergs
41	Vergabevorschlag	2 Tage	Mo 02.12.24	Di 03.12.24	Vergabevorschlag
42	Beschluss Stadtrat	5 Tage	Do 12.12.24	Do 12.12.24	Beschluss Stadtrat
43	Beauftragung	5 Tage	Mo 16.12.24	Fr 20.12.24	Beauftragung
44					
45	**Vergabeblock 3 - Innenputz/Trockenbau/Gussasphalt**	**132 Tage**	**Mo 21.10.24**	**Di 22.04.25**	
46	Erstellung LVs	89 Tage	Mo 21.10.24	Do 20.02.25	Erstellung LVs
47	Veröffentlichung Bauherr	1 Tag	Fr 21.02.25	Fr 21.02.25	47 Veröffentlichung Bau
48	Angebotsphase	19 Tage	Mo 24.02.25	Do 20.03.25	Angebotsphase
49	Submission	1 Tag	Di 18.03.25	Di 18.03.25	Submission
50	Auswertung/Bietergespräche	61 Tage	Mo 06.01.25	Mo 31.03.25	Auswertung/Bietergs
51	Vergabevorschlag	2 Tage	Di 01.04.25	Mi 02.04.25	Vergabevorschlag
52	Beschluss Stadtrat	5 Tage	Di 22.04.25	Di 22.04.25	Beschluss Stadtrat
53	Beauftragung	5 Tage	Di 22.04.25	Di 22.04.25	Beauftragung
54					
55	**Vergabeblock 4 - Aufbau/Freianlage**	**80 Tage**	**Mo 03.02.25**	**Fr 23.05.25**	
56	Erstellung LVs	34 Tage	Mo 03.02.25	Do 20.03.25	Erstellung LVs
57	Veröffentlichung Bauherr	1 Tag	Fr 21.03.25	Fr 21.03.25	Veröffentlichung Bau
58	Angebotsphase	18 Tage	Mo 24.03.25	Mi 16.04.25	Angebotsphase
59	Submission	1 Tag	Do 17.04.25	Do 17.04.25	Submission
60	Auswertung/Bietergespräche	10 Tage	Mo 21.04.25	Fr 02.05.25	Auswertung/Bietergs
61	Vergabevorschlag	2 Tage	Mo 05.05.25	Di 06.05.25	Vergabevorschlag
62	Beschluss Stadtrat	1 Tag	Do 15.05.25	Do 15.05.25	Beschluss Stadtrat
63	Beauftragung	5 Tage	Mo 19.05.25	Fr 23.05.25	Beauftragung
64					
65	**Bauausführung Vorgabeblock 1**	**310 Tage**	**Mo 21.10.24**	**Fr 26.12.25**	
66	**Los 01 - Baustellenvorrichtung**	**310 Tage**	**Mo 21.10.24**	**Fr 26.12.25**	
67	Einrichten der Baustelle	10 Tage	Mo 21.10.24	Fr 01.11.24	Einrichten der Baust
68	Beräumen der Baustelle	10 Tage	Mo 15.12.25	Fr 26.12.25	Beräumen der Baust
69					
70	**Los 02 - Abbruch- und Entsorgungsmaßnahmen**	**65 Tage**	**Mo 04.11.24**	**Fr 31.01.25**	
71	Abbruch- und Entsorgungsmaßnahmen	65 Tage	Mo 04.11.24	Fr 31.01.25	Abbruch- und Entsor
72					
73	**Los 30 - Freischaltung/Abbruch/Entsorgung HLS**	**75 Tage**	**Mo 21.10.24**	**Fr 31.01.25**	
74	Freischaltung	5 Tage	Mo 21.10.24	Fr 25.10.24	Freischaltung
75	Bauwasseranlage	5 Tage	Mo 28.10.24	Fr 01.11.24	Bauwasseranlage
76	Abbruch und Entsorgung	65 Tage	Mo 04.11.24	Fr 31.01.25	Abbruch und Entsorg
77					
78	**Los 32 - Freischaltung/Abbruch/Entsorgung ES**	**75 Tage**	**Mo 21.10.24**	**Fr 31.01.25**	
79	Freischaltung	5 Tage	Mo 21.10.24	Fr 25.10.24	Freischaltung
80	Abbruch und Entsorgung	65 Tage	Mo 04.11.24	Fr 31.01.25	Abbruch und Entsorg
81					
82	**Los 34 - Baustrom**	**5 Tage**	**Mo 21.10.24**	**Fr 25.10.24**	
83	Errichtung Baustromanlage	5 Tage	Mo 21.10.24	Fr 25.10.24	Errichtung Baustrom
84					
85	**Bauausführung Vorgabeblock 2**	**250 Tage**	**Mo 06.01.25**	**Fr 19.12.25**	
86	**Los 03 - Erdarbeiten, Mauer-, Beton- und Entwässerungsarbeiten**	**120 Tage**	**Mo 06.01.25**	**Fr 20.06.25**	
87	Werk- und Montageplanung Stahlbau	15 Tage	Mo 06.01.25	Fr 24.01.25	Werk- und Montagep
88	Vorfertigung Stahlbau	30 Tage	Mo 27.01.25	Fr 07.03.25	88 Vorfertigung Stahlbau
89	Herstellung Wendeturbrücke außen	30 Tage	Mo 17.02.25	Fr 28.03.25	Herstellung Wendeturbr
90	Neuherstellung Treppe	30 Tage	Mo 17.02.25	Fr 28.03.25	Neuherstellung Treppe
91	Herstellung Wendeturbrücke innen	20 Tage	Mo 17.03.25	Fr 11.04.25	Herstellung Wendeturbr
92	Wand- und Deckendurchbrüche schließen	20 Tage	Mo 17.03.25	Fr 11.04.25	Wand- und Deckendurchbrüche
93					
94	Gründungsarbeiten KG	20 Tage	Mo 27.01.25	Fr 21.02.25	Gründungsarbeiten K
95					
96	**Los 04 - Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten**	**140 Tage**	**Mo 06.01.25**	**Fr 10.07.25**	
97	Werkplanung Solisicherungsanlage	15 Tage	Mo 06.01.25	Fr 24.01.25	Werkplanung Solisic
98	Sanierung Dach Treppenhaus	5 Tage	Mo 20.01.25	Fr 24.01.25	Sanierung Dach Trep
99	Dachendeckung Dachfläche 6 Teil A	15 Tage	Mo 14.04.25	Fr 02.05.25	Dachendeckung DFL
100	Dachendeckung Dachfläche 7 Teil A	20 Tage	Mo 05.05.25	Fr 30.05.25	Dachendeckung DFL
101	Dachendeckung Dachfläche 5 Teil B	20 Tage	Mo 02.06.25	Fr 27.06.25	Dachendeckung DFL
102	Dachendeckung Verbinder DFL 2,3	5 Tage	Mo 30.06.25	Fr 04.07.25	Dachendeckung Ver
103	Dachendeckung DFL 5, 9 Teil A	10 Tage	Mo 07.07.25	Fr 18.07.25	Dachendeckung DFL
104					
105	**Los 05 - Gerüstbauarbeiten**	**130 Tage**	**Mo 06.01.25**	**Fr 04.07.25**	
106	Aufbau Fassadengerüst	10 Tage	Mo 06.01.25	Fr 17.01.25	Aufbau Fassadengerü
107	Gebrauchsüberlassung	110 Tage	Mo 20.01.25	Fr 20.06.25	Gebrauchsüberlassu
108	Rückbau Fassadengerüst	10 Tage	Mo 23.06.25	Fr 04.07.25	Rückbau Fassadenge
109					
110	**Los 06 - Fenster- und Türanlage**	**250 Tage**	**Mo 06.01.25**	**Fr 19.12.25**	
111	Werkplanung Fenster- und Türelemente	15 Tage	Mo 06.01.25	Fr 24.01.25	Werkplanung Fenster
112	Prüfung und Freigabe	10 Tage	Mo 27.01.25	Fr 07.02.25	Prüfung und Freigabe
113	Herstellung Außenfenster und -türelemente	35 Tage	Mo 10.02.25	Fr 28.03.25	112 Herstellung Außenfenster und -türelemente
114	Einbau Außenfenster und -türen	5 Tage	Mo 31.03.25	Fr 04.04.25	Einbau Außenfenster
115	Herstellung Innentürelemente	35 Tage	Mo 24.02.25	Fr 11.04.25	Herstellung Innentür
116	Fensterbankanschlüsse herstellen	20 Tage	Mo 07.04.25	Fr 02.05.25	Fensterbankanschlüs
117	Einbau Innentürelemente	10 Tage	Mo 05.05.25	Fr 16.05.25	Einbau Innentürelem
118	Komplettierung und Inbetriebnahme	10 Tage	Mo 08.12.25	Fr 19.12.25	Komplettierung und
119					
120	**Los 08 - Sonnenschutz**	**110 Tage**	**Mo 06.01.25**	**Fr 06.06.25**	
121	Werkplanung Sonnenschutz	15 Tage	Mo 06.01.25	Fr 24.01.25	Werkplanung Sonne
122	Prüfung und Freigabe	10 Tage	Mo 27.01.25	Fr 07.02.25	Prüfung und Freigabe
123	Herstellung Sonnenschutz	20 Tage	Mo 10.02.25	Fr 28.03.25	Herstellung Sonnenso
124	Montage UK Sonnenschutz	20 Tage	Mo 28.04.25	Fr 23.05.25	Montage UK Sonnen
125	Komplettierung Sonnenschutz	10 Tage	Mo 26.05.25	Fr 06.06.25	Komplettierung Sonn
126					
127	**Los 09 - WDVS**	**165 Tage**	**Mo 06.01.25**	**Fr 22.08.25**	
128	Abbruch WDVS Aufzugsschacht	5 Tage	Mo 06.01.25	Fr 10.01.25	Abbruch WDVS Aufz
129	Reinigung Fassadenflächen	5 Tage	Mo 13.01.25	Fr 17.01.25	Reinigung Fassaden
130	WDVS Ergänzungen an Dachflächen	20 Tage	Mo 20.01.25	Fr 14.02.25	WDVS Ergänzungen a
131	WDVS Aufzugsschacht	20 Tage	Mo 17.02.25	Fr 14.03.25	WDVS Aufzugsschacht
132	Malerarbeiten Fassaden	60 Tage	Mo 17.03.25	Fr 06.06.25	Malerarbeiten Fassa
133	Sockelbearbeitung	30 Tage	Mo 14.07.25	Fr 22.08.25	Sockelbearbeitung
134					
135	**Bauausführung Vorgabeblock 3**	**180 Tage**	**Mo 10.03.25**	**Fr 14.11.25**	
136	**Los 07 - Innenputz**	**50 Tage**	**Mo 28.04.25**	**Fr 04.07.25**	
137	Innenputzarbeiten	15 Tage	Mo 28.04.25	Fr 16.05.25	Innenputzarbeiten
138	Nachputzarbeiten	10 Tage	Mo 23.06.25	Fr 04.07.25	Nachputzarbeiten
139					
140	**Los 10 - Innentüren, Fensterbänke, Einschutz**	**180 Tage**	**Mo 10.03.25**	**Fr 14.11.25**	
141	Türliste zur Freigabe	5 Tage	Mo 10.03.25	Fr 14.03.25	Türliste zur Freigabe
142	Prüfung und Freigabe	5 Tage	Mo 17.03.25	Fr 21.03.25	141 Prüfung und Freigabe
143	Bestellung Innentüren	40 Tage	Mo 24.03.25	Fr 16.05.25	142 Bestellung Innent
144	Aufmaß Fensterbänke	5 Tage	Mo 10.03.25	Fr 14.03.25	Aufmaß Fensterbänk
145	Herstellung Fensterbänke	25 Tage	Mo 17.03.25	Fr 18.04.25	144 Herstellung Fensterb
146	Einbau Fensterbänke	15 Tage	Mo 21.04.25	Fr 09.05.25	145 Einbau Fensterbänke
147	Einbau Zargen Innentüren	10 Tage	Mo 19.05.25	Fr 30.05.25	143 Einbau Zargen Innent
148	Komplettierung und Inbetriebnahme	10 Tage	Mo 03.11.25	Fr 14.11.25	Komplettierung und
149					
150	**Los 11 - Trockenbauarbeiten**	**70 Tage**	**Mo 05.05.25**	**Fr 12.09.25**	
151	Brandschutzbekleidung Träger und Stützen	20 Tage	Mo 05.05.25	Fr 30.05.25	Brandschutzbekleidu Träger und Stützen
152	UK Wände und Vorsatzschalen	10 Tage	Mo 12.05.25	Fr 23.05.25	UK Wände und Vorsa
153	Verschluss Wände und Vorsatzschalen	20 Tage	Mo 26.05.25	Fr 20.06.25	Verschluss Wände ur
154	Unterkonstruktion Decken	30 Tage	Mo 23.06.25	Fr 31.08.25	Unterkonstruktion D
155	Verschluss Decken	10 Tage	Mo 01.09.25	Fr 12.09.25	Verschluss Decken
156	Verkleidungen	10 Tage	Mo 01.09.25	Fr 12.09.25	Verkleidungen
157					
158	**Bauausführung Vorgabeblock 4**	**165 Tage**	**Mo 09.06.25**	**Fr 23.01.26**	
159	**Los 12 - Gussasphalt**	**30 Tage**	**Mo 09.06.25**	**Fr 18.07.25**	
160	Gussasphalt südlicher Trakt und Verbinder	20 Tage	Mo 09.06.25	Fr 04.07.25	Gussasphalt südlicher Trakt und Verbinder
161	Gussasphalt nördlicher Trakt	10 Tage	Mo 07.07.25	Fr 18.07.25	Gussasphalt nördlich
162					
163	**Los 13 - Bodenbelagarbeiten**	**60 Tage**	**Mo 11.08.25**	**Fr 31.10.25**	
164	Bodenbelag südlicher Trakt und Verbinder	40 Tage	Mo 11.08.25	Fr 03.10.25	Bodenbelag südlicher Trakt und Verbinder
165	Bodenbelag nördlicher Trakt	20 Tage	Mo 06.10.25	Fr 31.10.25	Bodenbelag nördlich
166					
167	**Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**	**60 Tage**	**Mo 11.08.25**	**Fr 31.10.25**	
168	Fliesenlegerarbeiten südlicher Trakt und Verbinder	40 Tage	Mo 11.08.25	Fr 03.10.25	Fliesenlegerarbeiten südlicher Trakt und Verbinder
169	Fliesenlegerarbeiten nördlicher Trakt	20 Tage	Mo 06.10.25	Fr 31.10.25	Fliesenlegerarbeiten
170					
171	**Los 15 - Malerarbeiten**	**70 Tage**	**Mo 30.06.25**	**Fr 03.10.25**	
172	Malerbeiten KG	10 Tage	Mo 30.06.25	Fr 11.07.25	Malerbeiten KG
173	Malerarbeiten südlicher Trakt und Verbinder	40 Tage	Mo 14.07.25	Fr 09.09.25	Malerarbeiten südlicher Trakt und Verbinder
174	Malerarbeiten nördlicher Trakt	20 Tage	Mo 08.09.25	Fr 03.10.25	Malerarbeiten nördl
175					
176	**Los 16 - WC - Trennwände**	**70 Tage**	**Mo 11.08.25**	**Fr 14.11.25**	
177	Werkplanung	10 Tage	Mo 11.08.25	Fr 22.08.25	Werkplanung
178	Prüfung und Freigabe	10 Tage	Mo 25.08.25	Fr 05.09.25	177 Prüfung und Freigabe
179	Herstellung WC-Trennwände	40 Tage	Mo 08.09.25	Fr 31.10.25	Herstellung WC-Trenn
180	Montage WC-Trennwände	10 Tage	Mo 03.11.25	Fr 14.11.25	Montage WC-Trenne
181					
182	**Los 18 - Beschilderung**	**10 Tage**	**Mo 03.11.25**	**Fr 14.11.25**	
183	Montage Beschilderung	10 Tage	Mo 03.11.25	Fr 14.11.25	Montage Beschilderu
184					
185	**Los 19 - Schließanlage**	**70 Tage**	**Mo 11.08.25**	**Fr 14.11.25**	
186	Schließplan zur Abstimmung	10 Tage	Mo 11.08.25	Fr 22.08.25	Schließplan zur Abst
187	Prüfung und Freigabe	10 Tage	Mo 25.08.25	Fr 05.09.25	186 Prüfung und Freigabe
188	Montage Schließzylinder	10 Tage	Mo 03.11.25	Fr 14.11.25	Montage Schließzylin
189					
190	**Los 20 - Möblierung**	**10 Tage**	**Mo 03.11.25**	**Fr 14.11.25**	
191	Montage Handflächentücher	10 Tage	Mo 03.11.25	Fr 14.11.25	Montage Handtuch
192					
193	**Los 21 - Raumdreinigung**	**15 Tage**	**Mo 17.11.25**	**Fr 05.12.25**	
194	Baumdreinigung südlicher Trakt und Verbinder	10 Tage	Mo 17.11.25	Fr 28.11.25	Baumdreinigung südlicher Trakt und Verbinder
195	Baumdreinigung nördlicher Trakt	5 Tage	Mo 01.12.25	Fr 05.12.25	194 Baumdreinigung nö
196					
197	**Los 22 - Metallbauarbeiten**	**40 Tage**	**Mo 14.07.25**	**Fr 05.09.25**	
198	Aufmaß Gitterrostabdeckungen	5 Tage	Mo 14.07.25	Fr 18.07.25	Aufmaß Gitterrostab
199	Montage Gitterrostabdeckungen	20 Tage	Mo 25.08.25	Fr 05.09.25	133 Montage Gitterrosta
200					
201	**Los 23 - Außenanlagen**	**145 Tage**	**Mo 07.07.25**	**Fr 23.01.26**	
202	Einbau Rigole	20 Tage	Mo 07.07.25	Fr 08.08.25	Einbau Rigole
203	Freischachten Sockelbereiche	5 Tage	Mo 07.07.25	Fr 11.07.25	Freischachten Sockel
204	Einebnierung Innenhof	25 Tage	Mo 14.07.25	Fr 15.08.25	Einebnierung Innenh
205	Freianlage südlicher und östlicher Bereich	45 Tage	Mo 21.07.25	Fr 19.09.25	Freianlage nördlicher Teil
206	Freianlage westlicher Bereich	45 Tage	Mo 22.09.25	Fr 21.11.25	205 Freianlage Bereich W
207	Freianlage nördlicher Bereich	45 Tage	Mo 24.11.25	Fr 23.01.26	206 Freianlage südlicher
208					
209	**Los 31 - Heizung/Lüftung/Sanitär**	**160 Tage**	**Mo 07.04.25**	**Fr 14.11.25**	
210	Unterputzinstallation	20 Tage	Mo 07.04.25	Fr 02.05.25	Unterputzinstallation
211	Installationen KG	10 Tage	Mo 05.05.25	Fr 16.05.25	Installationen KG
212	Installationen in Wänden und Vorsatzschalen	10 Tage	Mo 19.05.25	Fr 30.05.25	Installationen in Wänden und
213	Installationen in Decken	20 Tage	Mo 07.07.25	Fr 01.08.25	Installationen in Decken
214	Kompletttierungen und Inbetriebnahmen	10 Tage	Mo 28.10.25	Fr 14.11.25	Kompletttierungen und
215					
216	**Los 33 - Stark- und Schwachstrominstallation**	**205 Tage**	**Mo 07.04.25**	**Fr 16.01.26**	
217	Unterputzinstallation	20 Tage	Mo 07.04.25	Fr 02.05.25	Unterputzinstallation
218	Installationen KG	10 Tage	Mo 05.05.25	Fr 16.05.25	Installationen KG
219	Installation in Wänden und Vorsatzschalen	10 Tage	Mo 19.05.25	Fr 30.05.25	Installation in Wänden und
220	Installationen in Decken	20 Tage	Mo 07.07.25	Fr 01.08.25	Installationen in Decken
221	Kompletttierungen und Inbetriebnahmen	60 Tage	Mo 06.10.25	Fr 26.12.25	Kompletttierungen un
222	Sachverständigenabnahmen	10 Tage	Mo 05.01.26	Fr 16.01.26	Sachverständigenabn
223					
224	**Behördliche Abnahmen**	**190 Tage**	**Mo 12.05.25**	**Fr 30.01.26**	
225	Abnahme Prüfer Brandschutz	10 Tage	Mo 19.01.26	Fr 30.01.26	222 Abnahme Prüfer Bra
226	Abnahme Prüfer Tragwerk	10 Tage	Mo 12.05.25	Fr 23.05.25	Abnahme Prüfer Trag
227	Abnahme Hygiene, GUV, Hygiene	10 Tage	Mo 08.12.25	Fr 19.12.25	Abnahme Hygiene, G
228	Abnahme BDA	10 Tage	Mo 19.01.26	Fr 30.01.26	Abnahme BDA

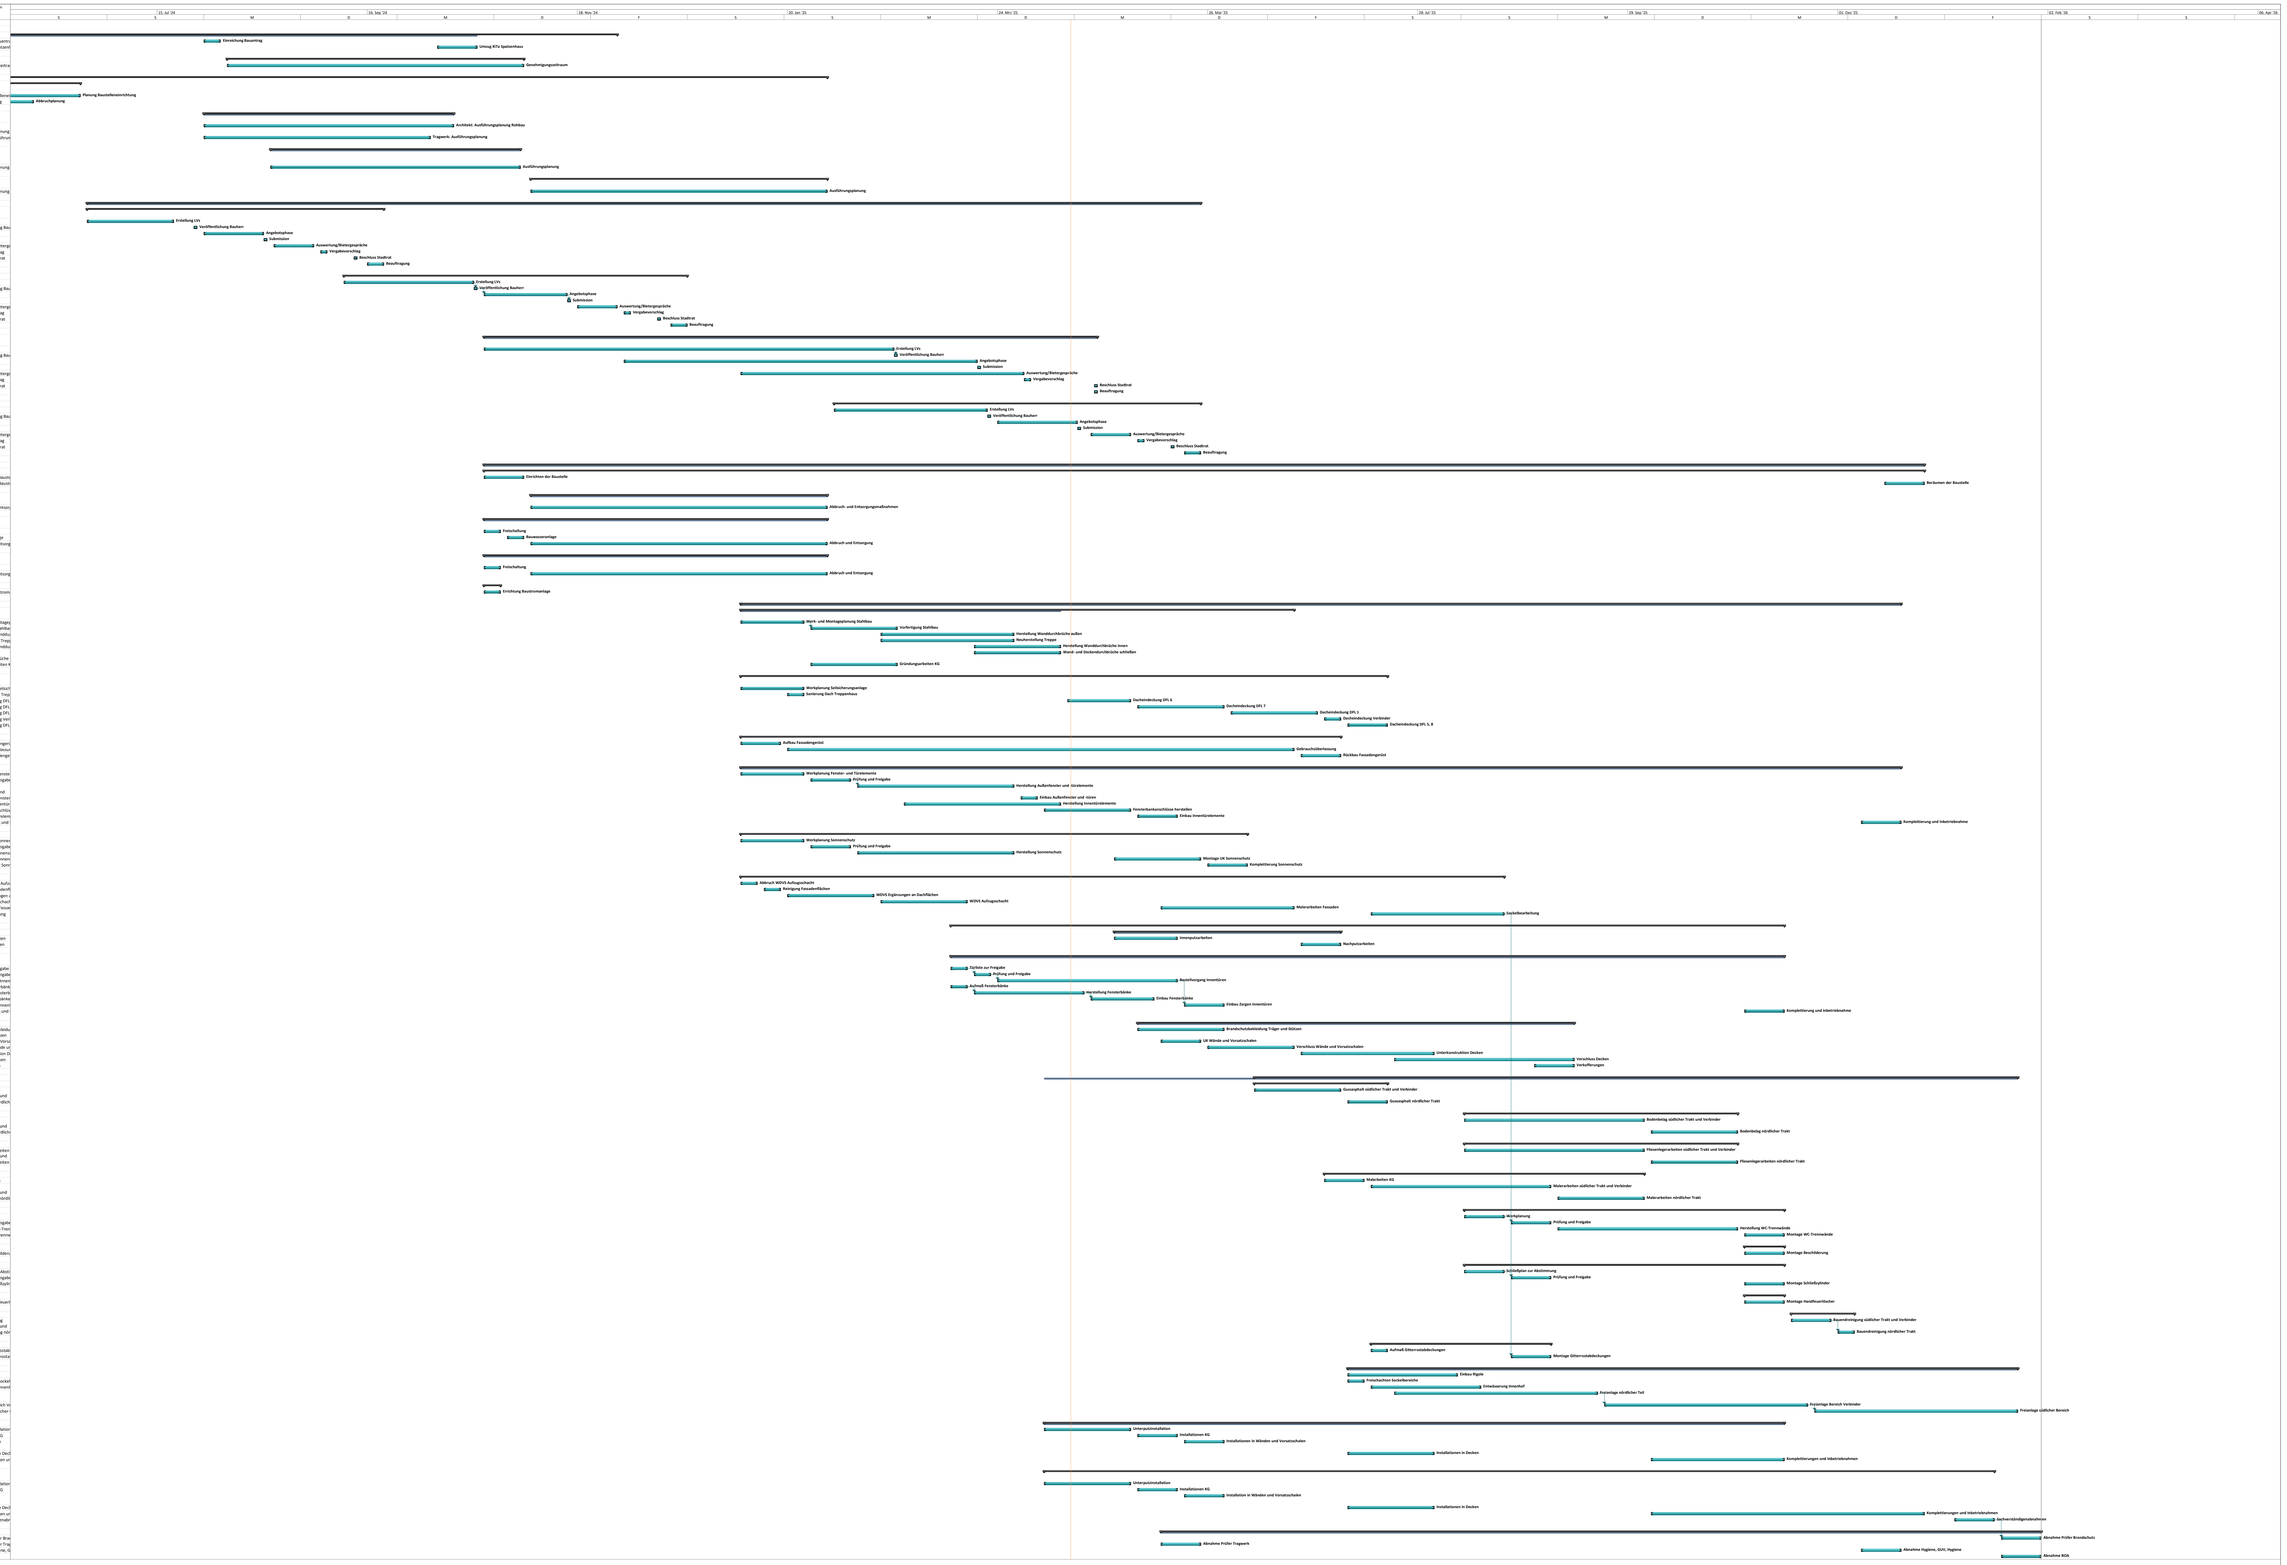

Projekt: 23006_Projektterminplan
Datum: Di 13.04.25

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Stichtag | In Arbeit

23.006 Kita Spatzenhaus Bad Doberan
Projektterminplanung, Stand 20.02.2025
