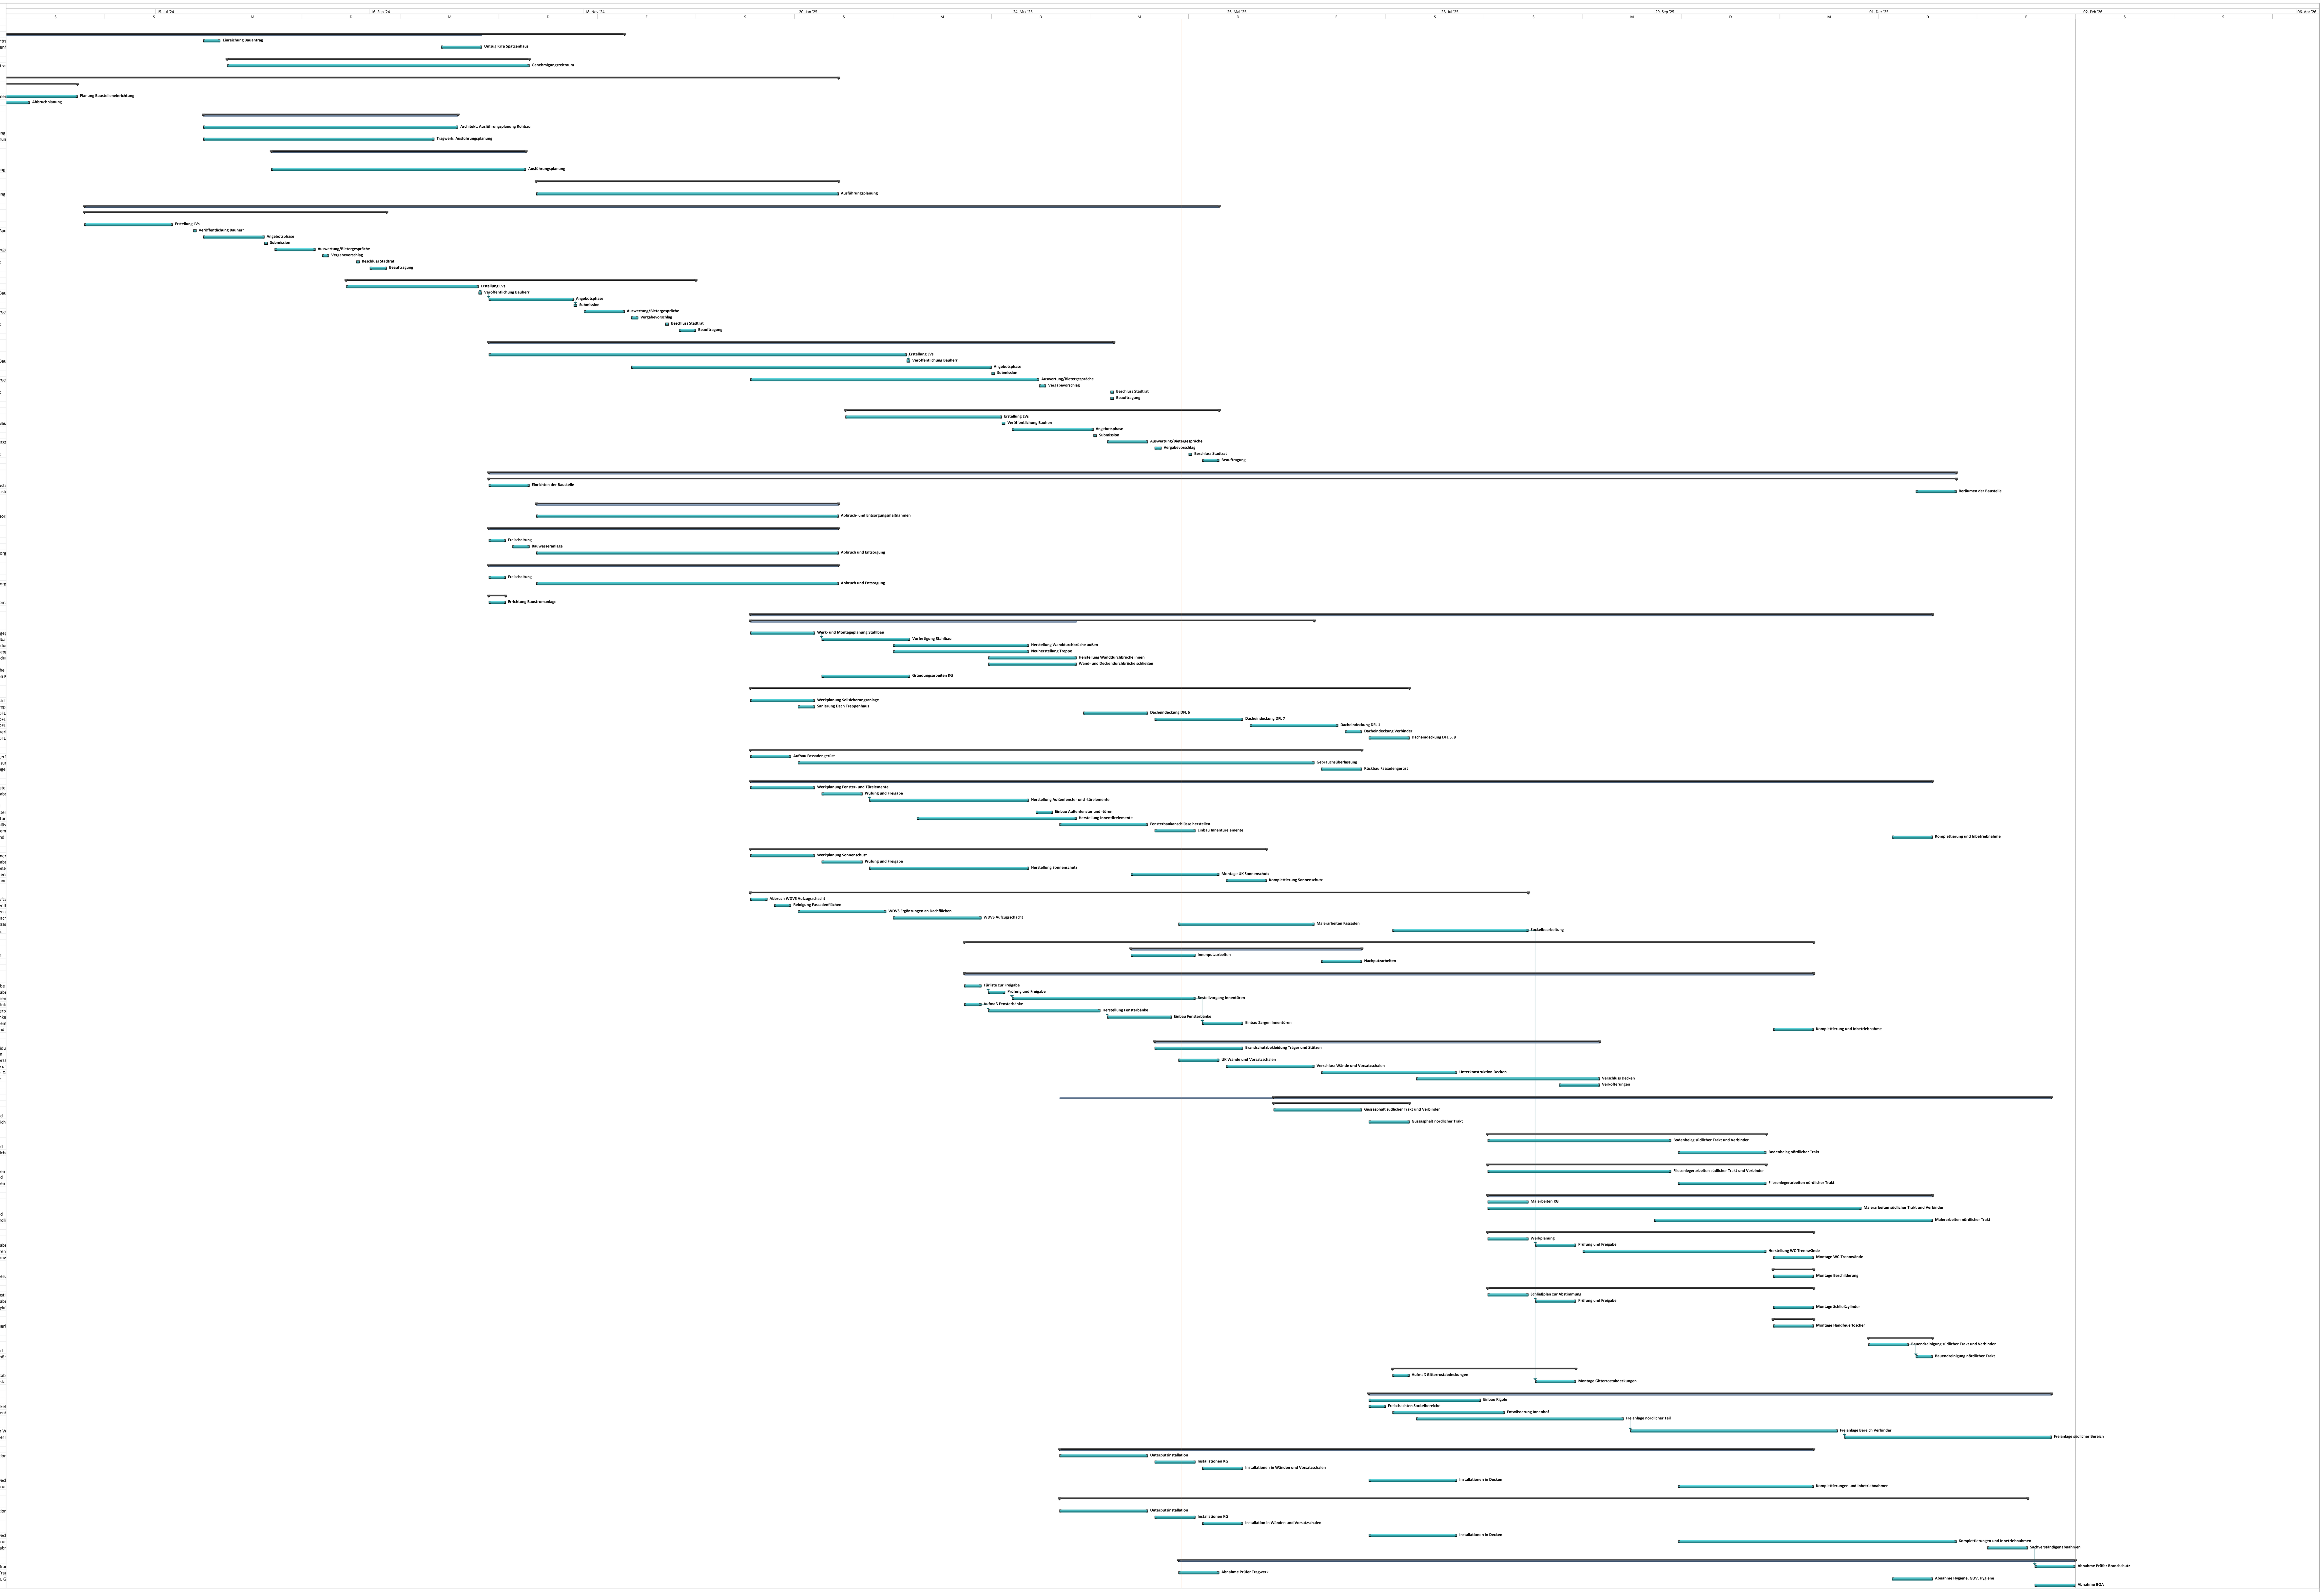Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorg	Ressourcennamen
1						
2						
3	**Bauherr**	**175 Tage**	**Mo 01.04.24**	**Fr 29.11.24**		
4	Einreichung Bauantrag	5 Tage	Mo 29.07.24	Fr 02.08.24		Einreichung Bauantra
5	Umzug KiTa Spatzenhaus	10 Tage	Mo 07.10.24	Fr 18.10.24		Umzug KiTa Spatzenh
6						
7	**Behörde**	**65 Tage**	**Mo 05.08.24**	**Fr 01.11.24**		
8	Genehmigungszeitraum	65 Tage	Mo 05.08.24	Fr 01.11.24		Genehmigungszeitra
9						
10	**Planung**	**220 Tage**	**Mo 01.04.24**	**Fr 31.01.25**		
11	**Ausführungsplanung Block 1 - Abbruch/Baustelleneinrichtung**	**60 Tage**	**Mo 01.04.24**	**Fr 21.06.24**		
12	Planung Baustelleneinrichtung	60 Tage	Mo 01.04.24	Fr 21.06.24		Planung Baustelleinei
13	Abbruchplanung	20 Tage	Mo 13.05.24	Fr 07.06.24		Abbruchplanung
14						
15	**Ausführungsplanung Block 2 - Rohbau, Äußere Hülle**	**55 Tage**	**Mo 29.07.24**	**Fr 11.10.24**		
16	Architekt: Ausführungsplanung Rohbau	55 Tage	Mo 29.07.24	Fr 11.10.24		Architekt: Ausführungsplanung
17	Tragwerk: Ausführungsplanung	50 Tage	Mo 29.07.24	Fr 04.10.24		Tragwerk: Ausführun
18						
19	**Ausführungsplanung Block 3 - Innenputz/Innentüren u. Fensterbänke/Trockenbau/TGA**	**55 Tage**	**So 18.08.24**	**Do 31.10.24**		
20	Ausführungsplanung	55 Tage	So 18.08.24	Do 31.10.24		Ausführungsplanung
21						
22	**Ausführungsplanung Block 4 - Ausbau/Freianlage**	**65 Tage**	**Mo 04.11.24**	**Fr 31.01.25**		
23	Ausführungsplanung	65 Tage	Mo 04.11.24	Fr 31.01.25		Ausführungsplanung
24						
25	**Vergabe**	**240 Tage**	**Mo 24.06.24**	**Fr 23.05.25**		
26	**Vergabeblock 1 - Abbruch/Baustelleneinrichtung**	**65 Tage**	**Mo 24.06.24**	**Fr 20.09.24**		
27	Erstellung LVs	20 Tage	Mo 24.06.24	Fr 19.07.24		Erstellung LVs
28	Veröffentlichung Bauherr	1 Tag	Fr 26.07.24	Fr 26.07.24		Veröffentlichung Bau
29	Angebotsphase	14 Tage	Mo 29.07.24	Do 15.08.24		Angebotsphase
30	Submission	1 Tag	Fr 16.08.24	Fr 16.08.24		Submission
31	Auswertung/Bietergespräche	10 Tage	Mo 19.08.24	Fr 30.08.24		Auswertung/Bieterge
32	Vergabevorschlag	2 Tage	Mo 02.09.24	Di 03.09.24		Vergabevorschlag
33	Beschluss Stadtrat	1 Tag	Do 12.09.24	Do 12.09.24		Beschluss Stadtrat
34	Beauftragung	5 Tage	Mo 16.09.24	Fr 20.09.24		Beauftragung
35						
36	**Vergabeblock 2 Rohbau/Äußere Hülle**	**75 Tage**	**Mo 09.09.24**	**Fr 20.12.24**		
37	Erstellung LVs	29 Tage	Mo 09.09.24	Do 17.10.24		Erstellung LVs
38	Veröffentlichung Bauherr	1 Tag	Fr 18.10.24	Fr 18.10.24	37	Veröffentlichung Bau
39	Angebotsphase	19 Tage	Mo 21.10.24	Do 14.11.24	38	Angebotsphase
40	Submission	1 Tag	Fr 15.11.24	Fr 15.11.24	39	Submission
41	Auswertung/Bietergespräche	10 Tage	Mo 18.11.24	Fr 29.11.24		Auswertung/Bieterge
42	Vergabevorschlag	2 Tage	Mo 02.12.24	Di 03.12.24		Vergabevorschlag
43	Beschluss Stadtrat	1 Tag	Do 12.12.24	Do 12.12.24		Beschluss Stadtrat
44	Beauftragung	5 Tage	Mo 16.12.24	Fr 20.12.24		Beauftragung
45						
46	**Vergabeblock 3 - Innenputz/Trockenbau/Gussasphalt**	**132 Tage**	**Mo 21.10.24**	**Di 22.04.25**		
47	Erstellung LVs	89 Tage	Mo 21.10.24	Do 20.02.25		Erstellung LVs
48	Veröffentlichung Bauherr	1 Tag	Fr 21.02.25	Fr 21.02.25	47	Veröffentlichung Bau
49	Angebotsphase	76 Tage	Mo 02.12.24	Mo 17.03.25		Angebotsphase
50	Submission	1 Tag	Di 18.03.25	Di 18.03.25		Submission
51	Auswertung/Bietergespräche	61 Tage	Mo 06.01.25	Mo 31.03.25		Auswertung/Bieterge
52	Vergabevorschlag	2 Tage	Di 01.04.25	Mi 02.04.25		Vergabevorschlag
53	Beschluss Stadtrat	1 Tag	Di 22.04.25	Di 22.04.25		Beschluss Stadtrat
54	Beauftragung	1 Tag	Di 22.04.25	Di 22.04.25		Beauftragung
55						
56	**Vergabeblock 4 - Ausbau/Freianlage**	**80 Tage**	**Mo 03.02.25**	**Fr 23.05.25**		
57	Erstellung LVs	34 Tage	Mo 03.02.25	Do 20.03.25		Erstellung LVs
58	Veröffentlichung Bauherr	1 Tag	Fr 21.03.25	Fr 21.03.25		Veröffentlichung Bau
59	Angebotsphase	18 Tage	Mo 24.03.25	Mi 16.04.25		Angebotsphase
60	Submission	1 Tag	Do 17.04.25	Do 17.04.25		Submission
61	Auswertung/Bietergespräche	10 Tage	Mo 21.04.25	Fr 02.05.25		Auswertung/Bieterge
62	Vergabevorschlag	2 Tage	Mo 05.05.25	Di 06.05.25		Vergabevorschlag
63	Beschluss Stadtrat	1 Tag	Do 15.05.25	Do 15.05.25		Beschluss Stadtrat
64	Beauftragung	5 Tage	Mo 19.05.25	Fr 23.05.25		Beauftragung
65						
66	**Bauausführung Vergabeblock 1**	**310 Tage**	**Mo 21.10.24**	**Fr 26.12.25**		
67	**Los 01 - Baustelleneinrichtung**	**310 Tage**	**Mo 21.10.24**	**Fr 26.12.25**		
68	Einrichten der Baustelle	10 Tage	Mo 21.10.24	Fr 01.11.24		Einrichten der Bauste
69	Beräumen der Baustelle	10 Tage	Mo 15.12.25	Fr 26.12.25		Beräumen der Baust
70						
71	**Los 02 - Abbruch- und Entsorgungsmaßnahmen**	**65 Tage**	**Mo 04.11.24**	**Fr 31.01.25**		
72	Abbruch- und Entsorgungsmaßnahmen	65 Tage	Mo 04.11.24	Fr 31.01.25		Abbruch- und Entsor
73						
74	**Los 30 - Freischaltung/Abbruch/Entsorgung HLS**	**75 Tage**	**Mo 21.10.24**	**Fr 31.01.25**		
75	Freischaltung	5 Tage	Mo 21.10.24	Fr 25.10.24		Freischaltung
76	Bauwasseranlage	5 Tage	Mo 28.10.24	Fr 01.11.24		Bauwasseranlage
77	Abbruch und Entsorgung	65 Tage	Mo 04.11.24	Fr 31.01.25		Abbruch und Entsorg
78						
79	**Los 32 - Freischaltung/Abbruch/Entsorgung Elt**	**75 Tage**	**Mo 21.10.24**	**Fr 31.01.25**		
80	Freischaltung	5 Tage	Mo 21.10.24	Fr 25.10.24		Freischaltung
81	Abbruch und Entsorgung	65 Tage	Mo 04.11.24	Fr 31.01.25		Abbruch und Entsorg
82						
83	**Los 34 - Baustrom**	**5 Tage**	**Mo 21.10.24**	**Fr 25.10.24**		
84	Errichtung Baustromanlage	5 Tage	Mo 21.10.24	Fr 25.10.24		Errichtung Baustroma
85						
86	**Bauausführung Vergabeblock 2**	**250 Tage**	**Mo 06.01.25**	**Fr 19.12.25**		
87	**Los 03 - Erd-, Mauer-, Beton- und Entwässerungskanalarbeiten**	**120 Tage**	**Mo 06.01.25**	**Fr 20.06.25**		
88	Werk- und Montageplanung Stahlbau	15 Tage	Mo 06.01.25	Fr 24.01.25		Werk- und Montagep
89	Vorfertigung Stahlbau	20 Tage	Mo 27.01.25	Fr 21.02.25	88	Vorfertigung Stahlba
90	Herstellung Wanddurchbrüche außen	30 Tage	Mo 17.02.25	Fr 28.03.25		Herstellung Wanddur
91	Neuherstellung Treppe	30 Tage	Mo 17.02.25	Fr 28.03.25		Neuherstellung Trepp
92	Herstellung Wanddurchbrüche innen	20 Tage	Mo 17.03.25	Fr 11.04.25		Herstellung Wanddur
93	Wand- und Deckendurchbrüche schließen	20 Tage	Mo 17.03.25	Fr 11.04.25		Wand- und Deckendurchbrüche
94	Gründungsarbeiten KG	20 Tage	Mo 27.01.25	Fr 21.02.25		Gründungsarbeiten K
95						
96	**Los 04 - Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten**	**140 Tage**	**Mo 06.01.25**	**Fr 18.07.25**		
97	Werkplanung Seilsicherungsanlage	15 Tage	Mo 06.01.25	Fr 24.01.25		Werkplanung Seilsich
98	Sanierung Dach Treppenhaus	5 Tage	Mo 20.01.25	Fr 24.01.25		Sanierung Dach Trep
99	Dacheindeckung Dachfläche 6 Trakt A	15 Tage	Mo 14.04.25	Fr 02.05.25		Dacheindeckung DFL
100	Dacheindeckung Dachfläche 7 Trakt A	20 Tage	Mo 05.05.25	Fr 30.05.25		Dacheindeckung DFL
101	Dacheindeckung Dachfläche 1 Trakt B	20 Tage	Mo 02.06.25	Fr 27.06.25		Dacheindeckung DFL
102	Dacheindeckung Verbinder DFL 2,3	5 Tage	Mo 30.06.25	Fr 04.07.25		Dacheindeckung Veri
103	Dacheindeckung DFL 5, 8 Trakt A	10 Tage	Mo 07.07.25	Fr 18.07.25		Dacheindeckung DFL
104						
105	**Los 05 - Gerüstbauarbeiten**	**130 Tage**	**Mo 06.01.25**	**Fr 04.07.25**		
106	Aufbau Fassadengerüst	10 Tage	Mo 06.01.25	Fr 17.01.25		Aufbau Fassadengerü
107	Gebrauchsüberlassung	110 Tage	Mo 20.01.25	Fr 20.06.25		Gebrauchsüberlassur
108	Rückbau Fassadengerüst	10 Tage	Mo 23.06.25	Fr 04.07.25		Rückbau Fassadenge
109						
110	**Los 06 - Fenster- und Türanlage**	**250 Tage**	**Mo 06.01.25**	**Fr 19.12.25**		
111	Werkplanung Fenster- und Türelemente	15 Tage	Mo 06.01.25	Fr 24.01.25		Werkplanung Fenste
112	Prüfung und Freigabe	10 Tage	Mo 27.01.25	Fr 07.02.25		Prüfung und Freigabe
113	Herstellung Außenfenster und -türelemente	35 Tage	Mo 10.02.25	Fr 28.03.25	112	Herstellung Außenfenster und
114	Einbau Außenfenster und -türen	5 Tage	Mo 31.03.25	Fr 04.04.25		Einbau Außenfenster
115	Herstellung Innentürelemente	35 Tage	Mo 24.02.25	Fr 11.04.25		Herstellung Innentür
116	Fensterbankanschlüsse herstellen	20 Tage	Mo 07.04.25	Fr 02.05.25		Fensterbankanschlüs
117	Einbau Innentürelemente	10 Tage	Mo 05.05.25	Fr 16.05.25		Einbau Innentürelem
118	Komplettierung und Inbetriebnahme	10 Tage	Mo 08.12.25	Fr 19.12.25		Komplettierung und
119						
120	**Los 08 - Sonnenschutz**	**110 Tage**	**Mo 06.01.25**	**Fr 06.06.25**		
121	Werkplanung Sonnenschutz	15 Tage	Mo 06.01.25	Fr 24.01.25		Werkplanung Sonner
122	Prüfung und Freigabe	10 Tage	Mo 27.01.25	Fr 07.02.25		Prüfung und Freigabe
123	Herstellung Sonnenschutz	35 Tage	Mo 10.02.25	Fr 28.03.25		Herstellung Sonnens
124	Montage UK Sonnenschutz	20 Tage	Mo 28.04.25	Fr 23.05.25		Montage UK Sonnens
125	Komplettierung Sonnenschutz	10 Tage	Mo 26.05.25	Fr 06.06.25		Komplettierung Sonr
126						
127	**Los 09 - WDVS**	**165 Tage**	**Mo 06.01.25**	**Fr 22.08.25**		
128	Abbruch WDVS Aufzugsschacht	5 Tage	Mo 06.01.25	Fr 10.01.25		Abbruch WDVS Aufzu
129	Reinigung Fassadenflächen	5 Tage	Mo 13.01.25	Fr 17.01.25		Reinigung Fassadenfl
130	WDVS Ergänzungen an Dachflächen	20 Tage	Mo 20.01.25	Fr 14.02.25		WDVS Ergänzungen a
131	WDVS Aufzugsschacht	20 Tage	Mo 17.02.25	Fr 14.03.25		WDVS Aufzugsschach
132	Malerarbeiten Fassaden	30 Tage	Mo 12.05.25	Fr 20.06.25		Malerarbeiten Fassac
133	Sockelbearbeitung	30 Tage	Mo 14.07.25	Fr 22.08.25		Sockelbearbeitung
134						
135	**Bauausführung Vergabeblock 3**	**180 Tage**	**Mo 10.03.25**	**Fr 14.11.25**		
136	**Los 07 - Innenputz**	**50 Tage**	**Mo 28.04.25**	**Fr 04.07.25**		
137	Innenputzarbeiten	15 Tage	Mo 28.04.25	Fr 16.05.25		Innenputzarbeiten
138	Nachputzarbeiten	10 Tage	Mo 23.06.25	Fr 04.07.25		Nachputzarbeiten
139						
140	**Los 10 - Innentüren, Fensterbänke, Eckschutz**	**180 Tage**	**Mo 10.03.25**	**Fr 14.11.25**		
141	Türliste zur Freigabe	5 Tage	Mo 10.03.25	Fr 14.03.25		Türliste zur Freigabe
142	Prüfung und Freigabe	5 Tage	Mo 17.03.25	Fr 21.03.25	141	Prüfung und Freigabe
143	Bestellvorgang Innentüren	40 Tage	Mo 24.03.25	Fr 16.05.25	142	Bestellvorgang Innen
144	Aufmaß Fensterbänke	5 Tage	Mo 10.03.25	Fr 14.03.25		Aufmaß Fensterbänk
145	Herstellung Fensterbänke	25 Tage	Mo 17.03.25	Fr 18.04.25	144	Herstellung Fensterb
146	Einbau Fensterbänke	15 Tage	Mo 21.04.25	Fr 09.05.25	145	Einbau Fensterbänke
147	Einbau Zargen Innentüren	10 Tage	Mo 19.05.25	Fr 30.05.25	143	Einbau Zargen Innen
148	Komplettierung und Inbetriebnahme	10 Tage	Mo 03.11.25	Fr 14.11.25		Komplettierung und
149						
150	**Los 11 - Trockenbauarbeiten**	**95 Tage**	**Mo 05.05.25**	**Fr 12.09.25**		
151	Brandschutzbekleidung Träger und Stützen	20 Tage	Mo 05.05.25	Fr 30.05.25		Brandschutzbekleidu Träger und Stützen
152	UK Wände und Vorsatzschalen	10 Tage	Mo 12.05.25	Fr 23.05.25		UK Wände und Vorsa
153	Verschluss Wände und Vorsatzschalen	20 Tage	Mo 26.05.25	Fr 20.06.25		Verschluss Wände ur
154	Unterkonstruktion Decken	30 Tage	Mo 23.06.25	Fr 01.08.25		Unterkonstruktion D
155	Verschluss Decken	40 Tage	Mo 21.07.25	Fr 12.09.25		Verschluss Decken
156	Verkofferungen	10 Tage	Mo 01.09.25	Fr 12.09.25		Verkofferungen
157						
158	**Bauausführung Vergabeblock 4**	**165 Tage**	**Mo 09.06.25**	**Fr 23.01.26**		
159	**Los 12 - Gussasphalt**	**30 Tage**	**Mo 09.06.25**	**Fr 18.07.25**		
160	Gussasphalt südlicher Trakt und Verbinder	20 Tage	Mo 09.06.25	Fr 04.07.25		Gussasphalt südlicher Trakt und
161	Gussasphalt nördlicher Trakt	10 Tage	Mo 07.07.25	Fr 18.07.25		Gussasphalt nördlich
162						
163	**Los 13 - Bodenbelagsarbeiten**	**60 Tage**	**Mo 11.08.25**	**Fr 31.10.25**		
164	Bodenbelag südlicher Trakt und Verbinder	40 Tage	Mo 11.08.25	Fr 03.10.25		Bodenbelag südlicher Trakt und
165	Bodenbelag nördlicher Trakt	20 Tage	Mo 06.10.25	Fr 31.10.25		Bodenbelag nördlich
166						
167	**Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**	**60 Tage**	**Mo 11.08.25**	**Fr 31.10.25**		
168	Fliesenlegerarbeiten südlicher Trakt und Verbinder	40 Tage	Mo 11.08.25	Fr 03.10.25		Fliesenlegerarbeiten südlicher Trakt und
169	Fliesenlegerarbeiten nördlicher Trakt	20 Tage	Mo 06.10.25	Fr 31.10.25		Fliesenlegerarbeiten
170						
171	**Los 15 - Malerarbeiten**	**95 Tage**	**Mo 11.08.25**	**Fr 19.12.25**		
172	Malerbeiten KG	10 Tage	Mo 11.08.25	Fr 22.08.25		Malerbeiten KG
173	Malerarbeiten Trakt A und Verbinder	80 Tage	Mo 11.08.25	Fr 28.11.25		Malerarbeiten südlicher Trakt und
174	Malerarbeiten Trakt B	60 Tage	Mo 29.09.25	Fr 19.12.25		Malerarbeiten nördli
175						
176	**Los 16 - WC - Trennwände**	**70 Tage**	**Mo 11.08.25**	**Fr 14.11.25**		
177	Werkplanung	10 Tage	Mo 11.08.25	Fr 22.08.25		Werkplanung
178	Prüfung und Freigabe	10 Tage	Mo 25.08.25	Fr 05.09.25	177	Prüfung und Freigabe
179	Herstellung WC-Trennwände	40 Tage	Mo 08.09.25	Fr 31.10.25		Herstellung WC-Tren
180	Montage WC-Trennwände	10 Tage	Mo 03.11.25	Fr 14.11.25		Montage WC-Trennw
181						
182	**Los 18 - Beschilderung**	**10 Tage**	**Mo 03.11.25**	**Fr 14.11.25**		
183	Montage Beschilderung	10 Tage	Mo 03.11.25	Fr 14.11.25		Montage Beschilderu
184						
185	**Los 19 - Schließanlage**	**70 Tage**	**Mo 11.08.25**	**Fr 14.11.25**		
186	Schließplan zur Abstimmung	10 Tage	Mo 11.08.25	Fr 22.08.25		Schließplan zur Absti
187	Prüfung und Freigabe	10 Tage	Mo 25.08.25	Fr 05.09.25	186	Prüfung und Freigabe
188	Montage Schließzylinder	10 Tage	Mo 03.11.25	Fr 14.11.25		Montage Schließzylir
189						
190	**Los 20 - Möblierung**	**10 Tage**	**Mo 03.11.25**	**Fr 14.11.25**		
191	Montage Handfeuerlöscher	10 Tage	Mo 03.11.25	Fr 14.11.25		Montage Handfeuerl
192						
193	**Los 21 - Bauendreinigung**	**15 Tage**	**Mo 01.12.25**	**Fr 19.12.25**		
194	Bauendreinigung südlicher Trakt und Verbinder	10 Tage	Mo 01.12.25	Fr 12.12.25		Bauendreinigung südlicher Trakt und
195	Bauendreinigung nördlicher Trakt	5 Tage	Mo 15.12.25	Fr 19.12.25	194	Bauendreinigung nör
196						
197	**Los 22 - Metallbauarbeiten**	**40 Tage**	**Mo 14.07.25**	**Fr 05.09.25**		
198	Aufmaß Gitterrostabdeckungen	5 Tage	Mo 14.07.25	Fr 18.07.25		Aufmaß Gitterrostab
199	Montage Gitterrostabdeckungen	10 Tage	Mo 25.08.25	Fr 05.09.25	133	Montage Gitterrosta
200						
201	**Los 23 - Außenanlagen**	**145 Tage**	**Mo 07.07.25**	**Fr 23.01.26**		
202	Einbau Rigole	25 Tage	Mo 07.07.25	Fr 08.08.25		Einbau Rigole
203	Freischachten Sockelbereiche	5 Tage	Mo 07.07.25	Fr 11.07.25		Freischachten Sockel
204	Entwässerung Innenhof	25 Tage	Mo 14.07.25	Fr 15.08.25		Entwässerung Innenh
205	Freianlage südlicher und östlicher Bereich	45 Tage	Mo 21.07.25	Fr 19.09.25		Freianlage nördlicher Teil
206	Freianlage westlicher Bereich	45 Tage	Mo 22.09.25	Fr 21.11.25	205	Freianlage Bereich Ve
207	Freianlage nördlicher Bereich	45 Tage	Mo 24.11.25	Fr 23.01.26	206	Freianlage südlicher
208						
209	**Los 31 - Heizung/Lüftung/Sanitär**	**160 Tage**	**Mo 07.04.25**	**Fr 14.11.25**		
210	Unterputzinstallation	20 Tage	Mo 07.04.25	Fr 02.05.25		Unterputzinstallation
211	Installationen KG	10 Tage	Mo 05.05.25	Fr 16.05.25		Installationen KG
212	Installationen in Wänden und Vorsatzschalen	10 Tage	Mo 19.05.25	Fr 30.05.25		Installationen in Wänden und
213	Installationen in Decken	20 Tage	Mo 07.07.25	Fr 01.08.25		Installationen in Decl
214	Komplettierungen und Inbetriebnahmen	30 Tage	Mo 06.10.25	Fr 14.11.25		Komplettierungen ur
215						
216	**Los 33 - Stark- und Schwachstrominstallation**	**205 Tage**	**Mo 07.04.25**	**Fr 16.01.26**		
217	Unterputzinstallation	20 Tage	Mo 07.04.25	Fr 02.05.25		Unterputzinstallation
218	Installationen KG	10 Tage	Mo 05.05.25	Fr 16.05.25		Installationen KG
219	Installation in Wänden und Vorsatzschalen	10 Tage	Mo 19.05.25	Fr 30.05.25		Installation in Wänden und
220	Installationen in Decken	20 Tage	Mo 07.07.25	Fr 01.08.25		Installationen in Decl
221	Komplettierungen und Inbetriebnahmen	60 Tage	Mo 06.10.25	Fr 26.12.25		Komplettierungen ur
222	Sachverständigenabnahmen	10 Tage	Mo 05.01.26	Fr 16.01.26		Sachverständigenabr
223						
224	**Behördliche Abnahmen**	**190 Tage**	**Mo 12.05.25**	**Fr 30.01.26**		
225	Abnahme Prüfer Brandschutz	10 Tage	Mo 19.01.26	Fr 30.01.26	222	Abnahme Prüfer Brai
226	Abnahme Prüfer Tragwerk	10 Tage	Mo 12.05.25	Fr 23.05.25		Abnahme Prüfer Trag
227	Abnahme Hygiene, GUV, Hygiene	10 Tage	Mo 08.12.25	Fr 19.12.25		Abnahme Hygiene, G
228	Abnahme BOA	10 Tage	Mo 19.01.26	Fr 30.01.26		Abnahme BOA
