Motte_Bauzeiten_12.05.2025.mpp

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
0	**Motte_Bauzeitenplan**	**320 Tage**	**Mon 14.07.25**	**Fre 23.10.26**
1	Beauftragung	5 Tage	Mon 14.07.25	Fre 18.07.25
2	Baubeginn	1 Tag	Mon 11.08.25	Mon 11.08.25
3	Fertigstellung	1 Tag	Fre 23.10.26	Fre 23.10.26
4	**Bauteil A**	**311 Tage**	**Don 24.07.25**	**Don 22.10.26**
5	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Die 12.08.25	Mon 18.08.25
6	Demontage Glasdächer	7 Tage	Die 19.08.25	Mit 27.08.25
7	Gerüst/ Wetterschutzdach,Aufbau	15 Tage	Don 27.11.25	Mit 17.12.25
8	Wetterschutzdach abbauen	10 Tage	Fre 10.07.26	Don 23.07.26
9	**Bauteil A , Keller**	**57 Tage**	**Die 19.08.25**	**Fre 07.11.25**
10	Fundamente unterfangen	50 Tage	Die 19.08.25	Die 28.10.25
11	TGA-Ausführungen	20 Tage	Die 19.08.25	Mon 15.09.25
12	Malerarbeiten	7 Tage	Mit 29.10.25	Fre 07.11.25
13	**Bauteil A, EG**	**60 Tage**	**Die 19.08.25**	**Mit 12.11.25**
14	Demontagearbeiten	10 Tage	Die 19.08.25	Mon 01.09.25
15	Maurerarbeiten	10 Tage	Die 02.09.25	Mon 15.09.25
16	Treppenöffnug-Decke schließen	3 Tage	Die 02.09.25	Don 04.09.25
17	TB:Wände einseitig	10 Tage	Fre 05.09.25	Don 18.09.25
18	TGA:Installation	15 Tage	Fre 12.09.25	Don 02.10.25
19	neue Fenster einbauen	2 Tage	Mon 06.10.25	Die 07.10.25
20	TB:Wände,Decken schließen	10 Tage	Mon 06.10.25	Fre 17.10.25
21	Putzarbeiten	10 Tage	Mit 15.10.25	Die 28.10.25
22	Fliesenarbeiten	10 Tage	Mon 20.10.25	Mon 03.11.25
23	TGA:Objekte einbauen	5 Tage	Die 04.11.25	Mon 10.11.25
24	Bodenbelagsarbeiten	10 Tage	Mon 20.10.25	Mon 03.11.25
25	Malerarbeiten	15 Tage	Mon 20.10.25	Mon 10.11.25
26	Endmontage	6 Tage	Die 04.11.25	Die 11.11.25
27	Endreinigung	2 Tage	Die 11.11.25	Mit 12.11.25
28	**Büro Motte Umzug vom 2.OG ins EG**	10 Tage	Don 13.11.25	Mit 26.11.25
29	**Bauteil A, 1.OG**	**33 Tage**	**Die 02.09.25**	**Fre 17.10.25**
30	Treppenloch im Boden schließen	3 Tage	Die 02.09.25	Don 04.09.25
31	TB-Wände einseitig	2 Tage	Fre 05.09.25	Mon 08.09.25
32	Türöffnungen in MW herstellen	3 Tage	Fre 05.09.25	Die 09.09.25
33	TGA-installation	10 Tage	Mit 10.09.25	Die 23.09.25
34	TB-Wände schließen	2 Tage	Mit 24.09.25	Don 25.09.25
35	Bodenbelagsarbeiten	3 Tage	Fre 26.09.25	Die 30.09.25
36	Malerarbeiten	5 Tage	Mit 01.10.25	Mit 08.10.25
37	Endmontage	6 Tage	Don 09.10.25	Don 16.10.25
38	Endreinigung	1 Tag	Fre 17.10.25	Fre 17.10.25

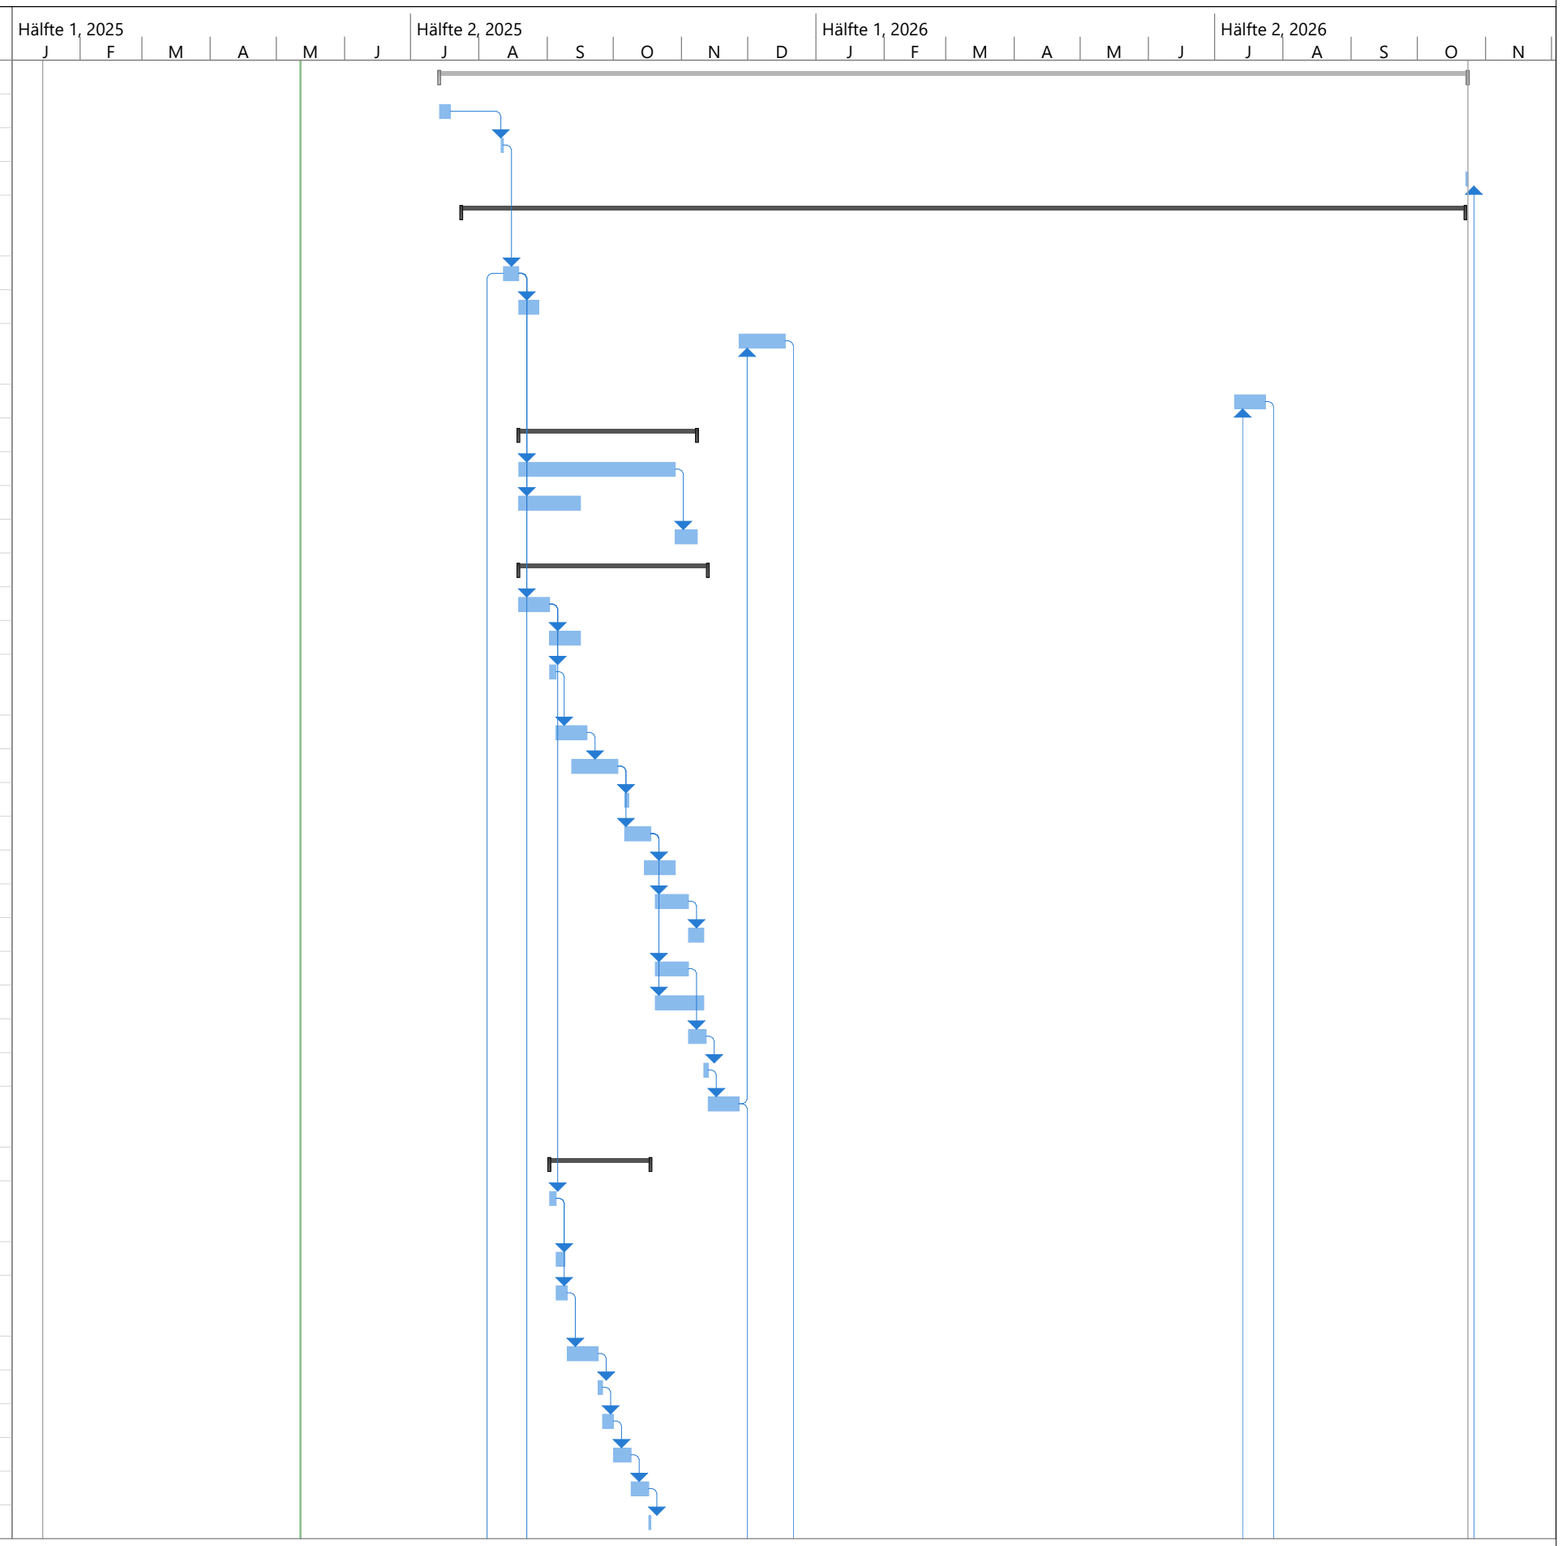

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
39	**Bauteil A, 2.OG**	**102 Tage**	**Don 27.11.25**	**Mon 04.05.26**
40	Demontage Innen	10 Tage	Don 27.11.25	Mit 10.12.25
41	Dachdemontage	15 Tage	Don 18.12.25	Mon 19.01.26
42	Stb. - Ringbalken, 2.OG	15 Tage	Die 20.01.26	Mon 09.02.26
43	Spannbeton-Hohldecke	10 Tage	Die 10.02.26	Mon 23.02.26
44	TB:Wände einseitig	5 Tage	Die 24.02.26	Mon 02.03.26
45	TGA:Installation	20 Tage	Don 12.02.26	Mit 11.03.26
46	TB-Wände schließen	5 Tage	Mit 11.03.26	Die 17.03.26
47	Fliesenarbeiten	8 Tage	Mon 16.03.26	Mit 25.03.26
48	TGA:Objekte einbauen	7 Tage	Die 24.03.26	Mit 01.04.26
49	Malerarbeiten	13 Tage	Don 02.04.26	Mit 22.04.26
50	Endmontage	6 Tage	Don 23.04.26	Don 30.04.26
51	Endreinigung	1 Tag	Mon 04.05.26	Mon 04.05.26
52	**Bauteil A, DG**	**138 Tage**	**Die 24.02.26**	**Don 10.09.26**
53	DG - MW-Wände herstellen	15 Tage	Die 24.02.26	Mon 16.03.26
54	Stb.-Ringbalken , DG	20 Tage	Die 17.03.26	Mit 15.04.26
55	Stb.-Decke Treppenhaus	8 Tage	Don 16.04.26	Mon 27.04.26
56	Dachkonstruktion	20 Tage	Die 28.04.26	Don 28.05.26
57	Aussenwände, Holz herstellen	10 Tage	Fre 29.05.26	Don 11.06.26
58	Fenster,Aussentüren	5 Tage	Fre 12.06.26	Don 18.06.26
59	Dachabdichtung	15 Tage	Fre 19.06.26	Don 09.07.26
60	Wetterschutzdach abbauen	10 Tage	Fre 10.07.26	Don 23.07.26
61	TB:Wände einseitig	5 Tage	Fre 19.06.26	Don 25.06.26
62	TGA:Installation	20 Tage	Fre 19.06.26	Don 16.07.26
63	TB-Wände schließen	5 Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26
64	Fliesenarbeiten	8 Tage	Don 16.07.26	Mon 27.07.26
65	TGA:Objekte einbauen	7 Tage	Fre 24.07.26	Mon 03.08.26
66	Malerarbeiten	7 Tage	Fre 31.07.26	Mon 10.08.26
67	Endmontage	6 Tage	Die 11.08.26	Die 18.08.26
68	Endreinigung	2 Tage	Mit 19.08.26	Don 20.08.26
69	Erweitern Laubengangplatten	20 Tage	Fre 24.07.26	Don 20.08.26
70	Geländer/Glasdächer montieren	10 Tage	Fre 21.08.26	Don 03.09.26
71	Rest Gerüst abbau	5 Tage	Fre 04.09.26	Don 10.09.26
72	**EG-Aussenbereich**	**30 Tage**	**Fre 11.09.26**	**Don 22.10.26**
73	Eingansrampe herstellen	20 Tage	Fre 11.09.26	Don 08.10.26
74	Plattformlift	5 Tage	Fre 09.10.26	Don 15.10.26
75	Rückbau Baustelleneinrichtung	5 Tage	Fre 16.10.26	Don 22.10.26
76	**Bauteil B**	**180 Tage**	**Don 24.07.25**	**Fre 17.04.26**
77	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Die 12.08.25	Mon 18.08.25
78	Demontage Glasdächer	7 Tage	Die 19.08.25	Mit 27.08.25
79	Statik Gerüst	15 Tage	Die 12.08.25	Mon 01.09.25
80	Gerüst-/Wetterdachaufbau	15 Tage	Die 02.09.25	Mon 22.09.25

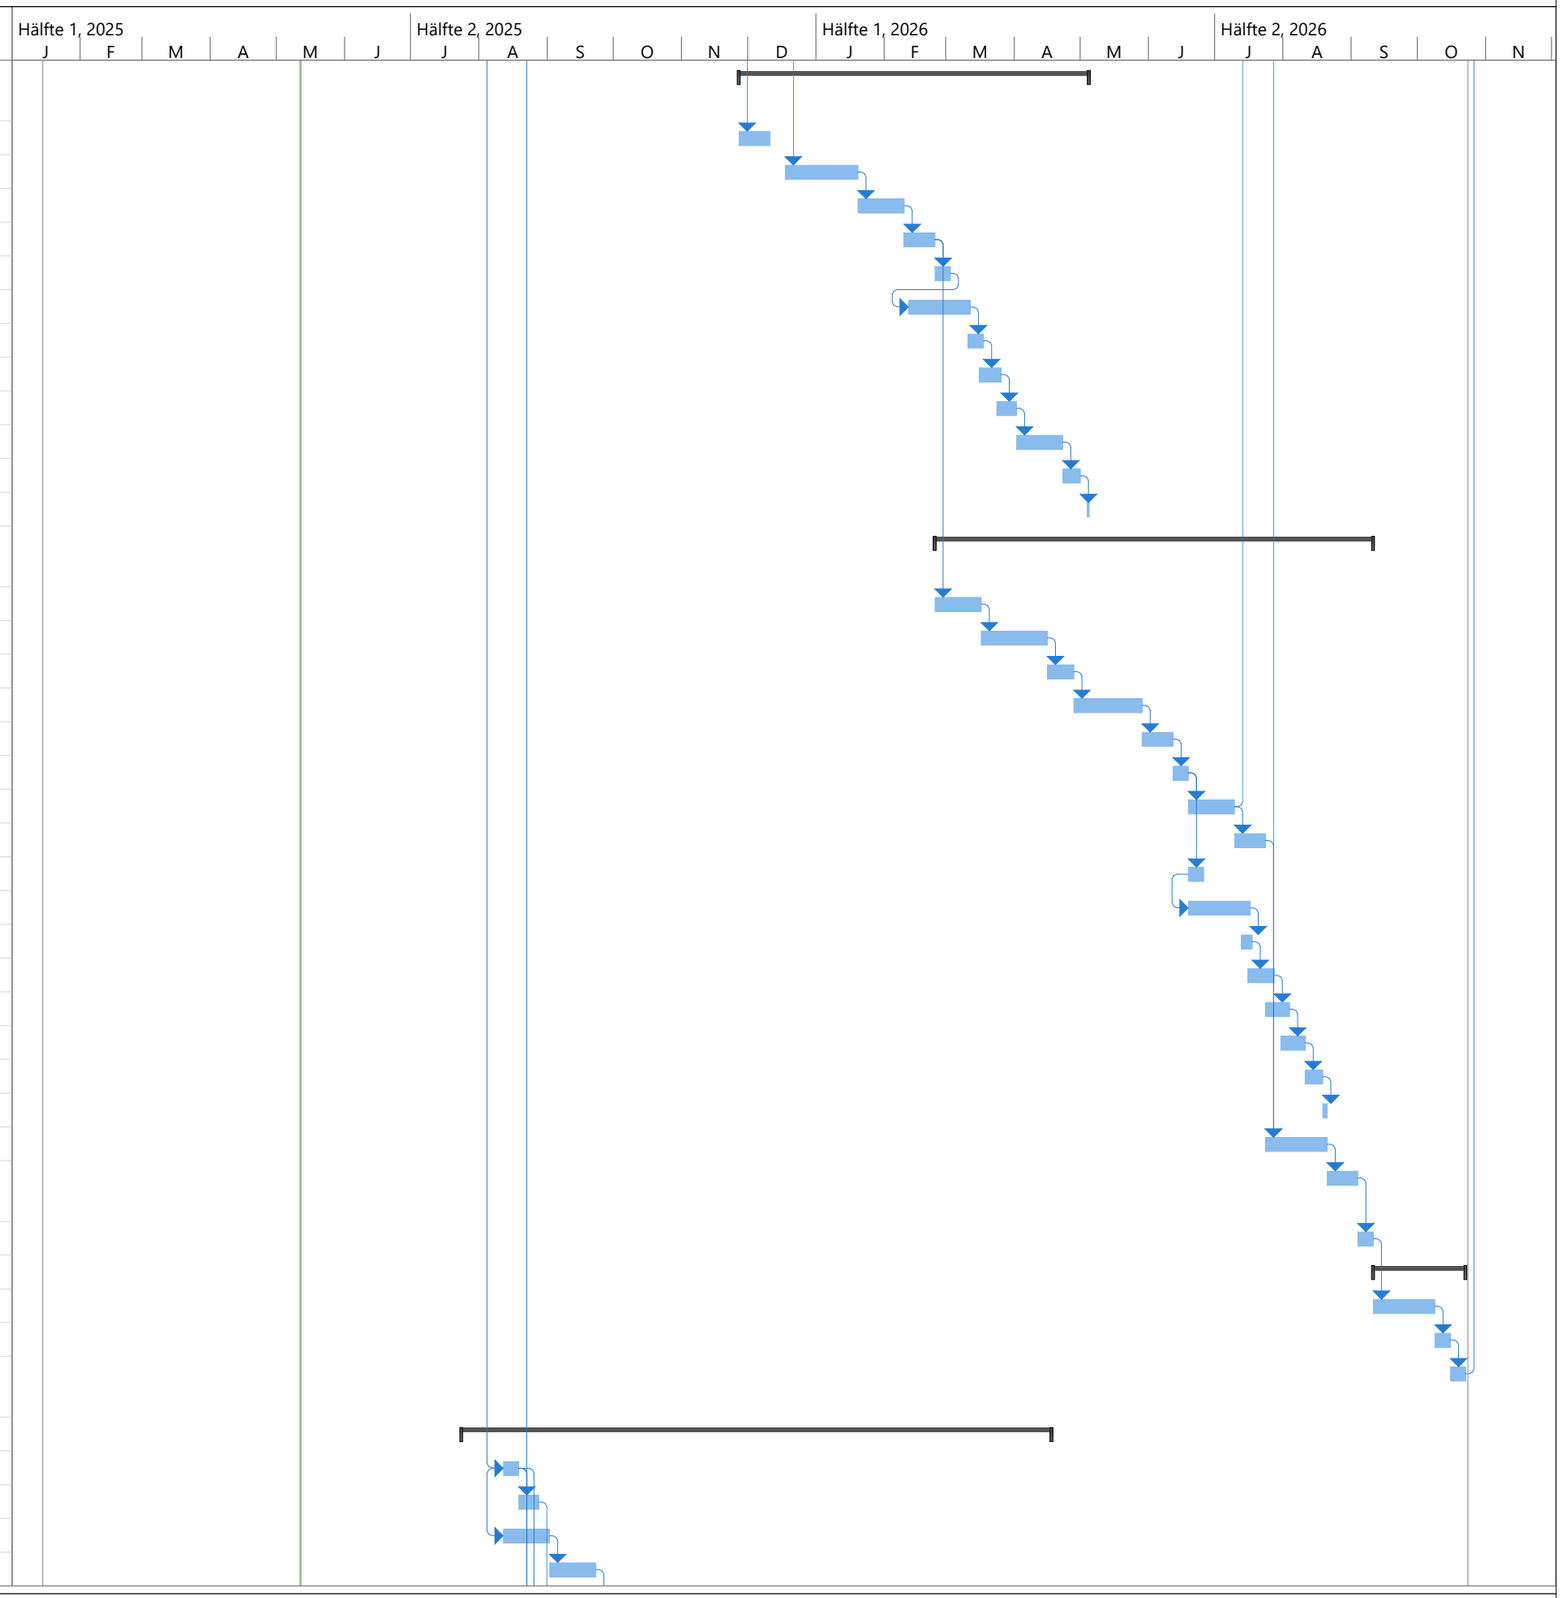

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
81	WDVS-Arbeiten	40 Tage	Die 27.01.26	Mon 23.03.26
82	Gerüst-/Wetterschutzdach Abbau	10 Tage	Die 24.03.26	Mit 08.04.26
83	Montage neue Glasdächer	7 Tage	Don 09.04.26	Fre 17.04.26
84	Lüftungszentrale-Zwischendach	30 Tage	Don 24.07.25	Mit 03.09.25
85	**Bauteil B, Keller**	**56 Tage**	**Die 19.08.25**	**Don 06.11.25**
86	TGA-Ausführungen	20 Tage	Die 19.08.25	Mon 15.09.25
87	Heizzentrale	32 Tage	Mon 22.09.25	Don 06.11.25
88	TB-Wand	6 Tage	Die 26.08.25	Die 02.09.25
89	Malerarbeiten	12 Tage	Mit 03.09.25	Don 18.09.25
90	**Bauteil B, EG:Ausführung in den Ferien 24.07-03.09.25**	**40 Tage**	**Don 24.07.25**	**Mit 17.09.25**
91	Lüftungsarbeiten im Saal	30 Tage	Don 24.07.25	Mit 03.09.25
92	WC-Bereiche:Demontage	5 Tage	Don 24.07.25	Mit 30.07.25
93	TB:Wände einseitig	5 Tage	Don 31.07.25	Mit 06.08.25
94	TGA:Installation	8 Tage	Mit 06.08.25	Fre 15.08.25
95	TB-Wände schließen	5 Tage	Die 12.08.25	Mon 18.08.25
96	Fliesenarbeiten	8 Tage	Fre 15.08.25	Die 26.08.25
97	TGA:Objekte einbauen	5 Tage	Mon 25.08.25	Fre 29.08.25
98	Malerarbeiten	8 Tage	Don 28.08.25	Mon 08.09.25
99	Endmontage	6 Tage	Die 09.09.25	Die 16.09.25
100	Endreinigung	1 Tag	Mit 17.09.25	Mit 17.09.25
101	**Bauteil B,2.OG**	**42 Tage**	**Don 02.10.25**	**Die 02.12.25**
102	TB-Schallschutzwand	10 Tage	Don 02.10.25	Don 16.10.25
103	WC-Bereiche:Demontage	5 Tage	Don 02.10.25	Don 09.10.25
104	TB:Wände einseitig	5 Tage	Fre 10.10.25	Don 16.10.25
105	TGA:Installation	12 Tage	Don 16.10.25	Mon 03.11.25
106	TB-Wände schließen	5 Tage	Don 30.10.25	Don 06.11.25
107	Fliesenarbeiten	8 Tage	Mit 05.11.25	Fre 14.11.25
108	TGA:Objekte einbauen	5 Tage	Don 13.11.25	Mit 19.11.25
109	Malerarbeiten	7 Tage	Don 13.11.25	Fre 21.11.25
110	Endmontage	6 Tage	Mon 24.11.25	Mon 01.12.25
111	Endreinigung	1 Tag	Die 02.12.25	Die 02.12.25
112	**Bauteil B, DG**	**153 Tage**	**Don 28.08.25**	**Mit 15.04.26**
113	Demontage Innenwände	10 Tage	Don 28.08.25	Mit 10.09.25
114	Ergänzung Decke 2.OG	15 Tage	Don 11.09.25	Mit 01.10.25
115	Schornstein Demontage	5 Tage	Die 23.09.25	Mon 29.09.25
116	Dachdemontage	20 Tage	Die 30.09.25	Die 28.10.25
117	Wände aufmauern	10 Tage	Mit 29.10.25	Mit 12.11.25
118	Stb.-Ringbalken , DG	25 Tage	Don 13.11.25	Mit 17.12.25
119	Fenster	7 Tage	Don 18.12.25	Mit 07.01.26
120	Dachkonstruktion	20 Tage	Don 18.12.25	Mon 26.01.26
121	Dachabdichtung	20 Tage	Die 27.01.26	Mon 23.02.26
122	TB:Wände einseitig	10 Tage	Don 08.01.26	Mit 21.01.26
123	TGA:Installation	20 Tage	Don 22.01.26	Mit 18.02.26

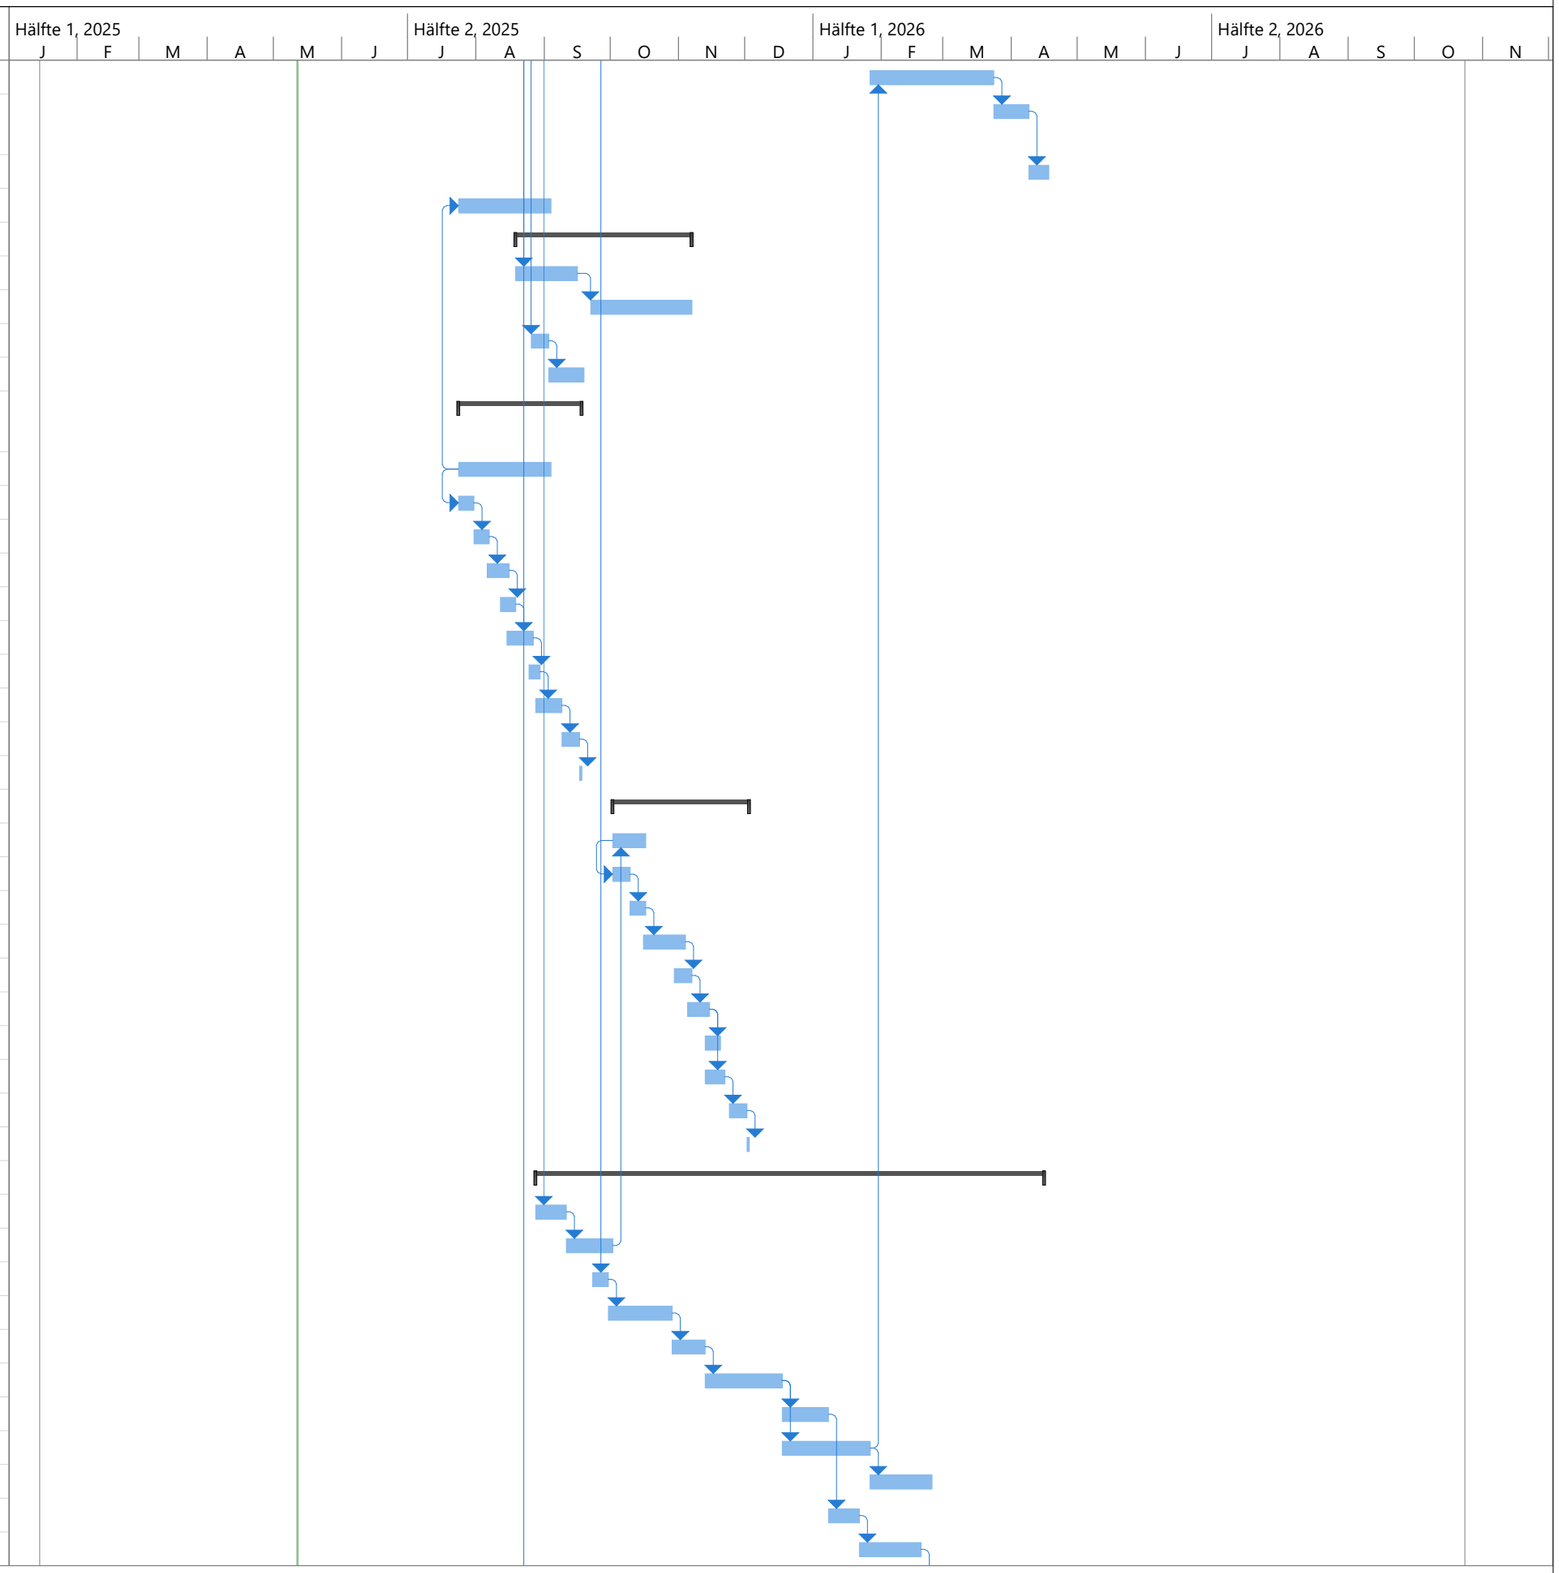
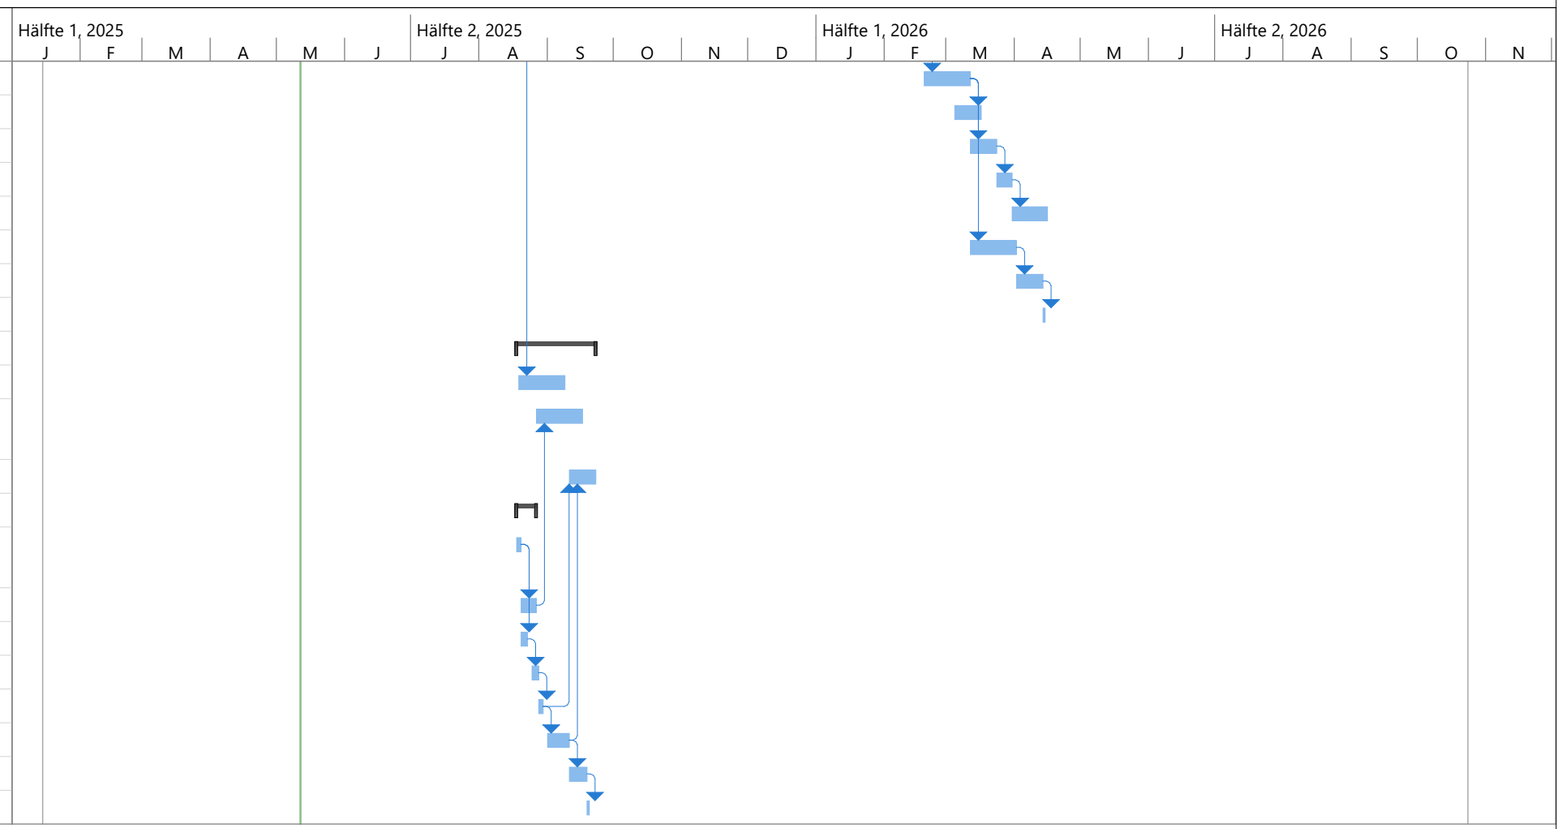
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
124	TB:Wände,Decken schließen	15 Tage	Don 19.02.26	Mit 11.03.26
125	Putzarbeiten	8 Tage	Don 05.03.26	Mon 16.03.26
126	Fliesenarbeiten	8 Tage	Don 12.03.26	Mon 23.03.26
127	TGA:Objekte einbauen	5 Tage	Die 24.03.26	Mon 30.03.26
128	Bodenbelagsarbeiten	10 Tage	Die 31.03.26	Mit 15.04.26
129	Malerarbeiten	15 Tage	Don 12.03.26	Mit 01.04.26
130	Endmontage	6 Tage	Don 02.04.26	Mon 13.04.26
131	Endreinigung	1 Tag	Die 14.04.26	Die 14.04.26
132	**Bauteil D (KiTa)**	**26 Tage**	**Mon 18.08.25**	**Mon 22.09.25**
133	Fundamente Herstellen	15 Tage	Die 19.08.25	Mon 08.09.25
134	Aussen-Treppenanlage einbauen	15 Tage	Mit 27.08.25	Die 16.09.25
135	Malerarbeiten Innen	8 Tage	Don 11.09.25	Mon 22.09.25
136	**KiTa-Ferienzeit 18.-31.08.25**	**7 Tage**	**Mon 18.08.25**	**Die 26.08.25**
137	neue Aussentüröffnung herstellen	2 Tage	Mon 18.08.25	Die 19.08.25
138	neue Fenster einbauen	5 Tage	Mit 20.08.25	Die 26.08.25
139	TB:Wände einseitig	3 Tage	Mit 20.08.25	Fre 22.08.25
140	E-Installation	3 Tage	Mon 25.08.25	Mit 27.08.25
141	TB:Wände schließen	2 Tage	Don 28.08.25	Fre 29.08.25
142	Maler	8 Tage	Mon 01.09.25	Mit 10.09.25
143	Endmontage	6 Tage	Don 11.09.25	Don 18.09.25
144	Endreinigung	1 Tag	Fre 19.09.25	Fre 19.09.25
