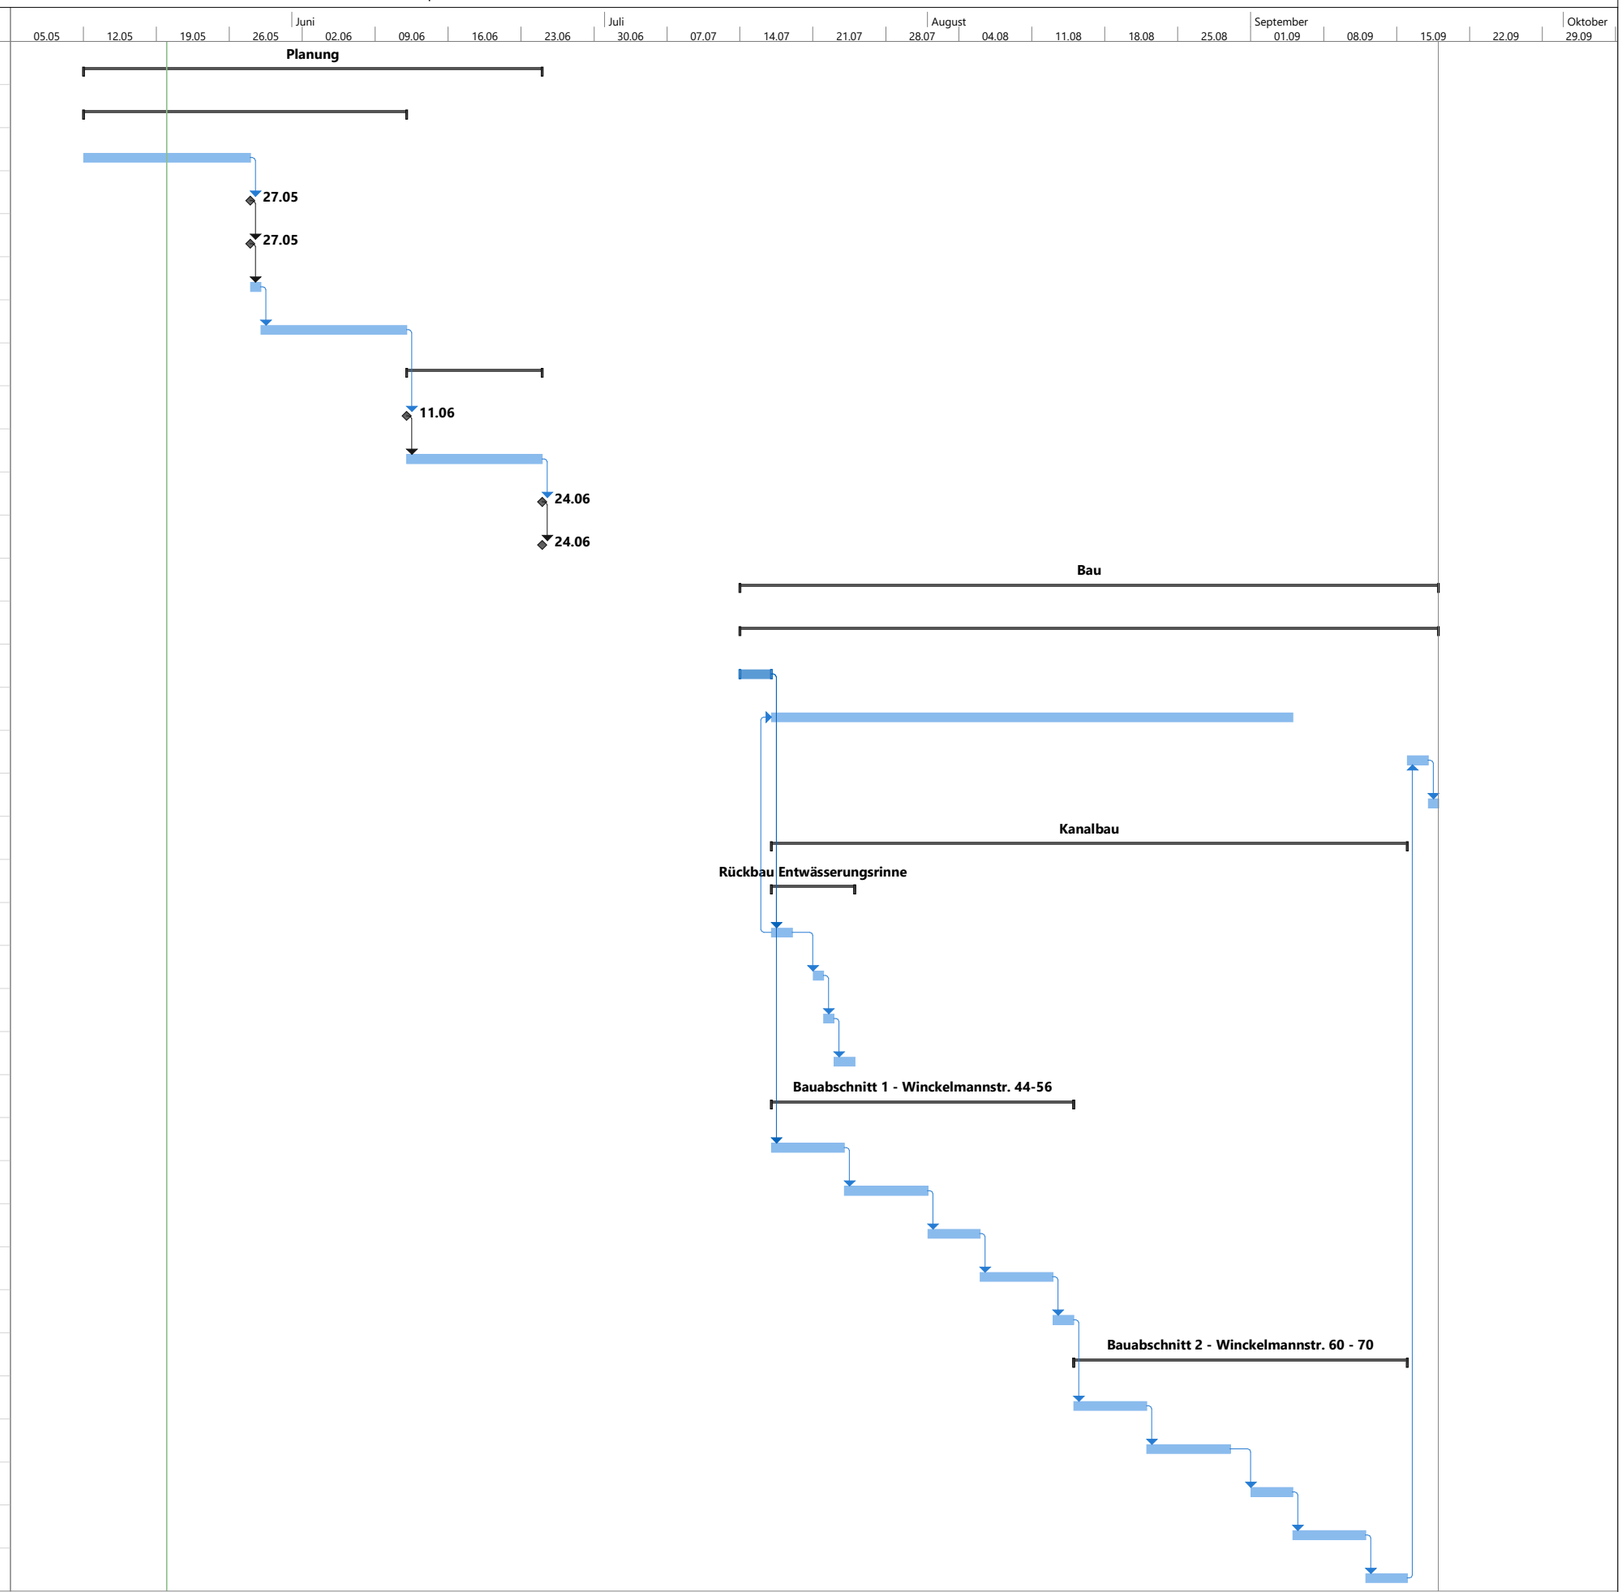Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	**Planung**	**32 Tage**	**Mon 12.05.25**	**Die 24.06.25**	
2	**Vorbereitung der Vergabe**	**23 Tage**	**Mon 12.05.25**	**Mit 11.06.25**	
3	LV, Formblätter, Annonce	12 Tage	Mon 12.05.25	Die 27.05.25	
4	Abgabe zur Freigabe LV, FB und Annonce	0 Tage	Die 27.05.25	Die 27.05.25	3
5	Freigabe Ausschreibungsunterlagen	0 Tage	Die 27.05.25	Die 27.05.25	4
6	Hochladen der e-Vergabe und Veröffentlichen	1 Tag	Mit 28.05.25	Mit 28.05.25	5
7	Kalkulationsfrist	10 Tage	Don 29.05.25	Mit 11.06.25	6
8	**Mitwirkung der Vergabe**	**9 Tage**	**Mit 11.06.25**	**Die 24.06.25**	
9	Submission	0 Tage	Mit 11.06.25	Mit 11.06.25	7
10	Prüfbericht/Vergabevorschlag	9 Tage	Don 12.06.25	Die 24.06.25	9
11	Technischer Ausschuss/Gemeinderat	0 Tage	Die 24.06.25	Die 24.06.25	10
12	Beauftragung	0 Tage	Die 24.06.25	Die 24.06.25	11
13	**Bau**	**49 Tage**	**Mon 14.07.25**	**Don 18.09.25**	
14	**Baustelleneinrichtung**	**49 Tage**	**Mon 14.07.25**	**Don 18.09.25**	
15	Baustelle einrichten	3 Tage	Mon 14.07.25	Mit 16.07.25	
16	Vorflutsicherung	36 Tage	Don 17.07.25	Don 04.09.25	21AA
17	Baustelle räumen	2 Tage	Die 16.09.25	Mit 17.09.25	36
18	VOB-Abnahme	1 Tag	Don 18.09.25	Don 18.09.25	17
19	**Kanalbau**	**43 Tage**	**Don 17.07.25**	**Mon 15.09.25**	
20	**Rückbau Entwässerungsrinne**	**6 Tage**	**Don 17.07.25**	**Don 24.07.25**	
21	Oberflächenaufbruch + Erdaushub	2 Tage	Don 17.07.25	Fre 18.07.25	15
22	Rückbau Rinne	1 Tag	Mon 21.07.25	Mon 21.07.25	21
23	Neubau Straßenablauf + AL	1 Tag	Die 22.07.25	Die 22.07.25	22
24	Verfüllung und Oberflächenwiederherstellung	2 Tage	Mit 23.07.25	Don 24.07.25	23
25	**Bauabschnitt 1 - Winckelmannstr. 44-56**	**21 Tage**	**Don 17.07.25**	**Don 14.08.25**	
26	Oberflächenaufbruch + Erdaushub	5 Tage	Don 17.07.25	Mit 23.07.25	15
27	Herstellen und Anbinden Anschlussleitung auf RWK	6 Tage	Don 24.07.25	Don 31.07.25	26
28	Neubau Straßenablauf	3 Tage	Fre 01.08.25	Die 05.08.25	27
29	Verfüllung und Oberflächenwiederherstellung	5 Tage	Mit 06.08.25	Die 12.08.25	28
30	Baustelle und Verkehrssicherung umsetzen	2 Tage	Mit 13.08.25	Don 14.08.25	29
31	**Bauabschnitt 2 - Winckelmannstr. 60 - 70**	**22 Tage**	**Fre 15.08.25**	**Mon 15.09.25**	
32	Oberflächenaufbruch + Erdaushub	5 Tage	Fre 15.08.25	Don 21.08.25	30
33	Herstellen und Anbinden Anschlussleitung auf RWK	6 Tage	Fre 22.08.25	Fre 29.08.25	32
34	Neubau Straßenablauf	4 Tage	Mon 01.09.25	Don 04.09.25	33
35	Verfüllung und Oberflächenwiederherstellung	5 Tage	Fre 05.09.25	Don 11.09.25	34
36	Umsetzen Verkehrssicherung	2 Tage	Fre 12.09.25	Mon 15.09.25	35
