Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	%	Vorgänger	Nachfolger	VE B	Attribut1
1	**Kombibecken biologische Stufe E, Verteilerbauwerk, Verdichterstation 3, Chemikalienlager- und Dosierstationen, MSV/Trafo/NSV**	**2476 Tage**	**Die 09.04.19**	**Mon 26.03.29**	**59%**				**Nein**
2	**LPH 4 Genehmigungsplanung/Genehmigung**	**1001 Tage**	**Die 07.05.19**	**Don 29.06.23**	**100%**				**Nein**
5	**Bestellung Ingenieurleistungen (ARGE PGR)**	**478 Tage**	**Die 22.03.22**	**Fre 22.03.24**	**100%**				**Nein**
9	**Fortführung Planungsaufgabe nach Projektunterbrechung ab 2023**	**0 Tage**	**Mit 17.05.23**	**Mit 17.05.23**	**100%**	**6EA-95 Tage;**	**12EA+20 Tage;13EA+20 Tag**		Nein
10	**Externe Fachplaner/Gutachter verfügbar ab (Beauftragung LWW)**	**1270 Tage**	**Die 09.04.19**	**Fre 19.07.24**	**0%**				**Nein**
23	**LPH 1-3 Vorphase A-Planung (Wiederholungsleistungen Basis für weitergehende A-Planung)**	**285 Tage**	**Mit 17.05.23**	**Mit 24.07.24**	**96%**				**Nein**
73	**LPH 5 Ausführungsplanung**	**330 Tage**	**Mon 11.12.23**	**Fre 02.05.25**	**95%**				**Nein**
74	**Überführung baureife Planung in ausführungsreife Planung (Detailplanung)**	**220 Tage**	**Mon 11.12.23**	**Die 12.11.24**	**100%**				**Nein**
97	**Tragwerksplanung (Wiederholung LPH 4, 5 und Prüfung)**	**230 Tage**	**Mon 27.05.24**	**Fre 02.05.25**	**87%**				**Nein**
98	Anpassung Genehmigungsplanung (Statische Bemessung Bauwerke, Verbau)	25 Tage	Mon 24.06.24	Mit 02.10.24	95%	82	11AA-20 Tage;19AA-20 Tage		Nein
99	Anpassung Ausführungsplanung	80 Tage	Mon 27.05.24	Fre 13.09.24	99%	76	100		Nein
100	Erstellen Schalpläne, Bewehrungspläne, Listen (Bauwerke)	150 Tage	Mon 16.09.24	Fre 02.05.25	80%	99;95	101AA		Nein
101	**Freigabelauf Prüfstatiker Bauwerke, Verbau (Genehmigungsbehörde)**	**150 Tage**	**Mon 16.09.24**	**Fre 02.05.25**	**80%**	**100AA**			**Nein**
102	**LPH 6 Vorbereiten der Vergabe (Ausschreibungen)**	**457 Tage**	**Don 28.03.24**	**Fre 23.01.26**	**76%**			**LPH 6 -Sammelvorgang**	**Nein**
103	**Vergabeeinheiten national 20 % Anteil (< 1 Mio EUR, netto je VE)**	**140 Tage**	**Don 28.03.24**	**Don 17.10.24**	**100%**			**LPH 6 -Sammelvorgang 20 %**	**Nein**
129	**Vergabeeinheiten international 80 % Anteil (VS - Sektoren-AG)**	**380 Tage**	**Mon 22.07.24**	**Fre 23.01.26**	**67%**			**LPH 6 -Sammelvorgang 80 %**	**Nein**
130	**VE B 05 - Baugrube Biologie E / Wasserhaltung E, VS, ZPW**	**64 Tage**	**Mon 22.07.24**	**Fre 18.10.24**	**100%**			**LPH 6 - VE B 05**	**Nein**
135	**VE B 13 - Baugrube Biologie E, Entsorungsstelle kontaminierte Böden**	**64 Tage**	**Mon 22.07.24**	**Fre 18.10.24**	**100%**			**LPH 6 - VE B 05**	**Nein**
140	**VE B 06 - Bauarbeiten / Ausbau**	**105 Tage**	**Mon 17.02.25**	**Fre 11.07.25**	**23%**			**LPH 6 - VE B 06**	**Nein**
141	Erstellung Verdingungsunterlagen	60 Tage	Mon 17.02.25	Fre 09.05.25	40%	151	142	LPH 6 - VE B 06	Nein
142	Prüfung durch LWW	20 Tage	Mon 12.05.25	Fre 06.06.25	0%	141	143	LPH 6 - VE B 06	Nein
143	Überarbeitung Verdingungsunterlagen	10 Tage	Mon 09.06.25	Fre 20.06.25	0%	142	144	LPH 6 - VE B 06	Nein
144	Freigabe Verdingungsunterlagen durch LWW	15 Tage	Mon 23.06.25	Fre 11.07.25	0%	143	268	LPH 6 - VE B 06	Nein
145	**VE B 07 - Technische Installationen**	**80 Tage**	**Mon 16.09.24**	**Fre 24.01.25**	**100%**			**LPH 6 - VE B 07**	**Nein**
150	**VE B 08 - Belüftung / Umwälzung**	**85 Tage**	**Mit 27.11.24**	**Fre 11.04.25**	**100%**			**LPH 6 - VE B 08**	**Nein**
155	**VE B 09 - Räumeinrichtungen**	**67 Tage**	**Don 23.10.25**	**Fre 23.01.26**	**0%**			LPH 6 - VE B 09	**Nein**
160	**VE B 10 - Lager- und Dosieranlagen**	**63 Tage**	**Mon 28.07.25**	**Mit 22.10.25**	**0%**			**LPH 6 - VE B 10**	**Nein**
165	**VE B 11 - E-MSR-Technik**	**95 Tage**	**Mon 19.08.24**	**Fre 17.01.25**	**100%**			**LPH 6 - VE B 11**	**Nein**
170	**LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe (E-Vergaben), ohne Auftrag ARGE PGR**	**486 Tage**	**Die 04.06.24**	**Die 05.05.26**	**48%**			**LPH 7 -Sammelvorgang**	**Nein**
171	**Vorinformation gemäß § 12 VS der VOB / A**	**0 Tage**	**Die 04.06.24**	**Die 04.06.24**	**100%**	**186AA-8 Tage**		**LPH 7 -Sammelvorgang**	Nein
172	**Vergabeeinheiten national 20 % Anteil (< 1 Mio EUR, netto je VE)**	**149 Tage**	**Fre 14.06.24**	**Mit 29.01.25**	**100%**			**LPH 7 -Sammelvorgang 20 %**	**Nein**
236	**Vergabeeinheiten international 80 % Anteil (VS - Sektoren-AG)**	**388 Tage**	**Mon 21.10.24**	**Die 05.05.26**	**33%**			**LPH 7 -Sammelvorgang 80 %**	**Nein**
237	**VE B 05- Baugrube Biologie E / Wasserhaltung E, VS, ZPW (Offenes Verfahren)**	**69 Tage**	**Mon 21.10.24**	**Mit 12.02.25**	**100%**			LPH 7 - VE B 05	**Nein**
238	Auftragsbekanntmachung an EU- Amt für Veröffentlichung übermittelt	5 Tage	Mon 21.10.24	Fre 25.10.24	100%	134	239EE	LPH 7 - VE B 05	Nein
239	Bekanntmachung gemäß § 12 VS der VOB / A	0 Tage	Fre 25.10.24	Fre 25.10.24	100%	238EE	240	LPH 7 - VE B 05	Nein
240	Zugriff Bieter auf den E-Vergabemanager ab	1 Tag	Mon 28.10.24	Mon 28.10.24	100%	239	241AA	LPH 7 - VE B 05	Nein
241	Angebotsfrist gemäß § 10 VS der VOB / A	42 fTage	Mon 28.10.24	Mon 09.12.24	100%	240AA	242EE	LPH 7 - VE B 05	Nein
242	Submission (Bindefrist 80 Kalendertage)	0 Tage	Mon 09.12.24	Mon 09.12.24	100%	241EE	243;244	LPH 7 - VE B 05	Nein
243	Rechnerische Prüfung der Angebote	3 Tage	Mon 09.12.24	Mit 11.12.24	100%	242		LPH 7 - VE B 05	Nein
244	Prüfung der Angebote auf Vollständigkeit VOB/A	3 Tage	Mon 09.12.24	Mit 11.12.24	100%	242	245	LPH 7 - VE B 05	Nein
245	Aufforderung fehlende Unterlagen nachzureichen (VOB/A § 16 VS)	6 fTage	Mit 11.12.24	Die 17.12.24	100%	244	246	LPH 7 - VE B 05	Nein
246	Prüfung und Wertung der Angebote und nachgereichten Unterlagen	5 Tage	Mit 18.12.24	Die 24.12.24	100%	245	247EE	LPH 7 - VE B 05	Nein
247	Vergabevermerk	5 Tage	Mit 18.12.24	Die 24.12.24	100%	246EE	248	LPH 7 - VE B 05	Nein
248	Bestellschreiben	5 Tage	Mon 13.01.25	Fre 17.01.25	100%	247	249	LPH 7 - VE B 05	Nein
249	Unterschriftslauf Bestellung AG	10 Tage	Mon 20.01.25	Fre 31.01.25	100%	248	250	LPH 7 - VE B 05	Nein
250	Bieterinformation nach § 19 VS VOB / A, elektronisch	10 fTage	Fre 31.01.25	Mon 10.02.25	100%	249	251EA+1 Tag	LPH 7 - VE B 05	Nein
251	Auftragsvergabe	1 Tag	Mit 12.02.25	Mit 12.02.25	100%	250EA+1 Tag	365EA+13 Tage	LPH 7 - VE B 05	Nein
252	**VE B 13- Baugrube Biologie E, Entsorgungsstelle kontaminierte Böden**	**69 Tage**	**Mon 21.10.24**	**Mit 12.02.25**	**100%**			LPH 7 - VE B 05	**Nein**
267	**VE B 06 - Bauarbeiten / Ausbau (Offenes Verfahren)**	**119 Tage**	**Mon 14.07.25**	**Fre 26.12.25**	**0%**			**LPH 7 - VE B 06**	**Nein**
268	Auftragsbekanntmachung an EU- Amt für Veröffentlichung übermittelt	5 Tage	Mon 14.07.25	Fre 18.07.25	0%	144	269EE	LPH 7 - VE B 06	Nein
269	Bekanntmachung gemäß § 12 VS der VOB / A	0 Tage	Fre 18.07.25	Fre 18.07.25	0%	268EE	270	LPH 7 - VE B 06	Nein
270	Zugriff Bieter auf den E-Vergabemanager ab	1 Tag	Mon 21.07.25	Mon 21.07.25	0%	269	271AA	LPH 7 - VE B 06	Nein
271	Angebotsfrist gemäß § 10 VS der VOB / A	42 fTage	Mon 21.07.25	Mon 01.09.25	0%	270AA	272EE	LPH 7 - VE B 06	Nein
272	Submission (Bindefrist 80 Kalendertage)	0 Tage	Mon 01.09.25	Mon 01.09.25	0%	271EE	273;274	LPH 7 - VE B 06	Nein
273	Rechnerische Prüfung der Angebote	3 Tage	Mon 01.09.25	Mit 03.09.25	0%	272		LPH 7 - VE B 06	Nein
274	Prüfung der Angebote auf Vollständigkeit VOB/A	6 Tage	Mon 01.09.25	Mon 08.09.25	0%	272	275	LPH 7 - VE B 06	Nein
275	Aufforderung fehlende Unterlagen nachzureichen (VOB/A § 16 VS)	6 fTage	Mon 08.09.25	Son 14.09.25	0%	274	276	LPH 7 - VE B 06	Nein
276	Prüfung und Wertung der Angebote und nachgereichten Unterlagen	5 Tage	Mon 15.09.25	Fre 19.09.25	0%	275	277EE	LPH 7 - VE B 06	Nein
277	Vergabevermerk	5 Tage	Mon 15.09.25	Fre 19.09.25	0%	276EE	278	LPH 7 - VE B 06	Nein
278	Bestellschreiben	5 Tage	Mon 22.09.25	Fre 26.09.25	0%	277	279	LPH 7 - VE B 06	Nein
279	Unterschriftslauf Bestellung AG	10 Tage	Mon 29.09.25	Fre 10.10.25	0%	278	280	LPH 7 - VE B 06	Nein
280	Bieterinformation nach § 19 VS VOB / A, elektronisch	10 fTage	Fre 10.10.25	Mon 20.10.25	0%	279		LPH 7 - VE B 06	Nein
281	Auftragsvergabe	0 Tage	Fre 26.12.25	Fre 26.12.25	0%	366AE-6 Tage		LPH 7 - VE B 06	Nein
282	**VE B 07 - Technische Installationen (Offenes Verfahren)**	**77 Tage**	**Mon 27.01.25**	**Die 13.05.25**	**67%**			**LPH 7 - VE B 07**	**Nein**
297	**VE B 08 - Belüftung / Umwälzung (Offenes Verfahren)**	**72 Tage**	**Mon 14.04.25**	**Die 22.07.25**	**0%**			**LPH 7 - VE B 08**	**Nein**
312	**B VE 09 - Räumeinrichtungen (Offenes Verfahren)**	**72 Tage**	**Mon 26.01.26**	**Die 05.05.26**	**0%**			**LPH 7 - VE B 09**	**Nein**
327	**VE B 10 - Lager- und Dosieranlagen (Offenes Verfahren)**	**69 Tage**	**Don 23.10.25**	**Die 27.01.26**	**0%**			**LPH 7 - VE B 10**	**Nein**
342	**VE B 11 - E-MSR-Technik (Offenes Verfahren) - 2 Teilnahmewettbewerbe**	**107 Tage**	**Mon 20.01.25**	**Die 17.06.25**	**0%**			**LPH 7 - VE B 11**	**Nein**
357	**LPH 8 Bauausführung**	**2476 Tage**	**Die 09.04.19**	**Mon 26.03.29**	**8%**			**LPH 8 -Sammelvorgang**	**Nein**
358	**Bauausführung Biologie E (VE B 01 bis VE B 11)**	**2476 Tage**	**Die 09.04.19**	**Mon 26.03.29**	**8%**			**LPH 8 -Sammelvorgang**	**Nein**
359	**W+M, Fertigungs - und Lieferzeiten**	**623 Tage**	**Fre 02.08.24**	**Die 12.01.27**	**15%**			**LPH 8 -Sammelvorgang WM**	**Nein**
360	**Vorbereitungsphase / Werk- und Montageplanung**	**503 Tage**	**Fre 02.08.24**	**Die 28.07.26**	**20%**			**LPH 8 -Sammelvorgang WM**	**Nein**
361	VE B 01 - Fäll- und Rodungsarbeiten	11 Tage	Fre 18.10.24	Mon 04.11.24	100%	185EA+10 Tage	375	LPH 8 - VE B 01 - WM	Nein
362	VE B 02 - Kampfmittelprüfung Biologie	10 Tage	Fre 02.08.24	Don 15.08.24	100%	197	376	LPH 8 - VE B 02 - WM	Nein
363	VE B 03 - Baufeldräumung BT	10 Tage	Mon 12.08.24	Fre 23.08.24	100%	209	377	LPH 8 - VE B 03 - WM	Nein
364	VE B 04 - Baustromversorgung	10 Tage	Don 30.01.25	Mit 12.02.25	100%	235	378	LPH 8 - VE B 04 - WM	Nein
365	VE B 05 - Baugrube Biologie E / Wasserhaltung E, VS, ZPW	34 Tage	Die 04.03.25	Fre 18.04.25	100%	251EA+13 Tage	379	LPH 8 - VE B 05 - WM	Nein
366	VE B 06 - Bauarbeiten / Ausbau	10 Tage	Mon 05.01.26	Mon 19.01.26	0%	380AE	281AE-6 Tage	LPH 8 - VE B 06 - WM	Nein
367	VE B 07 - Technische Installationen	80 Tage	Mit 11.06.25	Die 30.09.25	0%	296EA+20 Tage	381	LPH 8 - VE B 07 - WM	Nein
368	VE B 08 - Belüftung / Umwälzung	60 Tage	Mit 23.07.25	Die 14.10.25	0%	311	382	LPH 8 - VE B 08 - WM	Nein
369	VE B 09 - Räumeinrichtungen	60 Tage	Mit 06.05.26	Die 28.07.26	0%	326	383	LPH 8 - VE B 09 - WM	Nein
370	VE B 10 - Lager- und Dosieranlagen	60 Tage	Mit 28.01.26	Die 21.04.26	0%	341	384	LPH 8 - VE B 10 - WM	Nein
371	VE B 11 - E-MSR-Technik	148 Tage	Mit 16.07.25	Fre 06.02.26	0%	356EA+20 Tage	385	LPH 8 - VE B 11 - WM	Nein

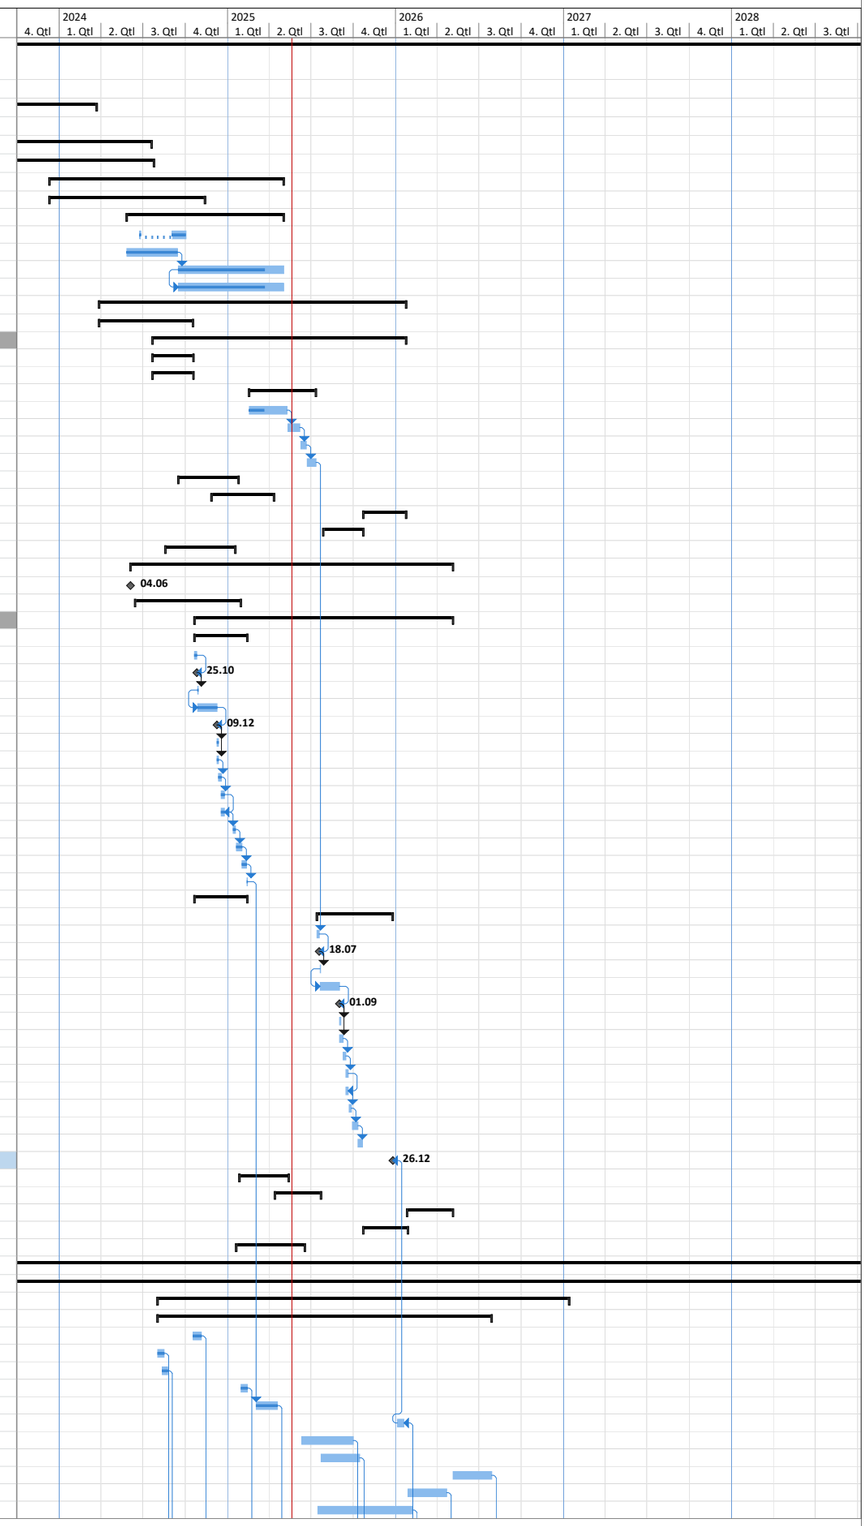

Projekt: 250519_KWL_TDP_BB_V
Datum: Mit 21.05.25

Vorgang	Sammelvorgang	Externer Meilenstein	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelrollup	Nur Ende	Manueller Fortschritt
Unterbrechung	Projektsammelvorgang	Inaktiver Vorgang	Manueller Vorgang	Manueller Sammelvorgang	Stichtag	VE B 06
Meilenstein	Externe Vorgänge	Inaktiver Meilenstein	Nur Dauer	Nur Anfang	In Arbeit	

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	%	Vorgänger	Nachfolger	VE B	Attribut1
372	VE B 12 - Baufeldräumung ET / Umverlegung Bestandskabel	20 Tage	Mon 26.08.24	Fre 20.09.24	100%	221	386	LPH 8 - VE B 12 - WM	Nein
373	VE B 13 - Baugrube Biologie E, Entsorungsstelle kontaminierte Böden	10 Tage	Don 13.02.25	Mit 26.02.25	90%	266	387		Nein
374	**Fertigungs- und Lieferzeiten**	**613 Tage**	**Fre 16.08.24**	**Die 12.01.27**	**11%**			**LPH 8 -Sammelvorgang FL**	**Nein**
375	VE B 01 - Fäll- und Rodungsarbeiten	0 Tage	Mon 04.11.24	Mon 04.11.24	100%	361	390	LPH 8 - VE B 01 - FL	Nein
376	VE B 02 - Kampfmittelprüfung Biologie	10 Tage	Fre 16.08.24	Don 29.08.24	100%	362	391	LPH 8 - VE B 02 - FL	Nein
377	VE B 03 - Baufeldräumung BT	5 Tage	Mon 26.08.24	Fre 30.08.24	100%	363	392	LPH 8 - VE B 03 - FL	Nein
378	VE B 04 - Baustromversorgung	37 Tage	Don 13.02.25	Fre 04.04.25	65%	364	393EA+1 Tag	LPH 8 - VE B 04 - FL	Nein
379	VE B 05 - Baugrube Biologie E / Wasserhaltung E, VS, ZPW	20 Tage	Mon 21.04.25	Fre 16.05.25	100%	365	397EA+4 Tage;398EA-5 Tage;4	LPH 8 - VE B 05 - FL	Nein
380	VE B 06 - Bauarbeiten / Ausbau	20 Tage	Mon 19.01.26	Mon 16.02.26	0%	408AE	366AE	LPH 8 - VE B 06 - FL	Nein
381	VE B 07 - Technische Installationen	120 Tage	Mit 01.10.25	Die 17.03.26	0%	367		LPH 8 - VE B 07 - FL	Nein
382	VE B 08 - Belüftung / Umwälzung	120 Tage	Mit 15.10.25	Die 31.03.26	0%	368		LPH 8 - VE B 08 - FL	Nein
383	VE B 09 - Räumeinrichtungen	120 Tage	Mit 29.07.26	Die 12.01.27	0%	369		LPH 8 - VE B 09 - FL	Nein
384	VE B 10 - Lager- und Dosieranlagen	120 Tage	Mit 22.04.26	Die 06.10.26	0%	370		LPH 8 - VE B 10 - FL	Nein
385	VE B 11 - E-MSR-Technik (mögliche erste Lieferung)	80 Tage	Mon 09.02.26	Fre 29.05.26	0%	371		LPH 8 - VE B 11 - Fl	Nein
386	VE B 12 - Baufeldräumung ET / Umverlegung Bestandskabel	15 Tage	Mon 23.09.24	Mon 14.10.24	100%	372		LPH 8 - VE B 12 - FL	Nein
387	VE B 13 - Baugrube Biologie E, Entsorungsstelle kontaminierte Böden	10 Tage	Don 27.02.25	Mit 12.03.25	0%	373			Nein
388	**Bauausführung VE**	**2476 Tage**	**Die 09.04.19**	**Mon 26.03.29**	**6%**				**Nein**
389	**Vorbereitende Arbeiten**	**290 Tage**	**Fre 30.08.24**	**Don 30.10.25**	**59%**			**Bauwerk**	**Nein**
390	**VE B 01 - Fällarbeiten (Fällzeiten beachten - Okt-Feb.)**	**21 Tage**	**Mon 21.10.24**	**Die 19.11.24**	**100%**	**375**		**VE B 01**	**Nein**
391	**VE B 02 - Kampfmittelprüfung Biologie E, Verteilerbauwerk und Verdichterstation (Verbauträger, Flächensondierung, Pfahlgründung)**	**290 Tage**	**Fre 30.08.24**	**Don 30.10.25**	**45%**	**376**		**VE B 02**	**Nein**
392	**VE B 03 / 12 - Baufeldräumung inkl. Kabelumverlegung, Rodung Biologie E, Verteilerbauwerk und Verdichterstation**	**140 Tage**	**Mon 02.09.24**	**Fre 04.04.25**	**85%**	**377**		**VE B 03; VE B 12**	**Nein**
393	**VE B 04 - Baustromversorgung GW-Haltung / Starkniederschlag (vorab Baustrom über Schaltschrank außen am Trafo 1+3)**	**7 Tage**	**Die 08.04.25**	**Mit 16.04.25**	**0%**	**378EA+1 Tag**		**VE B 04**	**Nein**
394	**Biologie E - Doppelstockbecken**	**2345 Tage**	**Die 09.04.19**	**Fre 22.09.28**	**2%**		**501**	**Bauwerk**	**Nein**
395	**VE B 05 / B 13 - Baugrube Biologie E / Wasserhaltung E, VS, ZPW**	**1665 Tage**	**Die 09.04.19**	**Fre 13.02.26**	**10%**				**Nein**
396	Deklaration Boden der B 03 auf dem Zwischenlager (Beyer)	15 Tage	Die 09.04.19	Don 02.05.19	100%				Nein
397	Rückbau Bestandsbauwerke / Kabelgraben Becken D (Kampfmittelverdachtspunkte)	30 Tage	Fre 23.05.25	Don 03.07.25	95%	379EA+4 Tage			Nein
398	Verbau Biologie E (Verbauträgerbohrungen)	27 Tage	Mon 12.05.25	Die 17.06.25	0%	379EA-5 Tage			Nein
399	**GW-Wasserhaltung / Starkniederschlagsbeseitigung**	**193 Tage**	**Mit 21.05.25**	**Fre 13.02.26**	**0%**				**Nein**
400	Brunnen herstellen und Einrichten der Wasserhaltungsanlagen/Testbetrieb	33 Tage	Mit 21.05.25	Fre 04.07.25	0%	379EA+2 Tage	401EA+3 Tage		Nein
401	GW-Absenkung bis Rückbauebene altes Bauwerk (Rückbau Bodenplatte), Absenkziel 100,00 mNN	117 Tage	Don 10.07.25	Fre 19.12.25	0%	400EA+3 Tage	402AA		Nein
402	**Aushub ab OK Gelände bis Rückbauebene altes Bauwerk, Rückbau Bodenplatte**	117 Tage	Don 10.07.25	Fre 19.12.25	0%	401AA	403EA-20 Tage	VE B 05	Ja
403	Vorlauf für Absenkung auf 97,70 mNN	40 Tage	Mon 24.11.25	Fre 16.01.26	0%	402EA-20 Tage	404		Nein
404	Dauer GW-Stand für Aushub bis UK Bodenaustausch, Absenkziel 97,00 mNN	20 Tage	Mon 19.01.26	Fre 13.02.26	0%	403	406;405AA-10 Tage		Nein
405	**Aushub bis UK Bodenaustausch, Bodenaustausch**	30 Tage	Mon 05.01.26	Fre 13.02.26	0%	404AA-10 Tage	434;411EA+30 Tage	VE B 05	Ja
406	GW-Stand auf 100,00 mNN nach Bodenaustausch einstellen	0 Tage	Fre 13.02.26	Fre 13.02.26	0%	404	410;408		Nein
407	**VE B 06 - Bauarbeiten / Ausbau**	**580 Tage**	**Mon 16.02.26**	**Fre 05.05.28**	**0%**			**VE B 06 - Sammelvorgang**	**Nein**
408	Baustelleneinrichtung	15 Tage	Mon 16.02.26	Fre 06.03.26	0%	406	411;380AE		Nein
409	**Wasserhaltung Starkniederschlagsbeseitigung (Betrieb durch VE B05)**	**230 Tage**	**Mon 16.02.26**	**Fre 01.01.27**	**0%**				**Nein**
410	GW-Stand, Betrieb Einrichtung von B05 mit 100,00 mNN	80 Tage	Mon 16.02.26	Fre 05.06.26	0%	406			Nein
411	Biologie E, StB-Sohlen bis 102,00 mNN	80 Tage	Mon 30.03.26	Fre 17.07.26	0%	405EA+30 Tage	472EE;435AA+80 Tage;488AA;	VE B 06	Nein
412	GW-Stand, Betrieb Einrichtung von B05 mit 101,00 mNN	120 Tage	Mon 20.07.26	Fre 01.01.27	0%	411	413AA		Nein
413	Biologie E, StB-Wände bis 105,00 mNN	120 Tage	Mon 20.07.26	Fre 01.01.27	0%	412AA	414EE;415		Nein
414	Erdverlegte Rohrleitungen	120 Tage	Mon 20.07.26	Fre 01.01.27	0%	413EE	446EE;436EE	VE B 06	Nein
415	Biologie E, StB-Bauteile über 105,00 mNN	350 Tage	Mon 04.01.27	Fre 05.05.28	0%	413	420;425;428;417EA-40 Tage;4	VE B 06	Nein
416	**VE B 07 - Technische Installationen**	**140 Tage**	**Mon 13.03.28**	**Fre 22.09.28**	**0%**		**431EE**	**VE B 07 - Sammelvorgang**	**Nein**
424	**VE B 08 - Belüftung / Umwälzung**	**100 Tage**	**Mon 08.05.28**	**Fre 22.09.28**	**0%**		**431EE**	**VE B 08 - Sammelvorgang**	**Nein**
427	**VE B 09 - Räumeinrichtungen**	**100 Tage**	**Mon 08.05.28**	**Fre 22.09.28**	**0%**		**431EE**	**VE B 09 - Sammelvorgang**	**Nein**
430	**VE B 11 - E-MSR-Technik**	**100 Tage**	**Mon 08.05.28**	**Fre 22.09.28**	**0%**			**VE B 11 - Sammelvorgang**	**Nein**
432	**Verteilerbauwerk / Zwischenpumpwerk**	**230 Tage**	**Mon 16.02.26**	**Fre 01.01.27**	**0%**		**501**	**Bauwerk**	**Nein**
433	**VE B 06 - Bauarbeiten / Ausbau**	**230 Tage**	**Mon 16.02.26**	**Fre 01.01.27**	**0%**			VE B 06 - Sammelvorgang	**Nein**
437	**VE B 07 - Technische Installationen**	**30 Tage**	**Mon 14.09.26**	**Fre 23.10.26**	**0%**			**VE B 07 - Sammelvorgang**	**Nein**
440	**VE B 11 - E-MSR-Technik**	**40 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Fre 18.12.26**	**0%**			**VE B 11 - Sammelvorgang**	**Nein**
442	**Verdichterstation**	**520 Tage**	**Mon 16.02.26**	**Fre 11.02.28**	**0%**		**501**	**Bauwerk**	**Nein**
443	**VE B 06 - Bauarbeiten / Ausbau**	**320 Tage**	**Mon 16.02.26**	**Fre 07.05.27**	**0%**			VE B 06 - Sammelvorgang	**Nein**
447	**VE B 07 - Technische Installationen**	**80 Tage**	**Mon 05.07.27**	**Fre 22.10.27**	**0%**			**VE B 07 - Sammelvorgang**	**Nein**
450	**VE B 08 - Belüftung / Umwälzung**	**100 Tage**	**Mon 10.05.27**	**Fre 24.09.27**	**0%**				**Nein**
452	**VE B 11 - E-MSR-Technik**	**100 Tage**	**Mon 27.09.27**	**Fre 11.02.28**	**0%**			**VE B 11 - Sammelvorgang**	**Nein**
454	**Chemikaliendosierstationen (FM/FHM/C)**	**440 Tage**	**Mon 14.09.26**	**Fre 19.05.28**	**0%**		**501**	**Bauwerk**	**Nein**
455	**VE B 06 - Bauarbeiten / Ausbau**	**280 Tage**	**Mon 14.09.26**	**Fre 08.10.27**	**0%**			VE B 06 - Sammelvorgang	**Nein**
459	**VE B 10 - Lager- und Dosieranlagen**	**140 Tage**	**Mon 19.07.27**	**Fre 28.01.28**	**0%**		**462**	**VE B 10 - Sammelvorgang**	**Nein**
461	**VE B 11 - E-MSR-Technik**	**80 Tage**	**Mon 31.01.28**	**Fre 19.05.28**	**0%**			**VE B 11 - Sammelvorgang**	**Nein**
463	**RÜS-Pumpstation 1 (ÜSS / BRW)**	**30 Tage**	**Mon 03.07.28**	**Fre 11.08.28**	**0%**				**Nein**
464	**VE B 07 - Technische Installationen**	**15 Tage**	**Mon 03.07.28**	**Fre 21.07.28**	**0%**				**Nein**
467	**VE B 11 - E-MSR-Technik**	**15 Tage**	**Mon 24.07.28**	**Fre 11.08.28**	**0%**				**Nein**
469	**Anschlussverrohrung Bio D**	**130 Tage**	**Mon 30.03.26**	**Fre 25.09.26**	**0%**			**Bauwerk**	**Nein**
470	**VE B 06 - Bauarbeiten / Ausbau**	**80 Tage**	**Mon 30.03.26**	**Fre 17.07.26**	**0%**			VE B 06 - Sammelvorgang	**Nein**
473	**VE B 07 - Technische Installationen**	**40 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Fre 11.09.26**	**0%**			**VE B 07 - Sammelvorgang**	**Nein**
475	**VE B 11 - E-MSR-Technik**	**10 Tage**	**Mon 14.09.26**	**Fre 25.09.26**	**0%**			**VE B 11 - Sammelvorgang**	**Nein**
477	**Schwimmschlammseparationsschacht BIO E**	**45 Tage**	**Mon 05.06.28**	**Fre 04.08.28**	**0%**				**Nein**
478	**VE B 06 - Bauarbeiten / Ausbau**	**35 Tage**	**Mon 05.06.28**	**Fre 21.07.28**	**0%**				**Nein**
481	**VE B 07 - Technische Installationen**	**6 Tage**	**Mon 24.07.28**	**Mon 31.07.28**	**0%**				**Nein**
484	**VE B 11 - E-MSR-Technik**	**2 Tage**	**Don 03.08.28**	**Fre 04.08.28**	**0%**				**Nein**
486	**Entlastungskanal**	**200 Tage**	**Mon 30.03.26**	**Fre 01.01.27**	**0%**				**Nein**
487	**VE B 06 - Bauarbeiten / Ausbau**	**200 Tage**	**Mon 30.03.26**	**Fre 01.01.27**	**0%**				**Nein**
489	**Ablaufschacht/Rohrleitung bis vorhandenen Ablaufschacht**	**121 Tage**	**Mon 09.10.28**	**Mon 26.03.29**	**0%**				**Nein**
490	**VE B 06 - Bauarbeiten / Ausbau**	**110 Tage**	**Mon 09.10.28**	**Fre 09.03.29**	**0%**				**Nein**
493	**VE B 07 - Technische Installationen**	**21 Tage**	**Mon 26.02.29**	**Mon 26.03.29**	**0%**				**Nein**
498	**Entässerungsarbeiten KW-Gelände**	**320 Tage**	**Mon 04.01.27**	**Fre 24.03.28**	**0%**	**436;446**	**499AA+100 Tage**		**Nein**
499	**Kabelwegebau KW Gelände, Mastleuchten, Steckdosenkombis**	**260 Tage**	**Mon 24.05.27**	**Fre 19.05.28**	**0%**	**498AA+100 Ta**	**485**		**Nein**
500	**Straßen- /Wegebau, Außenanlagen**	**100 Tage**	**Mon 08.05.28**	**Fre 22.09.28**	**0%**	**415**			**Nein**
501	**Inbetriebnahme**	**0 Tage**	**Fre 22.09.28**	**Fre 22.09.28**	**0%**	**394;442;454;4**	**502**	**Inbetriebnahme**	Nein
502	**Probebetrieb**	**14 fTage**	**Fre 22.09.28**	**Fre 06.10.28**	**0%**	**501**	**491**	**Probebetrieb**	Nein

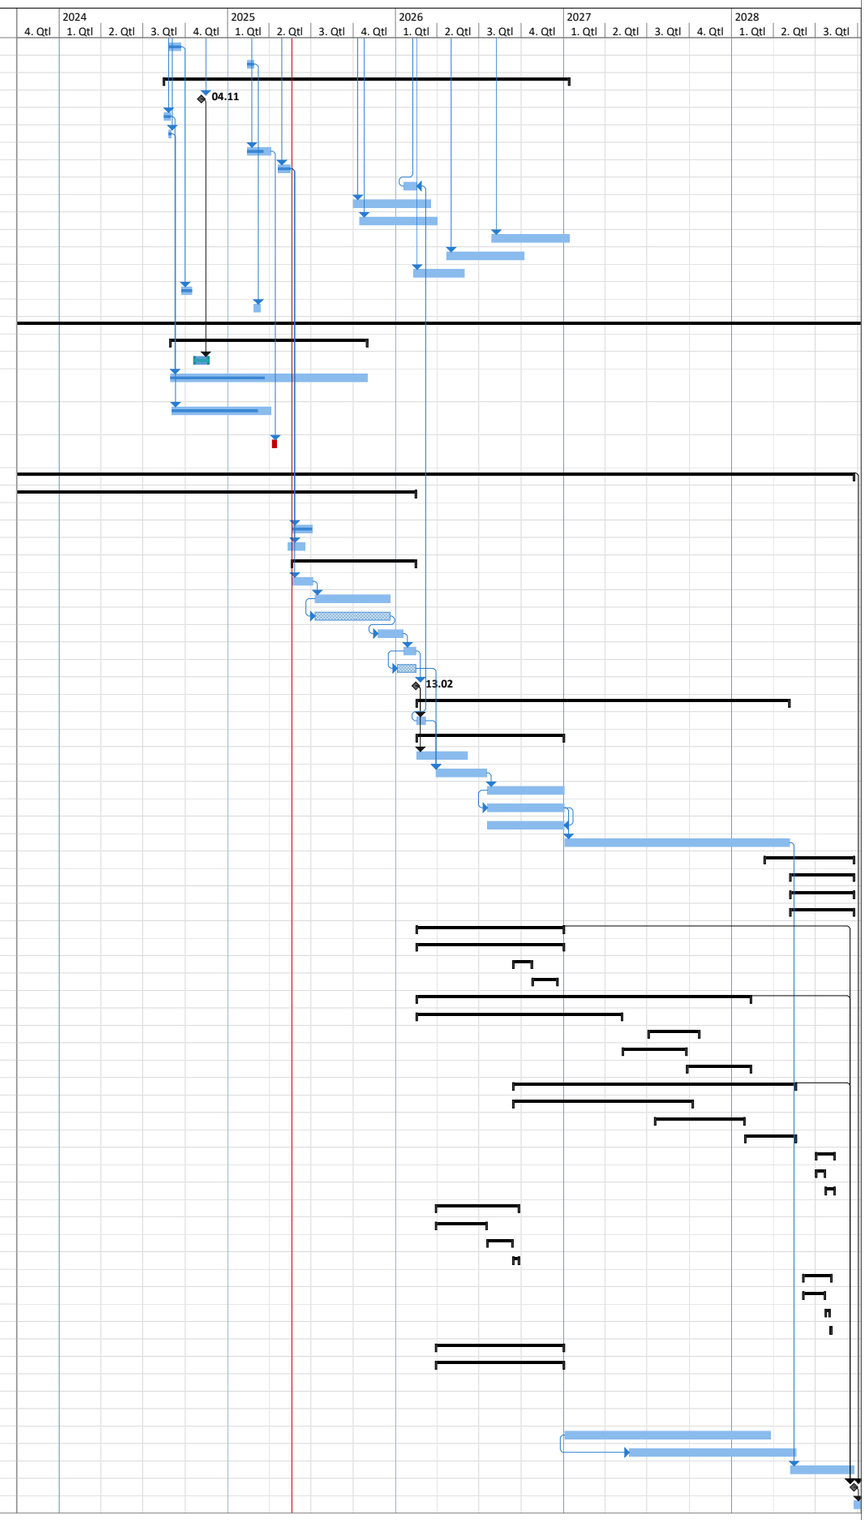

Projekt: 250519_KWL_TDP_BB_V
Datum: Mit 21.05.25

Vorgang	Sammelvorgang	Externer Meilenstein	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelrollup	Nur Ende	Manueller Fortschritt
Unterbrechung	Projektsammelvorgang	Inaktiver Vorgang	Manueller Vorgang	Manueller Sammelvorgang	Stichtag	VE B 06
Meilenstein	Externe Vorgänge	Inaktiver Meilenstein	Nur Dauer	Nur Anfang	In Arbeit	
