Grobablaufplan zur Baumaßnahme
Ersatzneubau der Stützwand IV/W03 Riedelstraße in Leipzig

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Ersatzneubau Stützwand Riedelstraße Leipzig**	391 Tage?	Mit 01.10.25	Mit 31.03.27
2	**Bauzeiträume der einzelnen Bauphasen**	478 Tage?	Mon 02.06.25	Mit 31.03.27
3	Sperrung der Riedelstraße	391 Tage?	Mit 01.10.25	Mit 31.03.27
4	Verkehrsfreigabe Riedelstraße	1 Tag?	Mit 31.03.27	Mit 31.03.27
5	Halbseitige Sperrung (wechselseitig) der Eilenburger Straße	351 Tage?	Don 20.11.25	Don 25.03.27
6	Vollsperrung Eilenburger Str. (Einmündung Riedelstraße)	7 Tage?	Don 23.10.25	Fre 31.10.25
7	Bauphase 0 Vorleistungen in Regie des AG und der Versorgungsträger	380 Tage	Mon 02.06.25	Fre 13.11.26
8	Bauphase 1 Arbeitsvorbereitung	60 Tage?	Mit 01.10.25	Die 23.12.25
9	Bauphase 2 Abbrucharbeiten und Verbauarbeiten	128 Tage?	Fre 07.11.25	Die 05.05.26
10	Bauphase 3 Neubau Stützwand	144 Tage	Mit 03.12.25	Mit 24.06.26
11	Bauphase 4 Ertüchtigung Bestandswand (0+001,1 - 0+047,2)	94 Tage?	Die 23.06.26	Fre 30.10.26
12	Bauphase 5 Komplettierung der gesamten Stützwand	26 Tage?	Don 10.09.26	Don 15.10.26
13	Bauphase 6 Straßenbauarbeiten Riedelstraße und Eilenburger Straße	159 Tage?	Don 23.10.25	Fre 26.03.27
14	Bauphase 7 Landschaftspflegerische Arbeiten	335 Tage?	Mon 03.11.25	Fre 12.02.27
15	Bauphase 8 Baufeldberäumung und Verkehrsfreigabe	143 Tage?	Mon 14.09.26	Mit 31.03.27
16	**Bauvorbereitende Arbeiten Stützwand und Ausbau Riedelstraße**	406 Tage?	Mon 02.06.25	Mon 21.12.26
17	**Bauphase 0 Vorleistungen in Regie des AG und/oder der Versorgungsträger**	406 Tage?	Mon 02.06.25	Mon 21.12.26
18	**Leipziger Wasserwerke, Maßnahmen vor Baubeginn Stützwand**	87 Tage?	Mon 02.06.25	Die 30.09.25
19	LWW: Erneuerung der TWL DN100 GG zw. Schieber 64341 - 7047	87 Tage?	Mon 02.06.25	Die 30.09.25
20	LWW: Anordnung einer neuen Leitung im Bereich der Eilenburger Straße außerhalb der MTA-Maßnahme	85 Tage?	Mon 02.06.25	Fre 26.09.25
21	LWW: Mischwasserkanal mit Inliner verstärken,Schacht 28880200 - 28880457	87 Tage?	Mon 02.06.25	Die 30.09.25
22	**Netz Leipzig, FB Gas; Maßnahmen vor Baubeginn Stützwand**	87 Tage?	Mon 02.06.25	Die 30.09.25
23	Neuverlegung der HD DN200 entlang der Riedelstraße ab Eilenburger Straße bis Stat. 116,6 einschließlich Aushub,Wiederverfüllung und Verdichtung	87 Tage?	Mon 02.06.25	Die 30.09.25
24	Demontage und Sicherung Schaltschrank Stat. 0+117 STW	1 Tag?	Die 30.09.25	Die 30.09.25
25	Temporäre Umbindung alt/neu bei Stat. 116,6	87 Tage?	Mon 02.06.25	Die 30.09.25
26	Endgültige An-/Umbindung der HD DN200 in der Eilenburger Straße	87 Tage?	Mon 02.06.25	Die 30.09.25
27	Wiedereinbau des ausgebauten Schaltschranks Stat. 0+117 STW	15 Tage?	Mon 16.11.26	Fre 04.12.26
28	**Netz Leipzig, FB Gas; mit MTA-Maßnahme gleichlaufende Arbeiten**	110 Tage	Mon 10.11.25	Fre 10.04.26
29	Ausbau Gasltg. (alt) Riedelstraße	20 Tage	Mon 10.11.25	Fre 05.12.25
30	Parkseitige Verlegung und Anbindung der HD DN200 (neu) nach Plan Netz Leipzig einschl. Aushub u. Verfüllung/VerdichtungRohrgräben sowie HD Leitung (neu): An-u. Umbindung ab Stat. 0+116,6 durch Block 1/Falleitung: Neue HD-DN 200 in Betrieb	20 Tage	Mon 16.03.26	Fre 10.04.26
31	**Deutsche Telekom AG: Maßnahmen vor Baubeginn Stützwand**	1 Tag?	Mit 01.10.25	Mit 01.10.25
32	Breitbandausbau Riedelstraße	1 Tag?	Mit 01.10.25	Mit 01.10.25
33	**Leipziger Verkehrsbetriebe: Maßnahmen vor Baubeginn Stützwand**	1 Tag?	Mit 01.10.25	Mit 01.10.25
34	Spannseil sichern	1 Tag?	Mit 01.10.25	Mit 01.10.25
35	**Mobilitäts-und Tiefbauamt, Straßenbeleuchtung: Maßnahmen im Zuge der Baumaßnahme zum Neubau der Stützwand**	291 Tage?	Fre 03.10.25	Fre 13.11.26
36	Straßenbeleuchtung (Nordseite) außer Betrieb nehmen sowie Mast aus Baugrube versetzen	1 Tag?	Fre 03.10.25	Fre 03.10.25
37	Straßenbeleuchtung neu aufbauen und in Betrieb nehmen	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26
38	**Vodafone Deutschland GmbH**	6 Tage?	Mon 14.12.26	Mon 21.12.26
39	Neuverlegung von Leerrohren 2x DN 50 im Leitungsgraben Gehweg Seite Süd mit Querung Riedelstraße, ca. Stat. 0+15 bis 0+55	6 Tage?	Mon 14.12.26	Mon 21.12.26
40	**Bauphase 1 Arbeitsvorbereitung**	60 Tage?	Mit 01.10.25	Die 23.12.25
41	**Arbeitsvorbereitung**	15 Tage	Mit 01.10.25	Die 21.10.25
42	Ablaufplanung /Beschaffung	15 Tage	Mit 01.10.25	Die 21.10.25
43	Beschaffung Schachtscheine	15 Tage	Mit 01.10.25	Die 21.10.25
44	Sperrung Riedelstraße und Sicherung des Baufeldes, Umsetzung der Verkehrsrechtlichen Anordnung	5 Tage	Mit 01.10.25	Die 07.10.25
45	Baustelleneinrichtung u. Herstellung eines Zwischenlagers	5 Tage	Mit 08.10.25	Die 14.10.25
46	**Kampfmitteltiefensondierung (lotrecht)**	18 Tage?	Mit 22.10.25	Fre 14.11.25
47	im Bereich der Verbauachsen und überschn. Bohrpfahlwände. Bohrlöcher =>500mm sind 3-fach vorzusondieren. Sondiertiefe: 12m unter GOK für Verbauwand Riedelstraße, Sondiertiefe vor Fernwärmeleitung =>8m unter GOK für Verbauwand FW-Leitung und Bohrpfahlwand	18 Tage?	Mit 22.10.25	Fre 14.11.25
48	**Kampfmitteltiefensondierung (geneigt)**	15 Tage	Mit 22.10.25	Die 11.11.25
49	Geneigte Tiefensondierung im Bereich der Anker (DM 150mm) => Sondiertiefe bis 6m, Bohrabstand 1,50m Lage MW-Kanal beachten!!	15 Tage	Mit 22.10.25	Die 11.11.25
50	**Baufeldfreimachung Parkseite**	36 Tage?	Mon 13.10.25	Mon 01.12.25
51	Herstellung temporäre Zuwegung gleichzeitig mit den erforderlichen Baumfällungen herstellen	12 Tage	Mon 13.10.25	Die 28.10.25
52	Bäume und Buschwerk zw. Fernwärmeleitung und Stützwand fällen und entsorgen, teilweise roden und roden im Zuge der Erdarbeiten, für den mechanischen Schutz der FW-Leitung sind temporäre Schutzmaßnahmen für die FW-Leitung vorzusehen	12 Tage	Mon 13.10.25	Die 28.10.25
53	Herstellung Schutzeinhausung für Fernwärmeleitung-Leitung für den Ersatzneubau der Stützwand	5 Tage	Die 28.10.25	Mon 03.11.25
54	Herstellung Trägerbohlwand zum Schutz der Fundamente Fernwärmeleitung nach Planung Verbau	19 Tage	Die 11.11.25	Fre 05.12.25
55	**Baufeldfreimachung Riedelstr. (Nordseite)**	37 Tage	Mon 03.11.25	Die 23.12.25
56	Rückbau Schutzzaun sowie Fäll-u. Rodungsarbeiten	5 Tage	Mon 08.12.25	Fre 12.12.25
57	Rückbau Straßen- u Gehwegbefestigung sowie Granitplatten, Borde u. Postamentreste, Abtransport zum Zwischenlager. Material wird gem. Planung teilweise wieder verwendet	5 Tage	Mon 08.12.25	Fre 12.12.25
58	2 Stck. Großbäume aus Baugrubenbereich umsetzen (Stat. 0+070 gem. E-Mail vom 25.0	10 Tage	Mon 03.11.25	Fre 14.11.25
59	Schutzmaßnahmen nach Baufortschritt für parallel und kreuzende Leitungen u. Kabel, die während der Bauarbeiten in Betrieb bleiben müssen.	4 Tage	Don 18.12.25	Die 23.12.25
60	**Bauarbeiten zum Abbruch und Neubau der Stützwand**	256 Tage?	Fre 07.11.25	Fre 30.10.26
61	**Bauphase 2 Abbrucharbeiten und Verbauarbeiten**	128 Tage?	Fre 07.11.25	Die 05.05.26
62	Aus den Vorgaben bezüglich der Umbindung von Gasleitungen ist der Bauablauf zeitlich versetzt, unterbrochen und nicht durchgängig. Alle Arbeiten zum Wandabschnitt 2 können erst nach Außerbetriebnahme der vorhandenen Gasleitung erfolgen (21.11.25)			
63	Baustelleneinrichtung für Abbruch und Verbau	3 Tage?	Fre 07.11.25	Die 11.11.25
64	**ENB Wandabschnitt (WA) 1, Stat. 0+128,415 bis 0+119.675**	15 Tage?	Mit 12.11.25	Die 02.12.25
65	Trägerbohlwand herstellen u. paralleler Abbruch der STW und Aushub der Baugrube in 3 Aushubebenen bis Ebene 115,20 NHN. Die Durchführung der Gas HD(neu) beachten!	6 Tage	Mit 12.11.25	Die 02.12.25
66	Gurtung u. Verankerung herstellen in zwei Ankerlagen!	5 Tage?	Mon 17.11.25	Fre 21.11.25
67	Leitungssicherung Mittelspannung, Einmündung Straßenbeleuchtung Riebeckstraße	1 Tag?	Mit 12.11.25	Mit 12.11.25
68	**ENB Wandabschnitt 2, Stat. 0+119,675 bis 0+112,705**	15 Tage?	Mit 15.04.26	Die 05.05.26
69	zu beachten: Gasleitung bleibt bis Umbindung in Betrieb und ist zu sichern. Erst danach kann Wandabschnitt 2 abgebrochen werden.			
70	Trägerbohlwand paralleler Abbruch STW u. Aushub Baugrube bis Ebene 115,20NHN	15 Tage?	Mit 15.04.26	Die 05.05.26
71	Teilrückbau Gasltg.	1 Tag?	Mit 15.04.26	Mit 15.04.26
72	Gurtung und Verankerung	4 Tage	Mon 20.04.26	Don 23.04.26
73	**ENB Wandabschnitt 3, Stat. 0+112,705 bis 0+099,735**	35 Tage?	Mit 03.12.25	Die 20.01.26
74	Lage Mischwasserkanal beachten!			
75	Herstellung Trägerbohlwand u. paralleler Abbruch der STW u. Aushub Baugrube bis Ebene 115,20NHN	15 Tage	Mit 03.12.25	Die 23.12.25
76	Gurtung und Verankerung	6 Tage?	Mit 03.12.25	Mit 10.12.25
77	Stat. 0+106: Herstellung einer überschnittenen Bohrpfahlwand zur Lastfreiheit auf dem MW-Kanal Pfahllänge 3,0m, DM 750mm; Bohrschablone, Leerbohrung bis 2,0m über Pfahl Einbau Betonstahl, Beseitigung Bohrgut, Betonage Kopfbearbeitung herstellen	8 Tage?	Mon 05.01.26	Mit 14.01.26
78	MW-Kanal, Abdeckplatte bewehrt mit darunter liegender Setzungsplatte	2 Tage?	Mon 19.01.26	Die 20.01.26
79	**ENB Wandabschnitt 4, Stat. 0+099,735 bis 0+089,815**	15 Tage?	Mit 21.01.26	Die 10.02.26
80	Herstellung Trägerbohlwand, paralleler Abbruch und Aushub Baugrube bis Ebene 115,20NHN	15 Tage?	Mit 21.01.26	Die 10.02.26
81	Gurtung u. Verankerung	5 Tage?	Fre 23.01.26	Don 29.01.26
82	Rückbau Straßenablauf	1 Tag?	Mit 21.01.26	Mit 21.01.26
83	**ENB Wandabschnitt 5 Stat. 0+089,815 bis 0+079,895,**	15 Tage?	Mit 11.02.26	Die 03.03.26
84	Herstellung Trägerbohlwand u. paralleler Abbruch der STW u. Aushub bis Ebene 115,40NHN	15 Tage	Mit 11.02.26	Die 03.03.26
85	Gurtung u. Verankerung	5 Tage	Fre 13.02.26	Don 19.02.26
86	**ENB Wandabschnitt 6, Stat. 0+079,895 bis 0+069,975**	15 Tage	Mit 11.02.26	Die 03.03.26
87	Herstellung Trägerbohlwand u. paralleler Abbruch der STW u. Aushub bis Ebene 115,40NHN	15 Tage	Mit 11.02.26	Die 03.03.26
88	Gurtung u. Verankerung	5 Tage	Fre 13.02.26	Don 19.02.26
89	**ENB Wandabschnitt 7, Stat. 0+069,975 bis 0+060,055**	15 Tage?	Mit 04.03.26	Die 24.03.26
90	Herstellung Trägerbohlwand u. paralleler Abbruch der STW u. Aushub bis Ebene 115,80NHN	15 Tage?	Mit 04.03.26	Die 24.03.26
91	Gurtung u. Verankerung	5 Tage?	Mon 09.03.26	Fre 13.03.26
92	**ENB Wandabschnitt 8, Stat. 0+060,055 bis 0+047,200**	15 Tage?	Mit 04.03.26	Die 24.03.26
93	Herstellung Trägerbohlwand u. paralleler Abbruch der STW u. Aushub bis Ebene 115,80NHN	15 Tage?	Mit 04.03.26	Die 24.03.26
94	Gurtung u. Verankerung	7 Tage?	Mon 09.03.26	Die 17.03.26
95	**Bauphase 3 Neubau Stützwand Stat. 0+047,200 bis 0+128,415**	146 Tage?	Mit 03.12.25	Mit 24.06.26
96	Baustelleneinrichtung für Neubau der Stützwand (Traggerüst/Schalung/Bewehrung vollständig)	2 Tage?	Mit 03.12.25	Don 04.12.25
97	**STW Fundamentplatte (Schalung, Bewehrung und Betonage)**	120 Tage?	Mit 03.12.25	Die 19.05.26
98	**ENB Wandabschnitt (WA) 1, Stat. 0+128,415 bis 0+119.675**	4 Tage?	Mit 03.12.25	Mon 08.12.25
99	Betonage bewehrt, geschalt, Dicke 1,20m, Hartstoffeinlage luftseitig	2 Tage?	Mit 03.12.25	Don 04.12.25
100	ausschalen ab 4. Tag	1 Tag	Mon 08.12.25	Mon 08.12.25
101	**Wandabschnitt 2 (Stat. 0+119,675 - 0+112,705), 3 (Stat.0+112,705 - 0+0+099,735), 4 (Stat.0+099,735 - 0+089,815):**	10 Tage?	Mit 06.05.26	Die 19.05.26
102	Betonage je zusammenhängend bewehrt, geschalt von WA1 bis Bohrpfahlwand und von Bohrpfahlwand bis WA 5, Dicke 1,20m, ausgeklinkte Bodenplatte über MW-Kanal beachten	7 Tage	Mit 06.05.26	Don 14.05.26
103	ausschalen ab 4.Tag	2 Tage	Mon 18.05.26	Die 19.05.26
104	**Wandabschnitt 5 (Stat. 0+089,815 - 0+079,895),6 (Stat.0+079,895 - 0+069,975):**	10 Tage	Mit 04.03.26	Die 17.03.26
105	Betonage bewehrt, geschalt, Dicke 1,10m, Hartstoffeinlage luftseitig	5 Tage	Mit 04.03.26	Die 10.03.26
106	ausschalen ab 4. Tag	2 Tage	Mon 16.03.26	Die 17.03.26
107	**Wandabschnitt 7 (Stat.0+069,975 - 0+060,055), 8 (0+060,055 - 0+047,200:**	10 Tage	Mit 25.03.26	Die 07.04.26
108	Betonage bewehrt, geschalt, Dicke 1,00m, Hartstoffeinlage luftseitig	5 Tage	Mit 25.03.26	Die 31.03.26
109	ausschalen ab 4.Tag	2 Tage	Mon 06.04.26	Die 07.04.26
110	**STW Aufgehendes (Schalung und Bewehrung)**	129 Tage?	Mon 15.12.25	Don 11.06.26
111	**Wandabschnitt 1: (0+128,415 - 0+119,675)**	5 Tage?	Mon 15.12.25	Fre 19.12.25
112	Aufbau Schalung und Bewehrung für ENB gem. Planung der Betonierabschnitte , mitführen der Arbeitsgerüste , Einbau Matritzen	5 Tage?	Mon 15.12.25	Fre 19.12.25
113	Durchführung u. Nische für Gasltg. Beachten, Hilfsflügel zur Abfangung der Spundwandhinterfüllung (Trennung WA1/2) herstellen	2 Tage?	Mon 15.12.25	Die 16.12.25
114	Einbau Entwässerungsrohre (Vorflut), je 10m in allen Abschnitten	2 Tage?	Mon 15.12.25	Die 16.12.25
115	**Wandabschnitt 2: (0+119,675 - 0+112,705)**	5 Tage?	Fre 15.05.26	Don 21.05.26
116	Aufbau Schalung und Bewehrung für ENB gemäß Planung der Betonierabschnitte , mitführen der Arbeitsgerüste, Einbau Matritzen	5 Tage?	Fre 15.05.26	Don 21.05.26
117	Einbau Entwässerungsrohre (Vorflut), je 10m in allen Abschnitten	5 Tage?	Fre 15.05.26	Don 21.05.26
118	**Wandabschnitt 3: (0+112,05 - 0+099,735)**	5 Tage?	Die 26.05.26	Mon 01.06.26
119	Aufbau Schalung u. Bewehrung für Neubauwand gemäß Planung der Betonierabschnitte, mitführen der Arbeitsgerüste, Einbau Matritzen	5 Tage	Die 26.05.26	Mon 01.06.26
120	Einbau Entwässerungsrohre (Vorflut), je 10m in allen Abschnitten	5 Tage?	Die 26.05.26	Mon 01.06.26
121	**Wandabschnitt 4: (0+099,735 - 0+089,815)**	5 Tage?	Fre 05.06.26	Don 11.06.26
122	Aufbau Schalung u. Bewehrung für Neubauwand gemäß Planung der Betonierabschnitte, mitführen der Arbeitsgerüste, Einbau Matritzen	5 Tage?	Fre 05.06.26	Don 11.06.26
123	Einbau Entwässerungsrohre (Vorflut), je 10m in allen Abschnitten	5 Tage?	Fre 05.06.26	Don 11.06.26
124	**Wandabschnitt 5: (0+089,815 - 0+079,895)**	5 Tage?	Die 17.03.26	Mon 23.03.26
125	Aufbau Schalung u. Bewehrung für Neubauwand gemäß Planung der Betonierabschnitte, mitführen der Arbeitsgerüste, Einbau Matritzen	5 Tage	Die 17.03.26	Mon 23.03.26
126	Einbau Entwässerungsrohre (Vorflut), je 10m in allen Abschnitten	5 Tage?	Die 17.03.26	Mon 23.03.26
127	**Wandabschnitt 6: (0+079,895 - 0+069,975)**	5 Tage?	Die 17.03.26	Mon 23.03.26
128	Aufbau Schalung u. Bewehrung für Neubauwand gemäß Planung der Betonierabschnitte, mitführen der Arbeitsgerüste, Einbau Matritzen	5 Tage?	Die 17.03.26	Mon 23.03.26
129	Einbau Entwässerungsrohre (Vorflut), je 10m in allen Abschnitten	5 Tage?	Die 17.03.26	Mon 23.03.26
130	**Wandabschnitt 7: (0+069,975 - 0+060,055)**	5 Tage?	Mit 08.04.26	Die 14.04.26
131	Aufbau Schalung u. Bewehrung für Neubauwand gemäß Planung der Betonierabschnitte, mitführen der Arbeitsgerüste, Einbau Matritzen	5 Tage?	Mit 08.04.26	Die 14.04.26
132	Einbau Entwässerungsrohre (Vorflut), je 10m in allen Abschnitten	5 Tage?	Mit 08.04.26	Die 14.04.26
133	**Wandabschnitt 8: (0+060,055 - 0+047,200)**	5 Tage?	Mit 08.04.26	Die 14.04.26
134	Aufbau Schalung u. Bewehrung für Neubauwand gemäß Planung der Betonierabschnitte, mitführen der Arbeitsgerüste, Einbau Matritzen	5 Tage?	Mit 08.04.26	Die 14.04.26
135	Einbau Entwässerungsrohre (Vorflut), je 10m in allen Abschnitten	5 Tage?	Mit 08.04.26	Die 14.04.26
136	**STW Aufgehendes (Betonage, Abdichtung, Entwässerung)**	130 Tage?	Mon 22.12.25	Fre 19.06.26
137	**ENB Wandabschnitt (WA) 1, Stat. 0+128,415 bis 0+119.675**	14 Tage?	Mon 22.12.25	Don 08.01.26
138	WA 1, betonieren u. verdichten	1 Tag?	Mon 22.12.25	Mon 22.12.25
139	WA 1, ausschalen ab 4.Tag	2 Tage?	Mon 05.01.26	Die 06.01.26
140	WA 1 Rückseitige Abdichtung der Stützwand nach RiZ "Was7" mit Grundrohr, Anbindung an Vorflut	2 Tage	Mit 07.01.26	Don 08.01.26
141	**ENB Wandabschnitt (WA) 2: (0+119.675 - 0+112,705)**	8 Tage?	Don 21.05.26	Mon 01.06.26
142	WA 2, betonieren u. verdichten	1 Tag?	Don 21.05.26	Don 21.05.26
143	WA 2, ausschalen ab 4.Tag	2 Tage?	Mon 25.05.26	Die 26.05.26
144	WA 2 Rückseitige Abdichtung der Stützwand nach RiZ "Was7" mit Grundrohr, Anbindung an Vorflut	2 Tage	Mit 27.05.26	Don 28.05.26
145	**ENB Wandabschnitt (WA) 3: (0+112,705 - 0+099,735)**	6 Tage?	Mon 01.06.26	Mon 08.06.26
146	WA 3, betonieren u. verdichten	1 Tag?	Mon 01.06.26	Mon 01.06.26
147	WA 3, ausschalen ab 4. Tag	2 Tage?	Mon 08.06.26	Die 09.06.26
148	WA 3 Rückseitige Abdichtung der Stützwand nach RiZ "Was7" mit Grundrohr, Anbindung an Vorflut	2 Tage	Mit 10.06.26	Don 11.06.26
149	**ENB Wandabschnitt (WA) 4: (0+099,735 - 0+089,15)**	6 Tage?	Fre 12.06.26	Fre 19.06.26
150	WA 4, betonieren u. verdichten	1 Tag?	Fre 12.06.26	Fre 12.06.26
151	WA 4, ausschalen ab 4.Tag	2 Tage?	Die 16.06.26	Mit 17.06.26
152	WA 4 Rückseitige Abdichtung der Stützwand nach RiZ "Was7" mit Grundrohr, Anbindung an Vorflut	2 Tage	Don 18.06.26	Fre 19.06.26
153	**ENB Wandabschnitt (WA) 5: (0+089,815 - 0+079,895)**	8 Tage?	Die 24.03.26	Don 02.04.26
154	WA 5, betonieren u. verdichten	1 Tag?	Die 24.03.26	Die 24.03.26
155	WA 5, ausschalen ab 4.Tag	2 Tage?	Mon 30.03.26	Die 31.03.26
156	WA 5 Rückseitige Abdichtung der Stützwand nach RiZ "Was7" mit Grundrohr, Anbindung an Vorflut	2 Tage	Mit 01.04.26	Don 02.04.26
157	**ENB Wandabschnitt (WA) 6: (0+079,895 - 0+069,975)**	7 Tage?	Mit 25.03.26	Don 02.04.26
158	WA 6, betonieren u. verdichten	1 Tag?	Mit 25.03.26	Mit 25.03.26
159	WA 6, ausschalen ab 4.Tag	2 Tage	Die 31.03.26	Mit 01.04.26
160	WA 6 Rückseitige Abdichtung der Stützwand nach RiZ "Was7" mit Grundrohr, Anbindung an Vorflut	2 Tage	Mit 01.04.26	Don 02.04.26
161	**ENB Wandabschnitt (WA) 7: (0+069,975 - 0+060,055)**	7 Tage?	Mit 15.04.26	Don 23.04.26
162	WA 7, betonieren u. verdichten	1 Tag?	Mit 15.04.26	Mit 15.04.26
163	WA 7, ausschalen ab 4.Tag	2 Tage	Mon 20.04.26	Die 21.04.26
164	WA 7 Rückseitige Abdichtung der Stützwand nach RiZ "Was7" mit Grundrohr, Anbindung an Vorflut	2 Tage	Mit 22.04.26	Don 23.04.26
165	**ENB Wandabschnitt (WA) 8: (0+060,055 - 0+047,200)**	8 Tage?	Don 16.04.26	Mon 27.04.26
166	WA 8, betonieren u. verdichten	1 Tag?	Don 16.04.26	Don 16.04.26
167	WA 8, ausschalen ab 4.Tag	2 Tage	Mon 20.04.26	Die 21.04.26
168	WA8 Rückseitige Abdichtung der Stützwand nach RiZ "Was7" mit Grundrohr, Anbindung an Vorflut	2 Tage	Mit 22.04.26	Don 23.04.26
169	**Rückbau Verbau und Verfüllung/Verdichtung**	117 Tage?	Die 13.01.26	Mit 24.06.26
170	Der Rückbau der Verbauwand erfolgt unter Beachtung der herzustellenden, nebenliegenden Pflanzgruben. Die Träger werden bei 2,50m unter GOK abgetrennt => Arbeitssicherheit =>Abböschung der Restbaugrube => Verfüllung			
171	**ENB Wandabschnitt (WA) 1, Stat. 0+128,415 bis 0+119.675**	64 Tage?	Die 13.01.26	Fre 10.04.26
172	Ausbauen der Verbauwand nach Rückbaukonzept im Wechsel mit der lagenweisen Verfüllung und Verdichtung der Baugrube bis in den Straßenkörper, Verfüllboden nachZTVE-StB, Verfüllung bis unter Gasrohr	4 Tage?	Die 13.01.26	Fre 16.01.26
173	Halbseitiger Rückbau des Packlagers im Bereich WA 1	1 Tag?	Mon 19.01.26	Mon 19.01.26
174	HD DN 200 durch Wand und Baugrube zur Vorbereitung der Umbindung im Zuge der parkseitigen Verlegung und Anbindung der HD DN200	20 Tage	Mon 16.03.26	Fre 10.04.26
175	Restauffüllung Baugrube	5 Tage	Mon 06.04.26	Fre 10.04.26
176	**ENB Wandabschnitt (WA) 2, Stat. 0+119.675 bis 0+112,705**	5 Tage?	Mit 27.05.26	Die 02.06.26
177	Ausbauen der Verbauwand nach Rückbaukonzept im Wechsel mit der lagenweisenVerfüllung und Verdichtung der Baugrube, Verfüllboden nach ZTV-E-StB, Träger bis unterhalb Pflanzgrube kürzen, Erweiterung/Abböschung der Baugrube bis in den Straßenkörper	4 Tage?	Mit 27.05.26	Mon 01.06.26
178	Halbseitiger Rückbau Packlager im Bereich WA 2	1 Tag?	Mon 01.06.26	Mon 01.06.26
179	Restauffüllung Baugrube	1 Tag?	Die 02.06.26	Die 02.06.26
180	**ENB Wandabschnitt (WA) 3, Stat. 0+112,705 bis 0+099,735**	6 Tage?	Fre 12.06.26	Fre 19.06.26
181	Ausbauen der Verbauwand nach Rückbaukonzept im Wechsel mit der lagenweisen Verfüllung und Verdichtung der Baugrube, Verfüllboden nach ZTV-E-StB, Träger bis unterhalb Pflanzgrube kürzen, Erweiterung/Abböschung der Baugrube bis in den Straßenkörper	4 Tage?	Fre 12.06.26	Mit 17.06.26
182	Halbseitiger Rückbau Packlager im Bereich WA 3	1 Tag?	Don 18.06.26	Don 18.06.26
183	Restauffüllung Baugrube	1 Tag?	Fre 19.06.26	Fre 19.06.26
184	**ENB Wandabschnitt (WA) 4, Stat. 0+099,735 bis 0+089,815**	4 Tage?	Fre 19.06.26	Mit 24.06.26
185	Ausbauen der Verbauwand nach Rückbaukonzept im Wechsel mit der lagenweisenVerfüllung und Verdichtung der Baugrube, Verfüllboden nach ZTV-E-StB, Träger bis unterhalb Pflanzgrube kürzen, Erweiterung/Abböschung der Baugrube bis in den Straßenkörper	4 Tage?	Fre 19.06.26	Mit 24.06.26
186	Halbseitiger Rückbau Packlager im Bereich WA 4	1 Tag?	Mon 22.06.26	Mon 22.06.26
187	Restauffüllung Baugrube	1 Tag?	Die 23.06.26	Die 23.06.26
188	**ENB Wandabschnitt (WA) 5, Stat. 0+089,815 bis 0+079,895**	5 Tage?	Don 02.04.26	Mit 08.04.26
189	Ausbauen der Verbauwand nach Rückbaukonzept im Wechsel mit der lagenweisen Verfüllung und Verdichtung der Baugrube, Verfüllboden nach ZTV-E-StB, Träger bis unterhalb Pflanzgrube kürzen, Erweiterung/Abböschung der Baugrube bis in den Straßenkörper	4 Tage?	Don 02.04.26	Die 07.04.26
190	Halbseitiger Rückbau Packlager im Bereich WA 5	1 Tag?	Mit 08.04.26	Mit 08.04.26
191	Restauffüllung Baugrube	1 Tag?	Mit 08.04.26	Mit 08.04.26
192	**ENB Wandabschnitt (WA) 6, Stat. 0+079,895 bis 0+069,975**	6 Tage?	Fre 03.04.26	Fre 10.04.26
193	Ausbauen der Verbauwand nach Rückbaukonzept im Wechsel mit der lagenweisen Verfüllung und Verdichtung der Baugrube, Verfüllboden nach ZTV-E-StB, Träger bis unterhalb Pflanzgrube kürzen, Erweiterung/Abböschung der Baugrube bis in den Straßenkörper	4 Tage?	Fre 03.04.26	Mit 08.04.26
194	Halbseitiger Rückbau Packlager im Bereich WA 6	1 Tag?	Don 09.04.26	Don 09.04.26
195	Restauffüllung Baugrube	1 Tag?	Fre 10.04.26	Fre 10.04.26
196	**ENB Wandabschnitt (WA) 7, Stat. 0+069,975 bis 0+060,055**	5 Tage?	Fre 24.04.26	Don 30.04.26
197	Ausbauen der Verbauwand nach Rückbaukonzept im Wechsel mit der lagenweisen Verfüllung und Verdichtung der Baugrube, Verfüllboden nach ZTV-E-StB, Träger bis unterhalb Pflanzgrube kürzen, Erweiterung/Abböschung der Baugrube bis in den Straßenkörper	4 Tage	Fre 24.04.26	Mit 29.04.26
198	Halbseitiger Rückbau Packlager im Bereich WA 7	1 Tag?	Don 30.04.26	Don 30.04.26
199	Restauffüllung Baugrube	1 Tag?	Don 30.04.26	Don 30.04.26
200	**ENB Wandabschnitt (WA) 8, Stat. 0+060,055 bis 0+047,200**	6 Tage?	Fre 24.04.26	Fre 01.05.26
201	Ausbauen der Verbauwand nach Rückbaukonzept im Wechsel mit der lagenweisen Verfüllung und Verdichtung der Baugrube, Verfüllboden nach ZTV-E-StB, Träger bis unterhalb Pflanzgrube kürzen, Erweiterung/Abböschung der Baugrube bis in den Straßenkörper	4 Tage?	Fre 24.04.26	Mit 29.04.26
202	Halbseitiger Rückbau Packlager im Bereich WA 8	1 Tag?	Don 30.04.26	Don 30.04.26
203	Restauffüllung Baugrube	1 Tag?	Don 30.04.26	Don 30.04.26
204	**Antigraffiti-Beschichtung**	104 Tage?	Don 08.01.26	Die 02.06.26
205	Antigraffiti-Beschichtung Stützwand Wandabschnitt 1 bis 8	104 Tage?	Don 08.01.26	Die 02.06.26
206	**Bauphase 4 Ertüchtigung Bestandswand (0+001,1 - 0+047,2)**	94 Tage?	Die 23.06.26	Fre 30.10.26
207	Baustelleneinrichtung für Ertüchtigung Bestandswand	3 Tage	Die 23.06.26	Don 25.06.26
208	Herstellung und Rückbau Baustellenzuwegung beginnend ab Eilenburger Straße (Flurstück 919)	3 Tage	Die 23.06.26	Don 25.06.26
209	**Instandsetzungsarbeiten Bestandsstützwand Station 0+001,1 - 0+047,2**	92 Tage?	Don 25.06.26	Fre 30.10.26
210	Rückbau Ausstattung und Beläge des Bestandes im Gehwegbereich Nord, Material zur Wiederverwendung zwischenlagern	3 Tage?	Don 25.06.26	Mon 29.06.26
211	vorh. Zaunanlage bauzeitlich zurückbauen	1 Tag?	Don 25.06.26	Don 25.06.26
212	Herstellung Verbauwand mit Rückverankerung mit gleichlaufendem Aushub der Baugrube bis Sohle Winkelelement	20 Tage?	Mon 29.06.26	Fre 24.07.26
213	Bestandswand: Rückseite reinigen	4 Tage?	Die 21.07.26	Fre 24.07.26
214	Bestandswand: Taschen, zweireihig für Schubverbindung herstellen	6 Tage?	Mon 27.07.26	Mon 03.08.26
215	Rückseitige Schalung der Stützwandverstärkung, Mitführung der Arbeitsgerüste und Einstellung der Bewehrung	13 Tage?	Mon 03.08.26	Mit 19.08.26
216	Beton blockweise nach Plan bis Arbeitsfuge einbauen und verdichten	5 Tage	Don 20.08.26	Mit 26.08.26
217	Stahlbetonkopfbalken betonieren	5 Tage?	Don 27.08.26	Mit 02.09.26
218	ausschalen ab 4.Tag	3 Tage	Mon 07.09.26	Mit 09.09.26
219	Fortführung der rückseitigen Abdichtung nach RiZ "Was7" und Entwässerung	4 Tage	Don 10.09.26	Die 15.09.26
220	Ausbauen der Verbauwand nach Rückbaukonzept im Wechsel mit der lagenweisen Verfüllung und Verdichtung der Baugrube, Verfüllboden nach ZTV-E- StB	5 Tage?	Don 17.09.26	Mit 23.09.26
221	Rückbau Packlager Riedelstraße) halbseitig	2 Tage?	Don 24.09.26	Fre 25.09.26
222	Restverfüllung Baugrube	3 Tage?	Mon 28.09.26	Mit 30.09.26
223	Sanierung/Injektion vorhandener Risse	5 Tage	Don 15.10.26	Mit 21.10.26
224	Sichtfläche der Bestandswand denkmalgerecht reinigen	5 Tage	Don 22.10.26	Mit 28.10.26
225	Anti-Graffiti-Beschichtung,	2 Tage	Don 29.10.26	Fre 30.10.26
226	**Bauphase 5 Komplettierung der gesamten Stützwand**	26 Tage?	Don 10.09.26	Don 15.10.26
227	**Neubaubereich der Stützwand**	8 Tage?	Don 10.09.26	Mon 21.09.26
228	Herstellung von vorgesetzten Wandsäulen in Ortbeton	8 Tage?	Don 10.09.26	Mon 21.09.26
229	**STW, gesamt:**	19 Tage	Mon 21.09.26	Don 15.10.26
230	Säulenkapitelle (Betonfertigteile anbauen)	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26
231	Kapitellsteine (Betonfertigteile) alle 30cm anbauen	7 Tage	Mon 21.09.26	Die 29.09.26
232	Verlegung Granitplatten auf Stützwandkopf im Mörtelbett auf gesamter Länge	5 Tage	Mit 30.09.26	Die 06.10.26
233	Aufsetzen der Brüstungsteile auf die Granitplatten (Hauptpfosten, Nebenpfosten, Wandelemente). Alle Elemente sind nach Vorgabe neu zu fertigen.	8 Tage	Die 06.10.26	Don 15.10.26
234	**Bauarbeiten zum Ausbau der Riedelstraße/Eilenburger Straße und Landschaftsbau**	371 Tage?	Don 23.10.25	Don 25.03.27
235	**Bauphase 6 Straßenbauarbeiten Riedelstraße und Eilenburger Straße**	371 Tage?	Don 23.10.25	Don 25.03.27
236	Baustelleneinrichtung für Rückbau-/ Tiefbau-/Unterbau-/Pflasterarbeiten	3 Tage	Don 01.10.26	Mon 05.10.26
237	Baustelleneinrichtung für Asphaltarbeiten	2 Tage?	Mit 02.12.26	Don 03.12.26
238	**Straßenbauarbeiten zum Ausbau der Riedelstraße**	125 Tage?	Don 01.10.26	Mit 24.03.27
239	Ausbau Packlager (Restbereiche)	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26
240	Bordanlage (Südseite) ausbauen und zur Wiederverwendung zwischenlagern	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26
241	Straße/Parkstreifen/ Gehweg Nordseite: Aushub u. Herstellung/Verdichtung Gründungsplanum EV2 45MPa	12 Tage	Don 01.10.26	Fre 16.10.26
242	HGT- Einbau, 20cm mitlaufend	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26
243	12 Stck.Straßenabläufe mit Ablaufleitung und Anbindung an MW-Kanal in Riedelstraße neu setzen, mitlaufend nach Baufortschritt	4 Tage?	Mon 05.10.26	Don 08.10.26
244	2 Stck. Straßenabläufe ausbauen, Ablaufleitung verdämmen => mitlaufend nach Baufortschritt	2 Tage	Mon 05.10.26	Die 06.10.26
245	Bordanlage beidseitig mit einzeiligem Rinnstein sowie Trennsteine zu Parkflächen neu verlegen. Borde und Rinnsteine(Großpflaster) aus Altmaterial. 20cm Unterbeton/ 15cm Rückenstütze	15 Tage	Mon 19.10.26	Fre 06.11.26
246	Herstellung Tragschicht u. Pflasterung Parkstreifen	15 Tage	Mon 09.11.26	Fre 27.11.26
247	Herstellung Gehweg/Pflasterstreifen Nordseite, Pflaster und Plattenband	15 Tage	Mon 16.11.26	Fre 04.12.26
248	Asphalt im Kreuzungsbereich Eilenburger Str. fräsen	2 Tage	Don 03.12.26	Fre 04.12.26
249	Einbau Asphalttragschicht	2 Tage	Mon 07.12.26	Die 08.12.26
250	Einbau Asphaltbinderschicht	1 Tag?	Mit 09.12.26	Mit 09.12.26
251	Änderung der Zugänge zu den Häusern für Anwohner	1 Tag?	Mit 09.12.26	Mit 09.12.26
252	Rückbau und Neuaufbau Gehweg Süd gem. Planung. Plattenband Granit (Altmaterial), Mosaikpflaster, Höhenanpassung Schieber/Hydrant	23 Tage	Mit 09.12.26	Fre 08.01.27
253	Riedelstr. Ausstattung: Fahrradbügel, Bänke	10 Tage	Mon 11.01.27	Fre 22.01.27
254	Einbau Asphaltdeckschicht, witterungsabhängig	1 Tag?	Mon 22.03.27	Mon 22.03.27
255	Höhenanpassung Schachtdeckel	2 Tage	Die 23.03.27	Mit 24.03.27
256	Fugen schneiden u. vergießen	2 Tage	Die 23.03.27	Mit 24.03.27
257	**Straßenbauarbeiten zum Umbau der Eilenburger Straße**	371 Tage?	Don 23.10.25	Don 25.03.27
258	**Vollsperrung Eilenburger Str. (Einmündung Riedelstraße)**	7 Tage?	Don 23.10.25	Fre 31.10.25
259	Einbau der Entwässerungshaltung AL302 und AL303 einschl. aller erforderlichen Aufbruch- und Erdarbeiten sowie provisorischen Deckenschluss	7 Tage?	Don 23.10.25	Fre 31.10.25
260	**Halbseitige Sperrung Eilenburger Str. (Einmündung Riedelstraße)**	8 Tage?	Die 03.11.26	Don 12.11.26
261	3 Stck.Straßenabläufe mit Ablaufleitung und Anbindung an MW-Kanal in Eilenburger Straße neu setzen mitlaufend nach Baufortschritt	4 Tage?	Mon 09.11.26	Don 12.11.26
262	Bordanlage im Übergang Riedelstraße mit einzeiligem Rinnstein sowie Trennsteine zu Parkflächen (beidseitig) neu verlegen. Borde und Rinnsteine(Großpflaster) aus Altmaterial. 20cm Unterbeton/ 15cm Rückenstütze	4 Tage?	Die 03.11.26	Fre 06.11.26
263	**Halbseitige Sperrung für Asphalteinbau (Seite Riedelstraße)**	4 Tage?	Mon 22.03.27	Don 25.03.27
264	Asphaltprofilausgleich	1 Tag	Mon 22.03.27	Mon 22.03.27
265	Einbau Asphaltdeckschicht, witterungsabhängig	1 Tag?	Mon 22.03.27	Mon 22.03.27
266	Höhenanpassung Schachtdeckel	2 Tage	Die 23.03.27	Mit 24.03.27
267	Fugen schneiden u. vergießen	3 Tage	Die 23.03.27	Don 25.03.27
268	**Halbseitige Sperrung Eilenburger Str. (Fahrbahnseite Süd)**	9 Tage?	Mon 09.11.26	Don 19.11.26
269	2 Stck.Straßenabläufe mit Ablaufleitung und Anbindung an MW-Kanal in Eilenburgerstraße neu setzen mitlaufend nach Baufortschritt	4 Tage?	Mon 16.11.26	Don 19.11.26
270	Eilenburger Str. Ausstattung:Umpflasterung, Parkfläche für Lastenfahrräder, Fahrradbügel	5 Tage	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26
271	**Halbseitige Sperrung für Asphalteinbau (Seite Süd)**	5 Tage?	Fre 19.03.27	Don 25.03.27
272	Asphalt Eilenburger Str. fräsen	1 Tag?	Fre 19.03.27	Fre 19.03.27
273	Asphaltprofilausgleich	1 Tag	Mon 22.03.27	Mon 22.03.27
274	Einbau Asphaltdeckschicht, witterungsabhängig	1 Tag?	Die 23.03.27	Die 23.03.27
275	Höhenanpassung Schachtdeckel	2 Tage	Mit 24.03.27	Don 25.03.27
276	Fugen schneiden u. vergießen	2 Tage	Mit 24.03.27	Don 25.03.27
277	**Bauphase 7 Landschaftspflegerische Arbeiten**	335 Tage?	Mon 03.11.25	Fre 12.02.27
278	Baustelleneinrichtung für landschaftsgärtnerische Arbeiten (externe Maßnahmen)	1 Tag	Mon 03.11.25	Mon 03.11.25
279	Ausführung von landschaftspflegerischen Ersatzmaßnahmen im Bereich Möbiusplatz und Alfred-Frank-Platz	20 Tage?	Mon 03.11.25	Fre 28.11.25
280	Baustelleneinrichtung für landschaftsgärtnerische Arbeiten	2 Tage?	Mon 02.11.26	Die 03.11.26
281	Pflanzgruben nach Plan herstellen, Planum verdichten, mit Pflanzsubstrat auffüllen	10 Tage?	Mit 04.11.26	Die 17.11.26
282	18 Stck. Großbäume pflanzen einschl. Stützen aufstellen	5 Tage	Die 17.11.26	Mon 23.11.26
283	Wiederherstellung des Sollzustandes von Flächen im Baufeld/Parkbereich/ Flurst. 919	15 Tage?	Mon 25.01.27	Fre 12.02.27
284	Baum B22 bis B26 auf Flurst. 919 und Radweg unterhalb Stützwand neu setzen	15 Tage?	Mon 25.01.27	Fre 12.02.27
285	**Abschlussarbeiten, Baufeldberäumung und Verkehrsfreigabe**	143 Tage?	Mon 14.09.26	Mit 31.03.27
286	**Bauphase 8 Baufeldberäumung und Verkehrsfreigabe**	143 Tage?	Mon 14.09.26	Mit 31.03.27
287	Rückbau Einhausung FW-Leitung	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26
288	Rückbau Verbauwand FW-Leitung ,Träger -0,50m unter GOK abschneiden	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26
289	Zaunanlage wieder aufbauen einschließlich neuer Toranlage und Böschungstreppe	5 Tage	Mon 08.02.27	Fre 12.02.27
290	Baustellenberäumung	5 Tage	Mit 24.03.27	Die 30.03.27
291	Beweissicherung Nachschau	1 Tag?	Die 30.03.27	Die 30.03.27
292	Verkehrsfreigabe Riedelstraße	1 Tag?	Mit 31.03.27	Mit 31.03.27

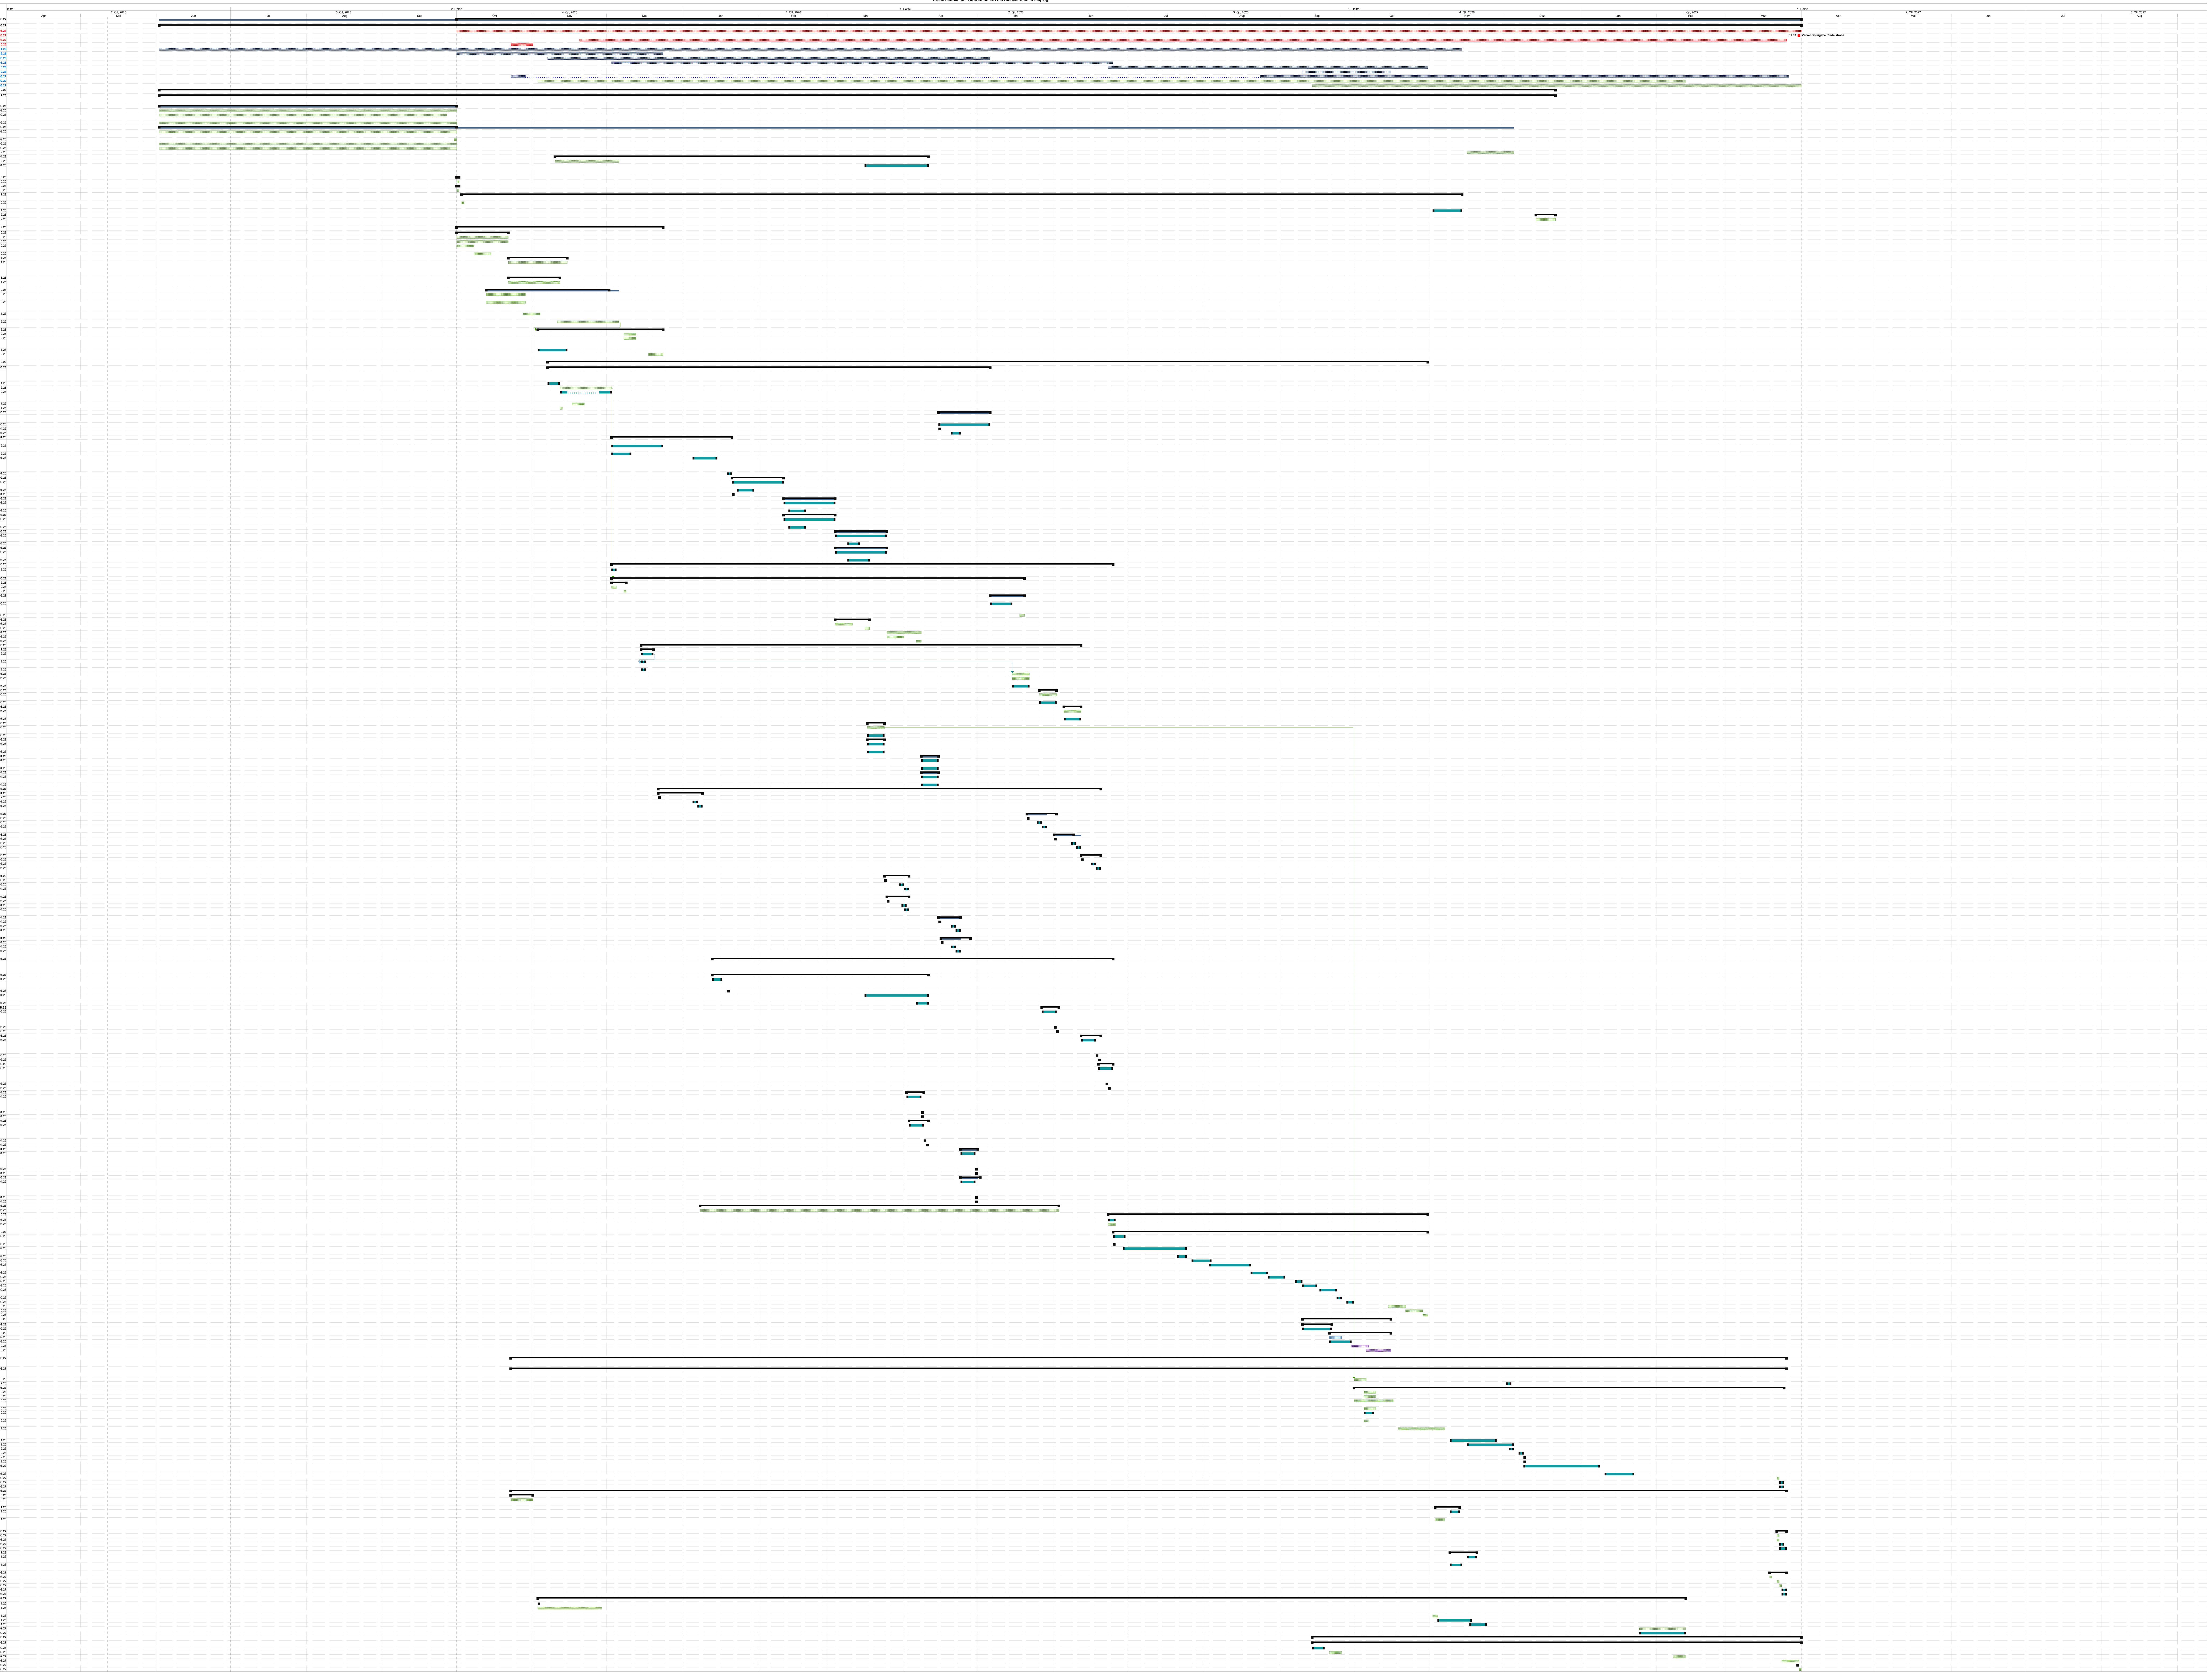

71-1446_BAP_STW_Riedelstrasse_20250512
Datum: Mon 12.05.25

Vorgang | Meilenstein | Sammelvorgang | Rollup: Vorgang | Rollup: Meilenstein | Rollup: In Arbeit | Unterbrechung | Externe Vorgänge | Projektsammelvorgang | Gruppenkopf | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | In Arbeit
