Neubau Rettungswache Sdier - Nr. I-23_000 154 - Bauzeit 14.07.2025 - 28.06.2026 -

[redacted]
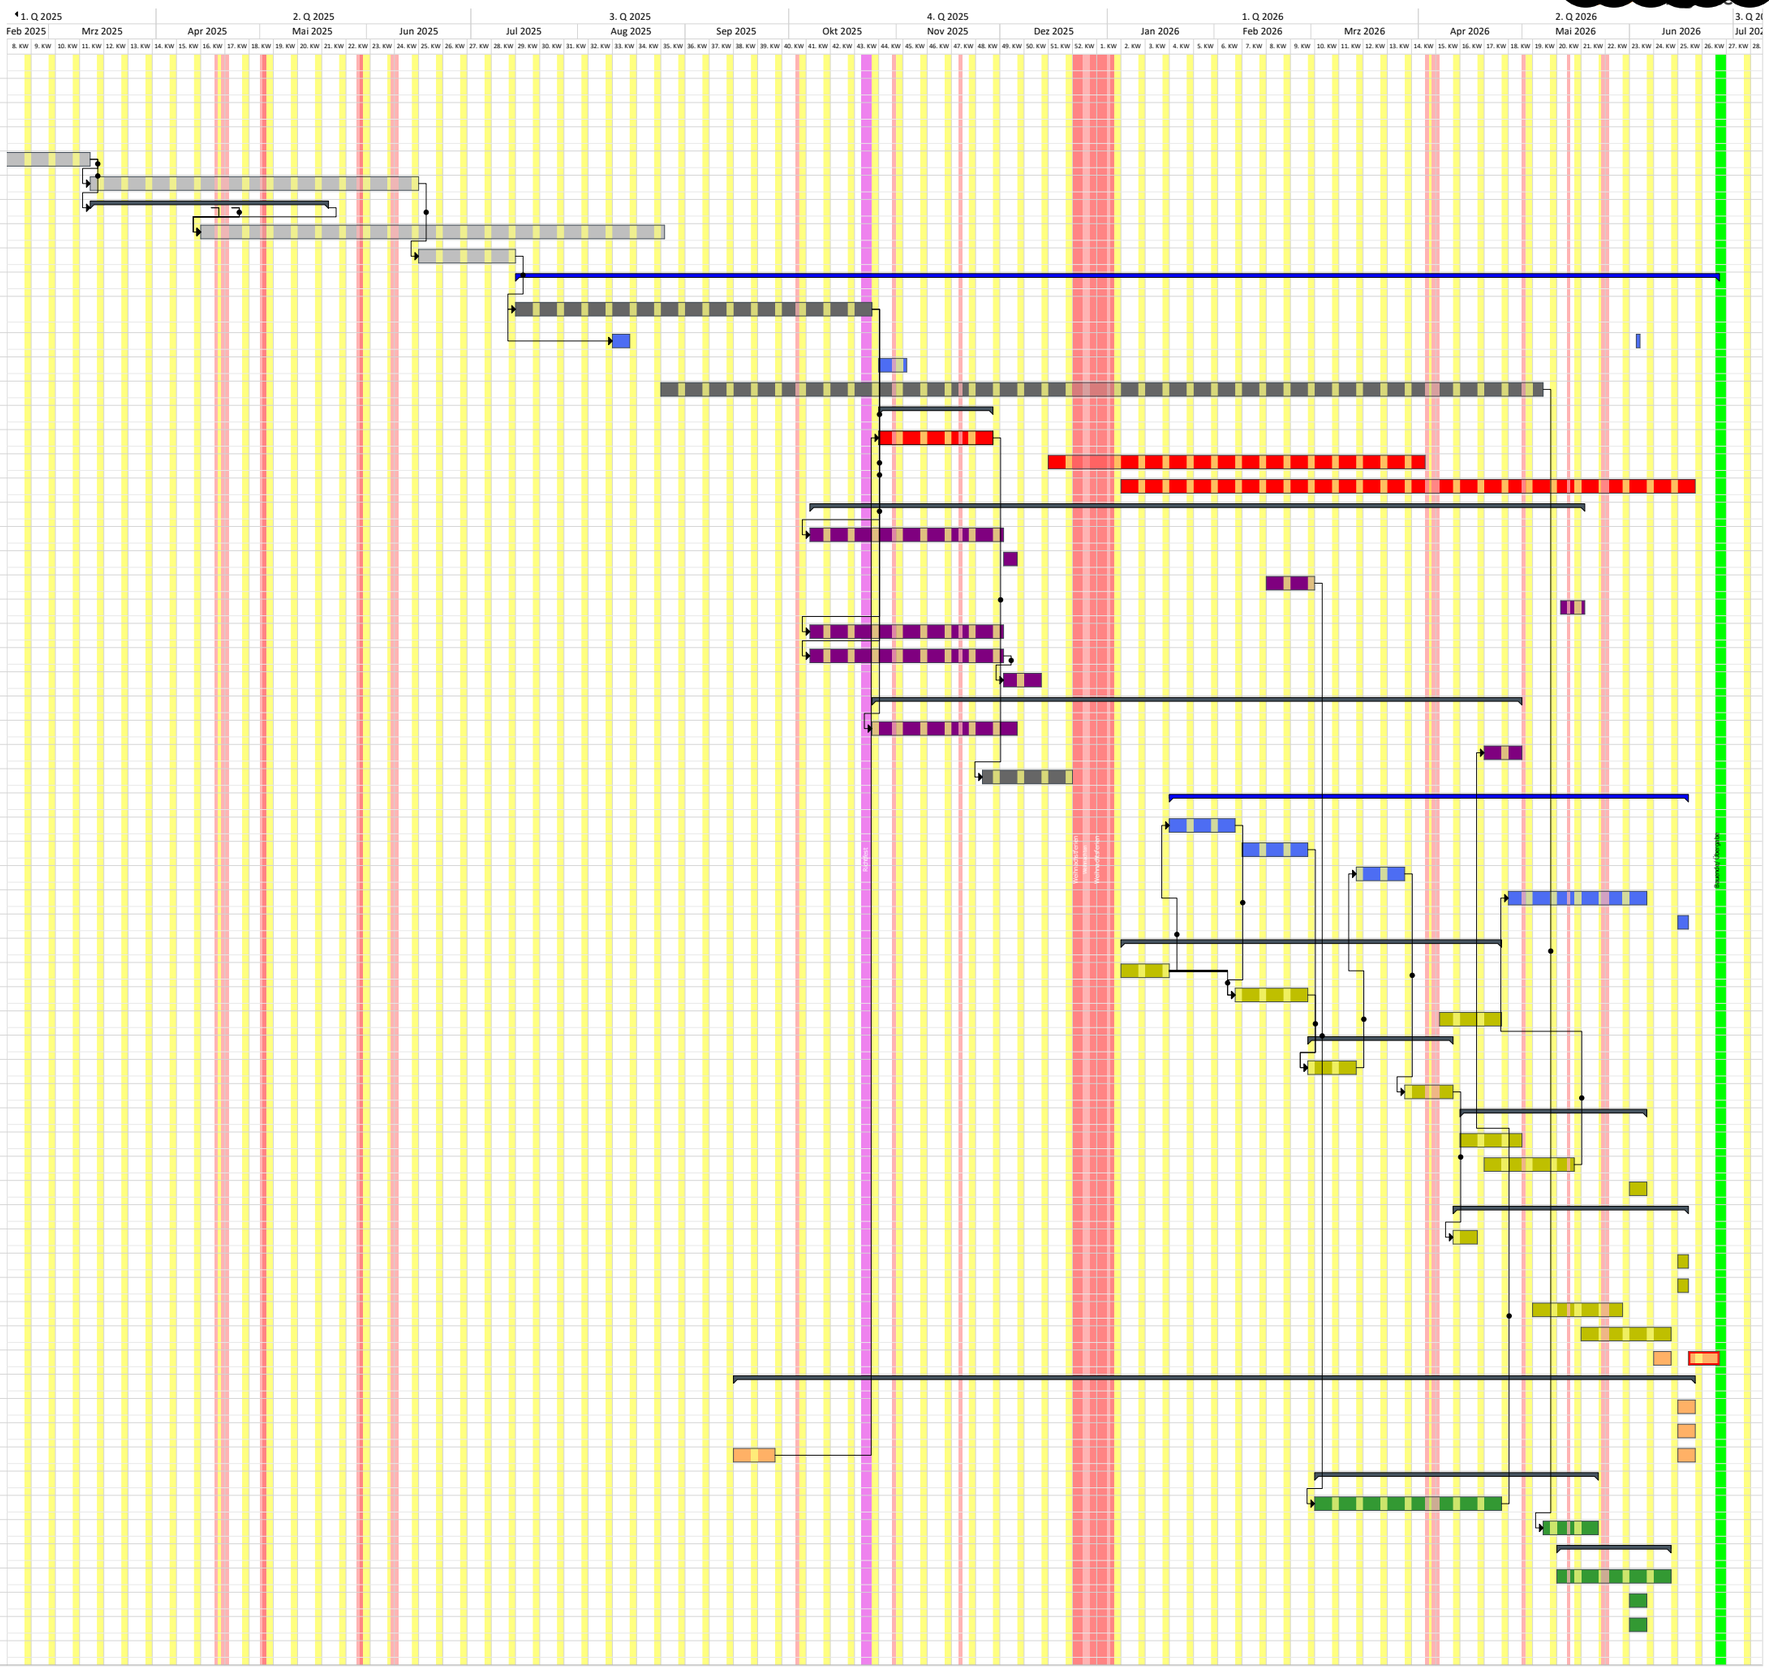
Nr	Name	Los-Nr.	Anfang	Ende	Dauer(AT)	Dauer
1	**Vertragstermin LP 2**		Fr, 06.12.24	So, 15.12.24	6 Tage	10 Tage
2	**LP 2 - Vorplanung**		Do, 19.12.24	Mi, 22.01.25	15 Tage	35 Tage
3	**Vertragstermin LP 3/4**		Mo, 13.01.25	Mi, 15.01.25	3 Tage	3 Tage
4	**LP 3 - Entwurfsplanung**		Do, 23.01.25	Mi, 12.02.25	15 Tage	21 Tage
5	**LP 4 - Genehmigungsplanung**		Do, 13.02.25	Mi, 12.03.25	20 Tage	28 Tage
6	***Baugenehmigungsverfahren***		*Do, 13.03.25*	*So, 15.06.25*	*60 Tage*	*95 Tage*
7	**LP 5 - Ausführungsplanung/ Fachplaner**		Do, 13.03.25	Di, 20.05.25	45 Tage	69 Tage
14	**Ausschreibung, alle Gewerke fortlaufend**		Mo, 14.04.25	Mo, 25.08.25	89 Tage	134 Tage
15	**Vergabe Tiefbau/ Rohbau, inkl. aller Prüf-/ Einspruchsfristen**		Mo, 16.06.25	So, 13.07.25	20 Tage	28 Tage
16	**Bauzeitfenster**		Mo, 14.07.25	Fr, 26.06.26	232 Tage	348 Tage
17	**erweiterter Rohbau - Herrichtung Baufeld, Aufstellung BE, Tiefbau-Grundleitungen, Rohbau**	**201, 301**	Mo, 14.07.25	Fr, 24.10.25	74 Tage	103 Tage
18	**Industriefußbodenheizung, Fahrzeughalle**	**401**	Mo, 11.08.25	Mi, 03.06.26	6 Tage	6 Tage
19	**Deckenventilatoren, Jalousieklappe Fahrzeughalle**	**402**	Mo, 27.10.25	Mo, 03.11.25	5 Tage	8 Tage
20	**Gerüstbau**	**302**	Mo, 25.08.25	Mi, 06.05.26	167 Tage	255 Tage
21	**Elektro**	**403, 404**	Mo, 27.10.25	Fr, 28.11.25	23 Tage	33 Tage
22	**ELT-Rohmontage**	**403**	Mo, 27.10.25	Fr, 28.11.25	23 Tage	33 Tage
23	**Bauheizung**	**403**	Mo, 15.12.25	Do, 02.04.26	69 Tage	109 Tage
24	**ELT-Feinmontage**	**403**	Mo, 05.01.26	Fr, 19.06.26	115 Tage	166 Tage
25	**Fenster, Sonnenschutz**	**306**	Di, 07.10.25	Mo, 18.05.26	144 Tage	224 Tage
26	**Fenster**	**306**	Di, 07.10.25	Mo, 01.12.25	38 Tage	56 Tage
27	**Fensterbänke - innen**	**306**	Di, 02.12.25	Fr, 05.12.25	4 Tage	4 Tage
28	**Fensterbänke - außen**	**306**	Mo, 16.02.26	So, 01.03.26	10 Tage	14 Tage
29	**Sonnenschutz**	**306**	Di, 12.05.26	Mo, 18.05.26	4 Tage	7 Tage
30	**Alu-Elemente (Haus-Zwischentüren)**	**304**	Di, 07.10.25	Mo, 01.12.25	38 Tage	56 Tage
31	**Sektionaltore**	**305**	Di, 07.10.25	Mo, 01.12.25	38 Tage	56 Tage
32	**Torschwellen**	**320**	Di, 02.12.25	Fr, 12.12.25	9 Tage	11 Tage
33	**Dachdecker**	**303**	Sa, 25.10.25	Do, 30.04.26	120 Tage	188 Tage
34	**Flachdachabdichtung, Dämmung Dachfläche/ Attika**	**303**	Sa, 25.10.25	Fr, 05.12.25	28 Tage	42 Tage
35	**Attika, Fallrohre, Dachbekiesung**	**303**	Mo, 20.04.26	Do, 30.04.26	9 Tage	11 Tage
36	**Innenputz**	**301**	Mi, 26.11.25	So, 21.12.25	18 Tage	26 Tage
37	**HLS**	**402**	Mo, 19.01.26	Mi, 17.06.26	103 Tage	150 Tage
38	**Vorwandinstallationen**	**402**	Mo, 19.01.26	Fr, 06.02.26	15 Tage	19 Tage
39	**Deckeninstallationen**	**402**	Mo, 09.02.26	Fr, 27.02.26	15 Tage	19 Tage
40	**FB-Heizung**	**402**	Sa, 14.03.26	Fr, 27.03.26	10 Tage	14 Tage
41	**Hautechnikzentrale, Lüftung**	**402**	Mo, 27.04.26	Fr, 05.06.26	27 Tage	40 Tage
42	**Feinmontage**	**402**	Mo, 15.06.26	Mi, 17.06.26	3 Tage	3 Tage
43	**Trockenbau**	**309**	Mo, 05.01.26	Fr, 24.04.26	78 Tage	110 Tage
44	**Wände halbseitig montieren, Gegenseite abgestellt**	**309**	Mo, 05.01.26	So, 18.01.26	10 Tage	14 Tage
45	**Wände schließen**	**309**	Sa, 07.02.26	Fr, 27.02.26	15 Tage	21 Tage
46	**Decken**	**309**	Di, 07.04.26	Fr, 24.04.26	14 Tage	18 Tage
47	**Estrich (inkl. Abdichtung, Unterdämmung)**	**310**	Sa, 28.02.26	Fr, 10.04.26	28 Tage	42 Tage
48	**Abdichtung, Unterdämmung**	**310**	Sa, 28.02.26	Fr, 13.03.26	10 Tage	14 Tage
49	**Schnellestrich - Abbindezeit 10KT**	**310**	Sa, 28.03.26	Fr, 10.04.26	8 Tage	14 Tage
50	**Fliesenleger**	**311**	Mo, 13.04.26	Fr, 05.06.26	37 Tage	54 Tage
51	**Wandfliesen**	**311**	Mo, 13.04.26	Do, 30.04.26	14 Tage	18 Tage
52	**Bodenfliesen**	**311**	Mo, 20.04.26	Fr, 15.05.26	18 Tage	26 Tage
53	**Sockelfliesen, Silikon**	**311**	Mo, 01.06.26	Fr, 05.06.26	5 Tage	5 Tage
54	**Tischler - Innentüren, WC-Trennwände**	**312**	Sa, 11.04.26	Mi, 17.06.26	45 Tage	68 Tage
55	**Zargen montieren**	**312**	Sa, 11.04.26	Fr, 17.04.26	5 Tage	7 Tage
56	**Umkleidekabinen, WC-Trennwände montieren**	**602d**	Mo, 15.06.26	Mi, 17.06.26	3 Tage	3 Tage
57	**Türblätter hängen**	**312**	Mo, 15.06.26	Mi, 17.06.26	3 Tage	3 Tage
58	**Maler**	**313**	Mo, 04.05.26	Fr, 29.05.26	18 Tage	26 Tage
59	**Bodenleger**	**314**	Mo, 18.05.26	Fr, 12.06.26	19 Tage	26 Tage
60	**Gebäudereinigung**	**319**	Mo, 08.06.26	Fr, 26.06.26	12 Tage	14 Tage
61	**Möbel (Holz, Metall, Küche)**	**600**	Mo, 15.09.25	Fr, 19.06.26	182 Tage	278 Tage
62	**Möbel Holz**	**602**	Mo, 15.06.26	Fr, 19.06.26	5 Tage	5 Tage
63	**Möbel Metall**	**602a**	Mo, 15.06.26	Fr, 19.06.26	5 Tage	5 Tage
64	**Küchenplanung/ Küchemontage**	**601**	Mo, 15.09.25	Fr, 19.06.26	15 Tage	17 Tage
65	**Fassade**	**308**	Mo, 02.03.26	Fr, 22.05.26	56 Tage	82 Tage
66	**WDVS-Haupt-Fassade**	**308**	Mo, 02.03.26	Fr, 24.04.26	38 Tage	54 Tage
67	**WDVS-Sockel**	**308**	Do, 07.05.26	Fr, 22.05.26	11 Tage	16 Tage
68	**Außenanlagen**	**203, 501**	Mo, 11.05.26	Fr, 12.06.26	23 Tage	33 Tage
69	**befestigte Flächen**	**501**	Mo, 11.05.26	Fr, 12.06.26	23 Tage	33 Tage
70	**Überdachungen, Fahrradstellplatz, Beschilderung**	**501**	Mo, 01.06.26	Fr, 05.06.26	5 Tage	5 Tage
71	**Zaunbau**	**502**	Mo, 01.06.26	Fr, 05.06.26	5 Tage	5 Tage
72	**Grünflächen/ Pflanzungen im Herbst**	**501**
