DAR
Ingenieurbüro für Umweltfragen
Deutsche Abwasser-Reinigungs-Gesellschaft mbH

Kläranlage Halle-Nord
Optimierung der Faulung mit dem VaSo-System
Rahmenterminplan
Vergabe- und Vertragstermine Ausschreibung

Stand: 17.06.2025

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Planungsphase**	**176 Tage**	**Fre 24.01.25**	**Fre 26.09.25**
2	**Vergabebewertung einer freihändigen Vergabe**	**40,5 Tage**	**Fre 24.01.25**	**Fre 21.03.25**
10	**Übergreifende Planung und Ausschreibung - Anfrage VaSo / Interaktiv**	**109 Tage**	**Don 13.02.25**	**Die 15.07.25**
36	**Vergabephase VaSo-System (freihändige Verhandlungsvergabe)**	**52,5 Tage**	**Die 15.07.25**	**Fre 26.09.25**
45	**Planung und Ausschreibung Bauarbeiten**	**107 Tage**	**Mon 17.02.25**	**Die 15.07.25**
55	**Vergabephase Bauarbeiten (öffentliche Ausschreibung)**	**53 Tage**	**Die 15.07.25**	**Fre 26.09.25**
64	**Bauphase**	310,5 Tage	Fre 26.09.25	Fre 04.12.26
65	**Technische Ausrüstung**	**310,5 Tage**	**Fre 26.09.25**	**Fre 04.12.26**
66	Auftrags- und Projektbeginn	0 Tage	Fre 26.09.25	Fre 26.09.25
67	**Werkplanung**	**80 Tage**	**Mon 29.09.25**	**Fre 16.01.26**
68	1. Stufe (MT - Bauvorgaben, EMSR-Angaben, Maschinen- und Messtellenlisten, Auslegung Anlagenteile, Spezifikation Anlagenteile)	3 Wochen	Mon 29.09.25	Fre 17.10.25
69	**Eingang Werkplanung 1. Stufe - Vertragsfrist AN TA**	**0 Tage**	**Fre 17.10.25**	**Fre 17.10.25**
70	Freigabe 1. Stufe	2 Wochen	Mon 20.10.25	Fre 31.10.25
71	2. Stufe (EMSR - Fortführung der 1. Stufe, Detaillierung und Endfassung Werkplanung, inkl. Schaltpläne)	4 Wochen	Mon 20.10.25	Fre 14.11.25
72	**Eingang Werkplanung 2. Stufe - Vertragsfrist AN TA**	**0 Tage**	**Fre 14.11.25**	**Fre 14.11.25**
73	Freigabe 2. Stufe	2 Wochen	Mon 17.11.25	Fre 28.11.25
74	Nachlauf EMSR-Werkplanung (Pflichtenheft)	4 Wochen	Mon 01.12.25	Fre 26.12.25
75	**Eingang Pflichtenheft**	**0 Tage**	**Fre 26.12.25**	**Fre 26.12.25**
76	Freigabe AG	3 Wochen	Mon 29.12.25	Fre 16.01.26
77	**Lieferzeiten**	**120 Tage**	**Mon 03.11.25**	**Fre 17.04.26**
78	Lieferzeit Gasverdichter (ab 03.10.)	6 Monate	Mon 03.11.25	Fre 17.04.26
79	**Vorbereitende Arbeiten, Baustelleneinrichtung**	**5 Tage**	**Mon 08.06.26**	**Fre 12.06.26**
80	Baustelleneinrichtung und Vorbereitung	1 Woche	Mon 08.06.26	Fre 12.06.26
81	**Leitungsverlegung, periphere Maschinentechnik**	**35 Tage**	**Mon 15.06.26**	**Fre 31.07.26**
82	Leitungsverlegung in bauseits erstellten Rohrgräben	1 Woche	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26
83	Verlegung aller Rohrleitungen im Rohrkanal bis zu den Faulbehälterköpfen (Kondensat, Faulgas, etc.)	6 Wochen	Mon 22.06.26	Fre 31.07.26
84	**Gasverdichteranlage**	**15 Tage**	**Mon 24.08.26**	**Fre 11.09.26**
85	Montage MT Gasverdichteranlage, Rohrleitungen in Raumzelle, Rohrkanal und an den Faulbehältern	2 Wochen	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26
86	Montage EMSR	3 Wochen	Mon 24.08.26	Fre 11.09.26
87	Vorlage der vorläufigen Dokumentation	0 Tage	Fre 11.09.26	Fre 11.09.26
88	**Faulbehälter 1**	**25 Tage**	**Mon 14.09.26**	**Fre 16.10.26**
89	Vorbereitung, ggf. Entschlammung	1 Woche	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26

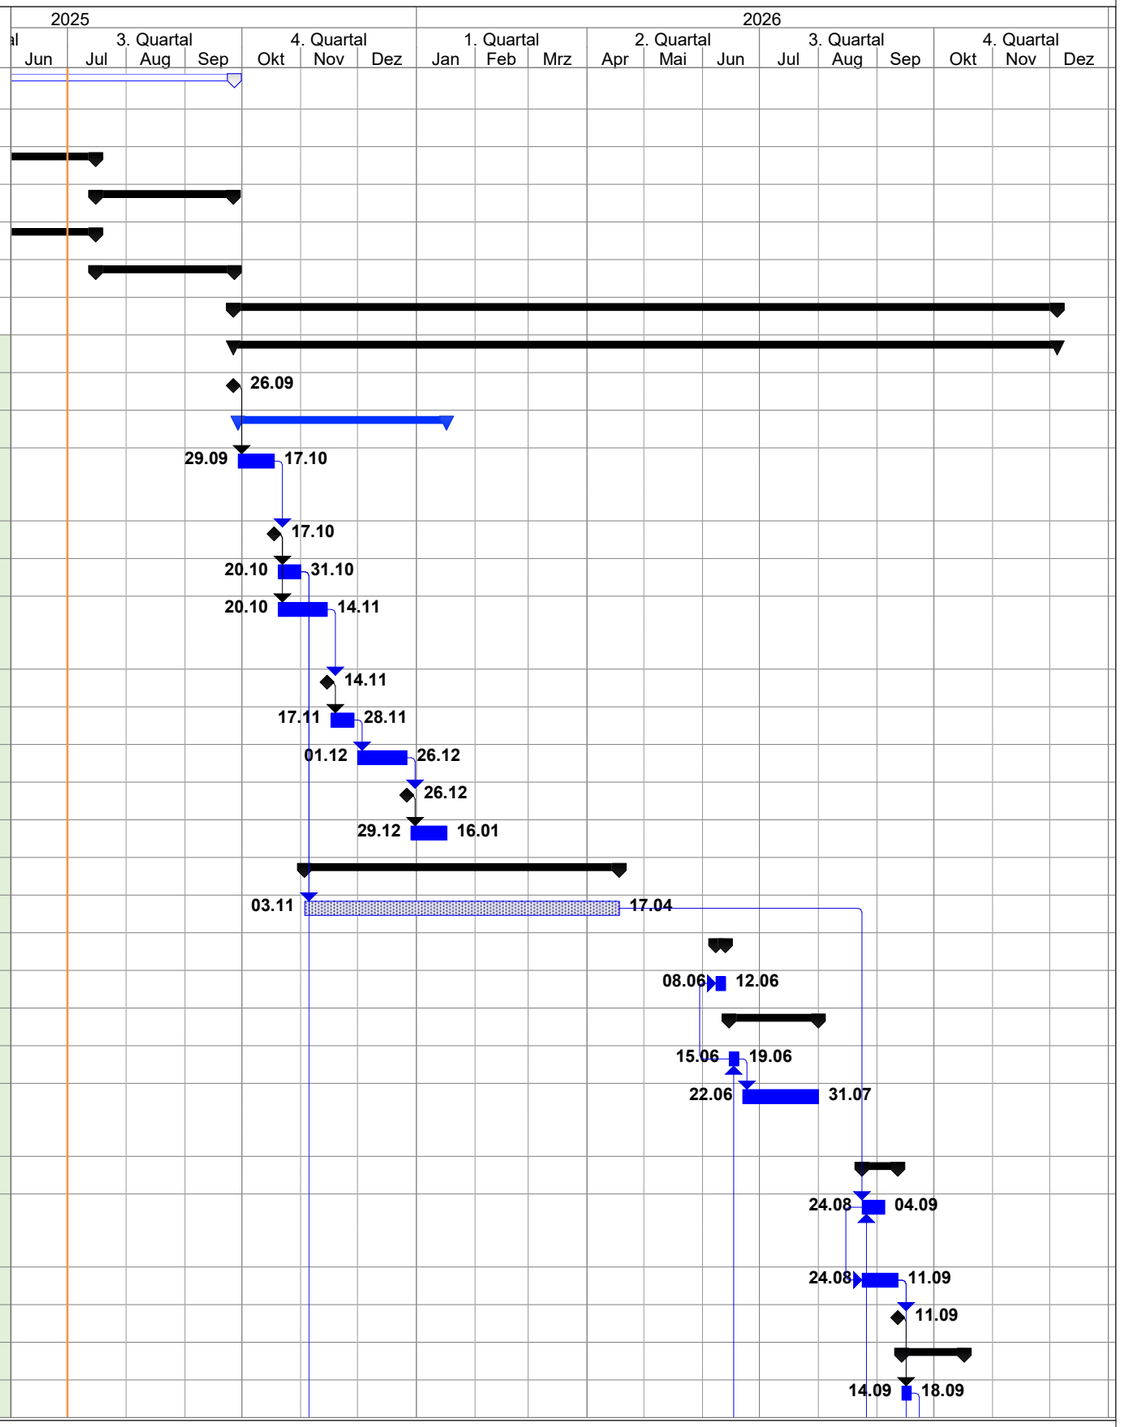

DAR
Ingenieurbüro für Umweltfragen
Deutsche Abwasser-Reinigungs-Gesellschaft mbH

Kläranlage Halle-Nord
Optimierung der Faulung mit dem VaSo-System
Rahmenterminplan
Vergabe- und Vertragstermine Ausschreibung

Stand: 17.06.2025
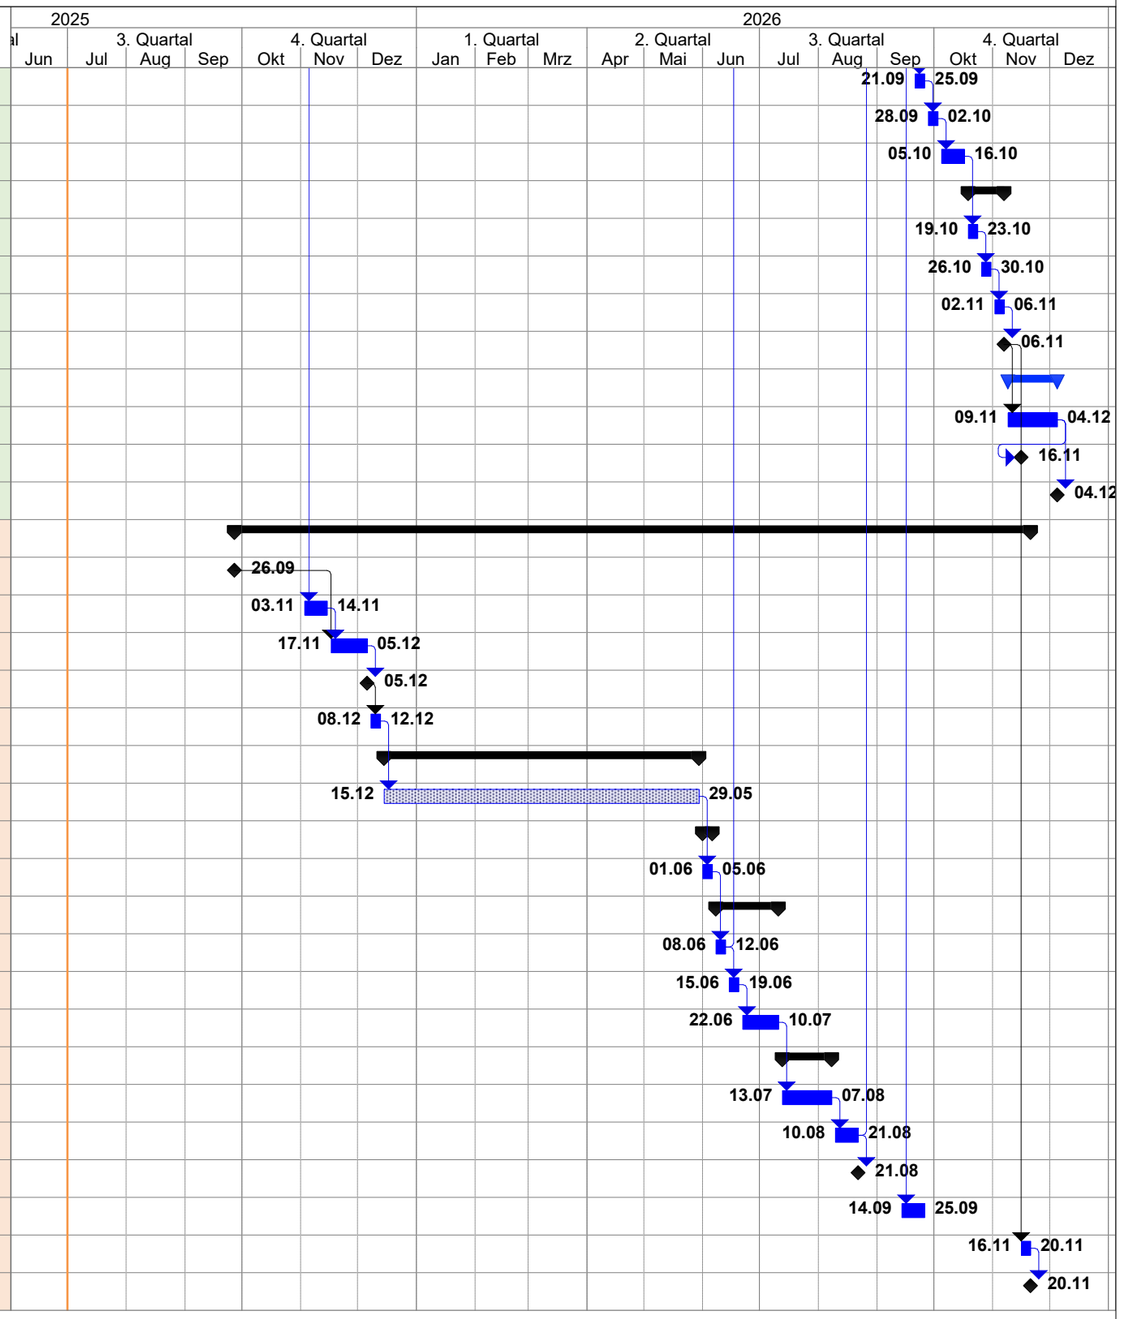
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
90	Montage im Faulbehälter und Einjustierung	1 Woche	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26
91	Nachlauf EMSR, Funktionsprüfungen, trockene und nasse IBN	1 Woche	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26
92	Testbetrieb	2 Wochen	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26
93	**Faulbehälter 2**	**15 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Fre 06.11.26**
94	Vorbereitung, ggf. Entschlammung	1 Woche	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26
95	Montage im Faulbehälter und Einjustierung	1 Woche	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26
96	Nachlauf EMSR, Funktionsprüfungen, trockene und nasse IBN	1 Woche	Mon 02.11.26	Fre 06.11.26
97	**Inbetriebsetzung = Beginn Probebetrieb = Vertragsfrist AN TA**	**0 Tage**	**Fre 06.11.26**	**Fre 06.11.26**
98	**Funktionsprüfungen und Probebetrieb**	**20 Tage**	**Mon 09.11.26**	**Fre 04.12.26**
99	Probebetrieb zur Erlangung der Abnahme	4 Wochen	Mon 09.11.26	Fre 04.12.26
100	Vorlage Enddokumentation	0 Tage	Mon 16.11.26	Mon 16.11.26
101	**VOB Abnahme = Vertragsfrist AN TA**	**0 Tage**	**Fre 04.12.26**	**Fre 04.12.26**
102	**Bauarbeiten**	**300 Tage**	**Fre 26.09.25**	**Fre 20.11.26**
103	Auftrags-und Projektbeginn	0 Tage	Fre 26.09.25	Fre 26.09.25
104	Finalisierung der Ausführungspläne für Werkplanung Raumzelle	2 Wochen	Mon 03.11.25	Fre 14.11.25
105	Werkplanung Raumzelle	3 Wochen	Mon 17.11.25	Fre 05.12.25
106	**Vorlage Werkplanung Raumzelle = Vertragstermin AN Bau**	**0 Tage**	**Fre 05.12.25**	**Fre 05.12.25**
107	Abstimmungen und Freigabe	1 Woche	Mon 08.12.25	Fre 12.12.25
108	**Lieferzeiten**	**120 Tage**	**Mon 15.12.25**	**Fre 29.05.26**
109	Lieferzeit Raumzelle, inkl. Typenstatik	6 Monate	Mon 15.12.25	Fre 29.05.26
110	**Vorbereitende Arbeiten, Baustelleneinrichtung**	**5 Tage**	**Mon 01.06.26**	**Fre 05.06.26**
111	Baustelleneinrichtung und Vorbereitung	1 Woche	Mon 01.06.26	Fre 05.06.26
112	**Rohrleitungsarbeiten, Herstellung Aufstellfläche**	**25 Tage**	**Mon 08.06.26**	**Fre 10.07.26**
113	Erstellung Rohrgräben	1 Woche	Mon 08.06.26	Fre 12.06.26
114	Verlegung Leerrohre	1 Woche	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26
115	Herstellung der Aufstellfläche / Bodenplatte	3 Wochen	Mon 22.06.26	Fre 10.07.26
116	**Raumzelle**	**20 Tage**	**Mon 13.07.26**	**Fre 07.08.26**
117	Aufstellung, Anschluss und Ausstattung Raumzelle	4 Wochen	Mon 13.07.26	Fre 07.08.26
118	Verfüllung und Oberflächenarbeiten zur Baufreiheit für AN TA	2 Wochen	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26
119	**Baufreiheit Raumzelle = Vertragstermin AN Bau**	**0 Tage**	**Fre 21.08.26**	**Fre 21.08.26**
120	Nachlauf Restarbeiten	2 Wochen	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26
121	Abbau Baustelleneinrichung	1 Woche	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26
122	**VOB Abnahme = Vertragstermin AN Bau**	**0 Tage**	**Fre 20.11.26**	**Fre 20.11.26**
