Umbau Bahnhofsgebäude zum Lesebahnhof Zerbst/Anhalt (Stand Fre 25.07.25)
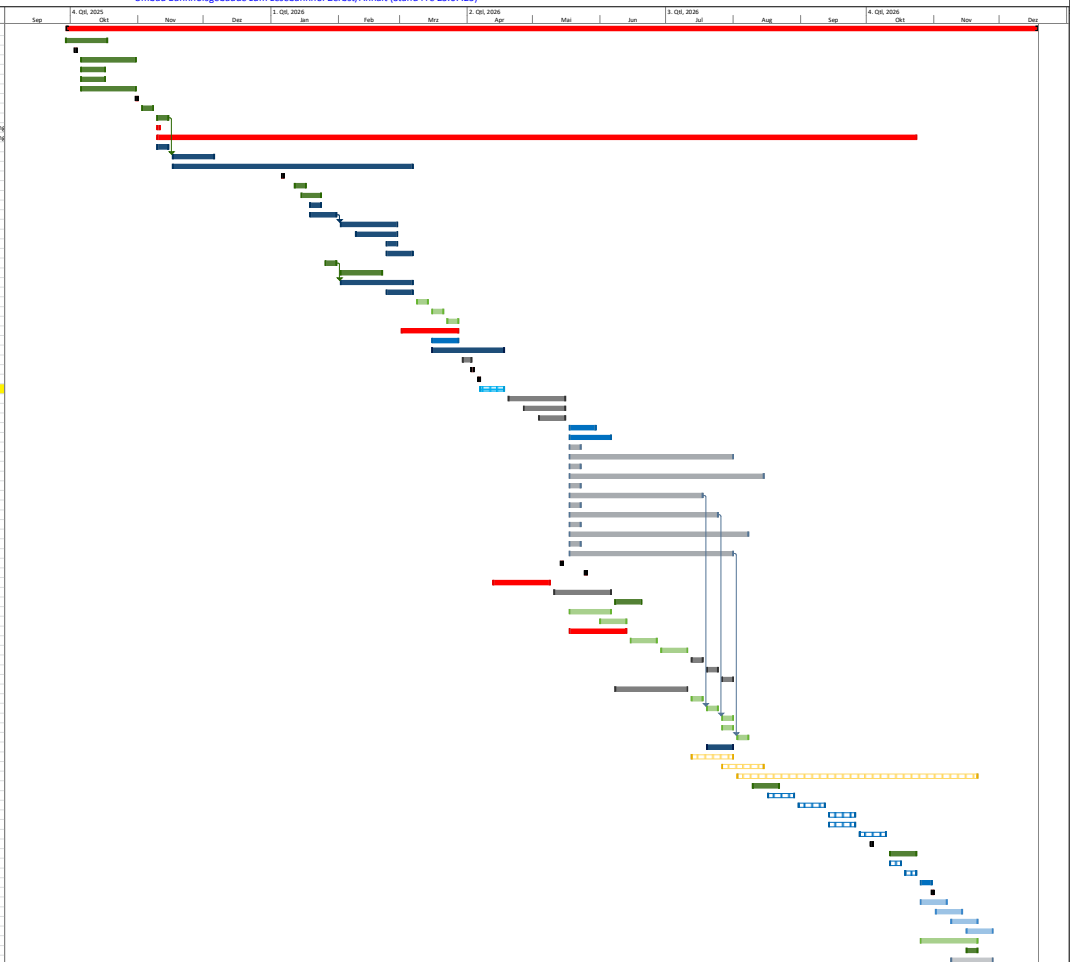
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Gewerk
1	**Lesebahnhof Zerbst/Anhalt**	**320 Tage**	**Mon 29.09.25**	**Fre 18.12.26**	**Dauer 27 Monate**
2	Abbruch nichttragende Elemente (Wände, Decken, Technik)	15 Tage	Mon 29.09.25	Fre 17.10.25	Los 01 - Abbruch und Rückbau
3	**Tag der Deutschen Einheit**	**1 Tag**	**Fre 03.10.25**	**Fre 03.10.25**	**gesetzlicher Feiertag**
4	Innengerüst für Abbruch Wandbeläge und Schornsteine	19 Tage	Mon 06.10.25	Don 30.10.25	Los 01 - Abbruch und Rückbau
5	Abbruch Schornsteine	9 Tage	Mon 06.10.25	Don 16.10.25	Los 01 - Abbruch und Rückbau
6	Abbruch gemauerte WC-Bereiche (Wände, Decke)	9 Tage	Mon 06.10.25	Don 16.10.25	Los 01 - Abbruch und Rückbau
7	Abbruch Wandbekleidungen (Verstärkungen, Putz)	19 Tage	Mon 06.10.25	Don 30.10.25	Los 01 - Abbruch und Rückbau
8	**Reformationstag**	**1 Tag**	**Fre 31.10.25**	**Fre 31.10.25**	**gesetzlicher Feiertag**
9	Abbruch Bodenbeläge (PVC, Dielung, Fliesen)	5 Tage	Mon 03.11.25	Fre 07.11.25	Los 01 - Abbruch und Rückbau
10	Abbruch Innentreppe (Holz) im mittleren Bereich	5 Tage	Mon 10.11.25	Fre 14.11.25	Los 01 - Abbruch und Rückbau
11	Errichtung Baustrom	1 Tag	Mon 10.11.25	Mon 10.11.25	Los 12a - Baustrom, Baubeleuchtung
12	Errichtung und Vorhaltung Baubeleuchtung	250 Tage	Mon 10.11.25	Fre 23.10.26	Los 12a - Baustrom, Baubeleuchtung
13	Baubegins, Baustelleneinrichtung, Bauzaum, WC-/Bürocontain	5 Tage	Mon 10.11.25	Fre 14.11.25	Los 02 - Rohbauarbeiten
14	Zimmererarbeiten: Schließen Decken nach Abbruch Innentrepp	15 Tage	Mon 17.11.25	Fre 05.12.25	Los 02 - Rohbauarbeiten
15	Maurerarbeiten, Abfangungen, Veränderungen Türöffnungen	80 Tage	Mon 17.11.25	Fre 06.03.26	Los 02 - Rohbauarbeiten
16	**Heilige 3 Könige**	**1 Tag**	**Die 06.01.26**	**Die 06.01.26**	**gesetzlicher Feiertag**
17	Abbruch Fußböden (komplett) Räume 0.02 und 0.20	5 Tage	Mon 12.01.26	Fre 16.01.26	Los 01 - Abbruch und Rückbau
18	Bodenaushub nach Abbruch Fußböden Räume 0.02 und 0.20	7 Tage	Don 15.01.26	Fre 23.01.26	Los 01 - Abbruch und Rückbau
19	Herstellen neuer Grundleitungen Räume 0.02, 0.20-0.22	5 Tage	Mon 19.01.26	Fre 23.01.26	Los 02 - Rohbauarbeiten
20	Herstellen Aufzugsschachtgrube und Bodenplatten 0.02, 0.20	10 Tage	Mon 19.01.26	Fre 30.01.26	Los 02 - Rohbauarbeiten
21	Errichtung Aufzugsschacht über 2 Etagen	20 Tage	Mon 02.02.26	Fre 27.02.26	Los 02 - Rohbauarbeiten
22	Zimmererarbeiten: Sanierung Decke über EG (Westgebäudeteil	15 Tage	Mon 09.02.26	Fre 27.02.26	Los 02 - Rohbauarbeiten
23	Zimmererarbeiten: Sanierung Decke über OG (Westgebäudeteil	5 Tage	Mon 23.02.26	Fre 27.02.26	Los 02 - Rohbauarbeiten
24	Zimmererarbeiten: notwendige Anpassungen im Dachbereich	10 Tage	Mon 23.02.26	Fre 06.03.26	Los 02 - Rohbauarbeiten
25	Abbruch Treppe im östlichen Gebäudeteil über 3 Etagen	5 Tage	Mon 26.01.26	Fre 30.01.26	Los 01 - Abbruch und Rückbau
26	Abbruch Fußböden (komplett) bis auf die Rohbau-Kappendecke	15 Tage	Mon 02.02.26	Fre 20.02.26	Los 01 - Abbruch und Rückbau
27	Erstellen neue Stahlbeton-Geschosstreppe über 3 Etagen	25 Tage	Mon 02.02.26	Fre 06.03.26	Los 02 - Rohbauarbeiten
28	Errichtung Podestebene Übergang Ostteil zur Mittelteil	10 Tage	Mon 23.02.26	Fre 06.03.26	Los 02 - Rohbauarbeiten
29	F30-Decke über OG (Abschottung zum Dachraum) Räume 1.01-5	5 Tage	Mon 09.03.26	Fre 13.03.26	Los 06 - Trockenbauarbeiten
30	F30-Decke über OG (Abschottung zum Dachraum) Räume 1.05-5	5 Tage	Mon 16.03.26	Fre 20.03.26	Los 06 - Trockenbauarbeiten
31	F30-Decke über OG (Abschottung zum Dachraum) Räume 1.20-5	5 Tage	Mon 23.03.26	Fre 27.03.26	Los 06 - Trockenbauarbeiten
32	**Elektroinstallation: Vormontage (auf Gewölbedecken)**	**20 Tage**	**Mon 02.03.26**	**Fre 27.03.26**	**Los 12 - Elektroinstallation**
33	Treppengeländer: Aufmaß und Werkplanung	10 Tage	Mon 16.03.26	Fre 27.03.26	Los 05 - Treppengeländer
34	Brandschutztüren: Aufmaß und Werkplanung (inkl. Freigabe)	25 Tage	Mon 16.03.26	Fre 17.04.26	Los 08 - Brandschutz-/Stahltüren
35	Zementestricharbeiten: Ausgleichestrich im Erdgeschoss	4 Tage	Mon 30.03.26	Don 02.04.26	Los 15a - Zementestricharbeiten
36	**Karfreitag**	**1 Tag**	**Fre 03.04.26**	**Fre 03.04.26**	**gesetzlicher Feiertag**
37	**Ostermontag**	**1 Tag**	**Mon 06.04.26**	**Mon 06.04.26**	**gesetzlicher Feiertag**
38	Heizungsanlage: Verlegung Fußbodenheizung im Erdgeschoss	9 Tage	Die 07.04.26	Fre 17.04.26	Los 11 - Heizungsanlage
39	Zementestrich über Gewölberäumen 0.03 bis 0.10	20 Tage	Mon 20.04.26	Fre 15.05.26	Los 15a - Zementestricharbeiten
40	Zementestrich über Gewölberaum 0.11 und 0.24	15 Tage	Mon 27.04.26	Fre 15.05.26	Los 15a - Zementestricharbeiten
41	Zementestrich auf neuer Bodenplatte Räume 0.01, 0.02, 0.20,	10 Tage	Mon 04.05.26	Fre 15.05.26	Los 15a - Zementestricharbeiten
42	Treppengeländer: Montage Geländer TR 1 und Übergang	10 Tage	Mon 18.05.26	Fre 29.05.26	Los 05 - Treppengeländer
43	Aufzugsanlage: Rohmontage (ohne Inbetriebnahme)	15 Tage	Mon 18.05.26	Fre 05.06.26	Los 14 - Aufzugsanlage
44	Raumgerüst Eingangshalle 0.02.1 und 0.02.2 (Aufbau)	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26	Los 04 - Gerüstbauarbeiten
45	Raumgerüst Eingangshalle 0.02.1 und 0.02.2 (Vorhaltung)	55 Tage	Mon 18.05.26	Fre 31.07.26	Los 04 - Gerüstbauarbeiten
46	Raumgerüst Räume (Säle) 0.03.1/3 und 0.06.1 (Aufbau)	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26	Los 04 - Gerüstbauarbeiten
47	Raumgerüst Räume (Säle) 0.03.1/3 und 0.06.1 (Vorhaltung)	65 Tage	Mon 18.05.26	Fre 14.08.26	Los 04 - Gerüstbauarbeiten
48	Raumgerüst Räume 0.07, 0.08 und 0.09 (Aufbau)	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26	Los 04 - Gerüstbauarbeiten
49	Raumgerüst Räume 0.07, 0.08 und 0.09 (Vorhaltung)	45 Tage	Mon 18.05.26	Fre 17.07.26	Los 04 - Gerüstbauarbeiten
50	Raumgerüst Räume 0.03.2, 0.04, 0.05, 0.06.2, 0.06.3 (Aufbau)	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26	Los 04 - Gerüstbauarbeiten
51	Raumgerüst Räume 0.03.2, 0.04, 0.05, 0.06.2, 0.06.3 (Vorhalt	50 Tage	Mon 18.05.26	Fre 24.07.26	Los 04 - Gerüstbauarbeiten
52	Rollgerüst Räume 0.20.1 bis 0.20.4 (Aufbau)	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26	Los 04 - Gerüstbauarbeiten
53	Rollgerüst Räume 0.20.1 bis 0.20.4 (Vorhaltung)	60 Tage	Mon 18.05.26	Fre 07.08.26	Los 04 - Gerüstbauarbeiten
54	Rollgerüst Raum 0.11 (Aufbau)	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26	Los 04 - Gerüstbauarbeiten
55	Rollgerüst Raum 0.11 (Vorhaltung)	55 Tage	Mon 18.05.26	Fre 31.07.26	Los 04 - Gerüstbauarbeiten
56	**Christi Himmelfahrt**	**1 Tag**	**Don 14.05.26**	**Don 14.05.26**	**gesetzlicher Feiertag**
57	**Pfingstmontag**	**1 Tag**	**Mon 25.05.26**	**Mon 25.05.26**	**gesetzlicher Feiertag**
58	**Elektroinstallation: Vormontage OG (Wände schlitzen, Decke**	**20 Tage**	**Mon 13.04.26**	**Fre 08.05.26**	**Los 12 - Elektroinstallation**
59	Innenputzarbeiten im Obergeschoss	20 Tage	Mon 11.05.26	Fre 05.06.26	Los 07 - Innenputzarbeiten
60	Innen-Holztüren: Aufmaß und Werkplanung (inkl. Freigabe)	10 Tage	Mon 08.06.26	Fre 19.06.26	Los 09 - Innen-Holztüren
61	F30-Decke über EG Räume 0.09.2, 0.04, 0.05, 0.06.2, 0.06.3, 0	15 Tage	Mon 18.05.26	Fre 05.06.26	Los 06 - Trockenbauarbeiten
62	F30-Decke über EG Räume 0.11, 0.20.1 bis 0.20.4, 0.21	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26	Los 06 - Trockenbauarbeiten
63	**Elektroinstallation: Vormontage EG (Wände schlitzen, Decke)**	**20 Tage**	**Mon 18.05.26**	**Fre 12.06.26**	**Los 12 - Elektroinstallation**
64	Einbau Deckenprofilraster Räume 1.01 bis 1.04	10 Tage	Mon 15.06.26	Fre 26.06.26	Los 06 - Trockenbauarbeiten
65	Einbau Deckenprofilraster Räume 1.20 bis 1.26	10 Tage	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26	Los 06 - Trockenbauarbeiten
66	Fußboden mit OSB-Platten (Trockenestrich) Räume 1.02 bis 1.05	Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26	Los 15b - Trockenestrich
67	Fußboden mit OSB-Platten (Trockenestrich) Räume 1.05 bis 1.05	Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26	Los 15b - Trockenestrich
68	Fußboden mit OSB-Platten (Trockenestrich) Räume 1.21 bis 1.25	Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26	Los 15b - Trockenestrich
69	Innenputzarbeiten im Erdgeschoss	25 Tage	Mon 08.06.26	Fre 10.07.26	Los 07 - Innenputzarbeiten
70	Einbau Deckenprofilraster Räume 0.07 bis 0.09	5 Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26	Los 06 - Trockenbauarbeiten
71	Einbau Wände Räume 0.07 und 0.09	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26	Los 06 - Trockenbauarbeiten
72	Einbau Deckenprofilraster Räume 0.03.2 und 0.04	5 Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26	Los 06 - Trockenbauarbeiten
73	Einbau Wände Räume 0.20.2 bis 0.20.4	5 Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26	Los 06 - Trockenbauarbeiten
74	Einbau Deckenprofilraster Räume 0.11, 0.20.1 bis 0.20.4, 0.21	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26	Los 06 - Trockenbauarbeiten
75	Einbau der Türen komplett (Zarge und Türblatt)	10 Tage	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26	Los 08 - Brandschutz-/Stahltüren
76	Malerarbeiten (Aufarbeitung Hallendecke 0.02.1/2)	15 Tage	Mon 13.07.26	Fre 31.07.26	Los 18 - Malerarbeiten
77	Malerarbeiten (Aufarbeitung Raumdecken 0.03.1 und 0.06.1)	15 Tage	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26	Los 18 - Malerarbeiten
78	Malerarbeiten (Wände und Decken)	80 Tage	Mon 03.08.26	Fre 20.11.26	Los 18 - Malerarbeiten
79	Einbau der Türzargen für die Holztüren	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26	Los 09 - Innen-Holztüren
80	Fliesenarbeiten: Treppenhaus 1	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26	Los 16 - Fliesen- /Plattenarbeiten
81	Wandfliesen WC-Räume 0.02.2, 0.07.2/0.07.3, 0.20.4 bis 0.20.4	10 Tage	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26	Los 16 - Fliesen- /Plattenarbeiten
82	Wandfliesen WC-Räume 1.25.2 bis 1.25.5, 1.26	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26	Los 16 - Fliesen- /Plattenarbeiten
83	Bodenfliesen WC-Räume 0.02.2, 0.07.2/0.07.3, 0.20.4 bis 0.20.	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26	Los 16 - Fliesen- /Plattenarbeiten
84	Bodenfliesen WC-Räume 1.25.2 bis 1.25.5, 1.26	10 Tage	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26	Los 16 - Fliesen- /Plattenarbeiten
85	**Tag der Deutschen Einheit**	**1 Tag**	**Sam 03.10.26**	**Sam 03.10.26**	**gesetzlicher Feiertag**
86	Aufarbeiten/Instandsetzen Holz-Geschosstreppe (Treppenhaus	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26	Los 22 - Aufarbeitung Holztreppe
87	Bodenfliesen Vorhalle 0.20.1	5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26	Los 16 - Fliesen- /Plattenarbeiten
88	Bodenfliesen Eingangshalle 0.01, 0.02.1 und 0.02.2	5 Tage	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26	Los 16 - Fliesen- /Plattenarbeiten
89	Aufzugsanlage: Inbetriebnahme und Sachverständigenabnahme	5 Tage	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26	Los 14 - Aufzugsanlage
90	**Reformationstag**	**1 Tag**	**Sam 31.10.26**	**Sam 31.10.26**	**gesetzlicher Feiertag**
91	Bodenbelagsarbeiten im EG Räume 0.03.1 bis 0.06.2	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26	Los 17 - Bodenbelagsarbeiten
92	Bodenbelagsarbeiten im EG Räume 0.07 bis 0.09, 0.11	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26	Los 17 - Bodenbelagsarbeiten
93	Bodenbelagsarbeiten im OG Räume 1.04 bis 1.04 sowie 1.05 bis	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26	Los 17 - Bodenbelagsarbeiten
94	Bodenbelagsarbeiten im OG Räume 1.21 bis 1.24	10 Tage	Mon 16.11.26	Fre 27.11.26	Los 17 - Bodenbelagsarbeiten
95	Einlagen Deckenplatten und Schließen der Unterhangdecken	20 Tage	Mon 26.10.26	Fre 20.11.26	Los 06 - Trockenbauarbeiten
96	Einbau der Türblätter für die Holztüren	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	Los 09 - Holz-Innentüren
97	Bauschlussreinigung	15 Tage	Mon 09.11.26	Fre 27.11.26	Los 20 - Baureinigung
98	Ausstattung - Lieferung und Montage	15 Tage	Mon 23.11.26	Fre 11.12.26	Los 21 - Ausstattung
99	Schließanlage	5 Tage	Mon 30.11.26	Fre 04.12.26	Los 19 - Schließanlage
