# Neubau Grundschule Döbeln Ost

| Nr. | Vorgang | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger | Nachfolger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | | Montagen HK im EG | 3 Wochen | Mon 05.01.26 | Fre 23.01.26 | 95EA-4 Wochen | 97;98 |
| 97 | | IB Heizung-1 (provi. Betrieb) | 1 Woche | Mon 26.01.26 | Fre 30.01.26 | 96 | |
| 98 | | Montagen HK im OG | 3 Wochen | Mon 26.01.26 | Fre 13.02.26 | 96 | |
| 99 | | Rohmontage Boden Heizung | 20 Tage | Die 07.10.25 | Die 04.11.25 | | |
| 102 | | Verlegung Fußbodenheizung Estrich | 2 Wochen | Die 14.10.25 | Mon 27.10.25 | 73AA+1 Woche | 74;103EE |
| 103 | | Verlegung Fußbodenheizung Trockenestrich | 1 Woche | Die 21.10.25 | Mon 27.10.25 | 102EE | |
| 104 | | Feinmontage | 8 Wochen | Mon 20.04.26 | Fre 12.06.26 | 116 | 112EE;67EE;106 |
| 105 | | Mängelbeseitigung / IB /Probebetrieb | 45 Tage | Fre 12.06.26 | Don 13.08.26 | | |
| 106 | | Abnahmen / Fertigstellung Sanitär / Heizung | 0 Tage | Fre 12.06.26 | Fre 12.06.26 | 104 | 122AA |
| 107 | | Abnahmen / Fertigstellung Lüftung / GA | 0 Tage | Fre 12.06.26 | Fre 12.06.26 | 104 | |
| 108 | | Aufzug | 410 Tage | Mon 04.11.24 | Fre 26.06.26 | | |
| 109 | | Werkplanung | 6 Wochen | Mon 04.11.24 | Fre 13.12.24 | 110AE | |
| 110 | | Übergabe Einbauteile | 1 Woche | Mon 25.11.24 | Fre 29.11.24 | 15AA | 109AE |
| 111 | | Montage | 4 Wochen | Die 12.08.25 | Mon 08.09.25 | 46AA | |
| 112 | | Inbetriebnahme | 1 Woche | Mon 08.06.26 | Fre 12.06.26 | 104EE | |
| 113 | | Fliesen | 4 Wochen | Die 06.01.26 | Mon 02.02.26 | 82 | |
| 114 | | Innentüren | 16 Wochen | Die 13.01.26 | Mon 04.05.26 | 117EE;82 | |
| 115 | | Bodenbeläge | 45 Tage | Die 03.03.26 | Mon 04.05.26 | | |
| 116 | | EG | 6 Wochen | Die 03.03.26 | Mon 13.04.26 | 119AA+2 Wochen | 104 |
| 117 | | OG | 6 Wochen | Die 24.03.26 | Mon 04.05.26 | 120AA+2 Wochen | 114EE;121 |
| 118 | | Maler | 75 Tage | Die 17.02.26 | Mon 01.06.26 | | |
| 119 | | EG | 4 Wochen | Die 17.02.26 | Mon 16.03.26 | 58AA+2 Wochen | 116AA+2 Woche |
| 120 | | OG | 4 Wochen | Die 10.03.26 | Mon 06.04.26 | 64AA+2 Wochen | 117AA+2 Woche |
| 121 | | Nacharbeiten | 4 Wochen | Die 05.05.26 | Mon 01.06.26 | 117 | |
| 122 | | Nacharbeiten, Komplettierung, Inbetriebnahmen, Mangelbeseitigung, Abnahmen | 4 Wochen | Mon 15.06.26 | Fre 10.07.26 | 106AA | 123EE;12EE |
| 123 | | Möblierung, Ausstattung | 4,8 Wochen | Die 30.06.26 | Fre 31.07.26 | 122EE | 33AA;37AA |
| 124 | | Baureinigung | 55 Tage | Mon 01.06.26 | Fre 14.08.26 | | |
| 125 | | Vorreinigung Inbetriebnahme | 22 Tage | Mon 01.06.26 | Die 30.06.26 | | |
| 126 | | Feinreinigung Übergabe | 15 Tage | Mon 27.07.26 | Fre 14.08.26 | | |
| 127 | | Umzug Schule | 15 Tage? | Mon 27.07.26 | Fre 14.08.26 | | |
| 128 | | Erdarbeiten, Rest aus Los Erschließung / Erdarbeiten | 10 Tage | Mon 10.03.25 | Fre 21.03.25 | | |
| 129 | | Verfüllung Arbeitsraum | 2 Wochen | Mon 10.03.25 | Fre 21.03.25 | 18;19 | 131;25 |
| 130 | | Außenanlagen | 410 Tage | Mon 24.03.25 | Fre 30.10.26 | | |
| 131 | | Unterbau Laufbahn und Spielfeld | 4 Monate | Mon 24.03.25 | Fre 11.07.25 | 129 | 132 |
| 132 | | Vorbereitung Ost | 3 Monate | Mon 14.07.25 | Fre 03.10.25 | 131 | |
| 133 | | Anschluss an Gebäude West, Nord, Ost | 2 Monate | Mon 19.01.26 | Fre 13.03.26 | 27 | 134AA;135AA |
| 134 | | Spielfeld, Oberflächen usw. West, Nord, Ost, Innenhof | 6 Monate | Mon 02.03.26 | Fre 14.08.26 | 133AA | |
| 135 | | Außenanlage Süd-West | 6 Monate | Mon 19.01.26 | Fre 03.07.26 | 133AA | 136EA-4 Woche |
| 136 | | Außenanlage Süd-Ost | 6 Monate | Mon 18.05.26 | Fre 30.10.26 | 135EA-4 Wochen | |

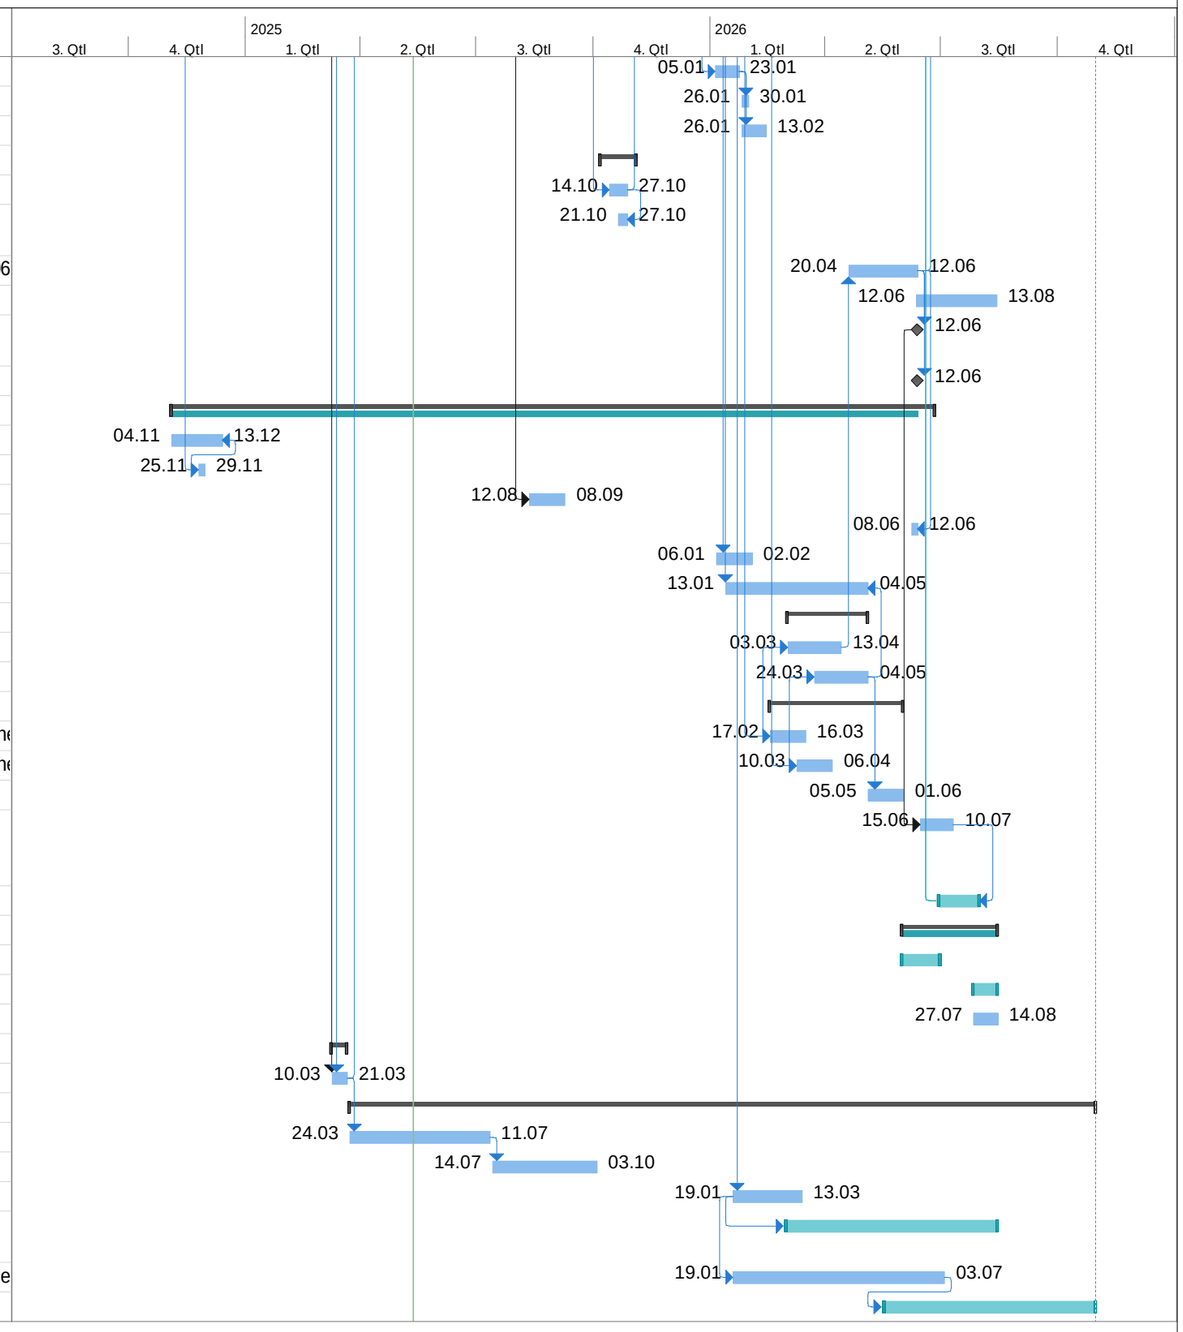


Projekt: DÖB_SCH
Datum: Die 13.05.25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorgang | | Projektsammelvorgang | | Manueller Vorgang | | Nur Anfang | | Stichtag | |
| Unterbrechung | | Inaktiver Vorgang | | Nur Dauer | | Nur Ende | | In Arbeit | |
| Meilenstein | | Inaktiver Meilenstein | | Manueller Sammelrollup | | Externe Vorgänge | | Manueller Fortschritt | |
| Sammelvorgang | | Inaktiver Sammelvorgang | | Manueller Sammelvorgang | | Externer Meilenstein | | | |
