PV-Anlage Karstens Gastroservice Frankenberg

von Elektroanlagen Henry Sambale

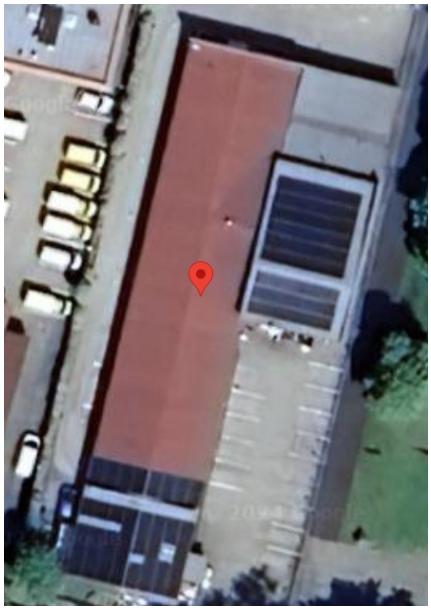

Gebäudetyp:
Gastgewerbebauten

Baumaßnahme:
Sanierung / Modernisierung

Baustellenadresse:
Max-Kästner-Straße 36
09669 Frankenberg

beteiligt als:
Auftragnehmer

Auftragssumme:
€ 63.600

Ausführungsjahr(e):
2021

Gewerke:
Elektro

Beschreibung der ausgeführten Leistungen

Planung und Montage einer PV-Anlage mit 58,5kWp und NA-Schutz.

Verwendete Materialien/Bauteile

180x Sonnenstromfabrik EXCELLENT GLASS/GLASS 325 Wp
180x SolarEdge Optimierer P370
1x SolarEdge Wechselrichter SE55K 55kW
Installationsmaterialien z.B. Installationsrohre und Kabelkanäle

Beteiligte Unternehmen

Autraggeber / Bauherr	Architekten und Fachplaner	Handwerker und Lieferanten
Karstens Gastroservice GmbH Chemnitzer Straße 44 09212 Limbach-Oberfrohna	nicht angegeben	Elektroanlagen Henry Sambale Krumbacher Straße 4 09244 Lichtenau GÄFGEN Elektrogroßhandel GmbH Industriestraße 8 09496 Marienberg
