Stand: 18.12.2024
Index: 00

Taktplan Ausbauarbeiten - Regeltakt
Neubau Campus Dösner Weg
Gemeinschaftsschule (GMS)

Nr.	Vorgangsname
1	**Takt 01 - Vorleistungen in darüber liegender Ebene**
2	GK-Wände anlegen (Einmessen)
3	Anzeichnen Kernbohrungen im Boden
4	Ausführen Kernbohrungen
5	HLS-Schachtmontage
6	**Takt 02**
7	Innenputz
8	UK, 1. Bepl., Verstärk., DB, Stürze kompl.
9	San'inst'elemente und Deckendurchdringungen (in Bearbeitungsebene)
10	HLS-Fortführung Schachtmontage / Rohinstallation
11	Schachtmontage Küchentechnik
12	ELT-Trasseninstallation
13	**Takt 03**
14	Kontrolle DB/Anzeichnen DB, falls Abweichungen von S+D an Wänden aus TB und MW
15	Korrekturen DB (in Massivwänden/Decken)
16	HLS-Fortführung Rohinstallation
17	HLS-Druckprüfung
18	**Takt 04**
19	HLS Dämmung Schächte
20	Brandschutzschotts Schächte
21	Rohinstallation HSL Decken
22	**Takt 05**
23	HLS Dämmung Decken
24	ELT Kabelzug Wände
25	MSR Kabelzug Wände
26	Freigabe Wandverschluss
27	**Takt 06**
28	2. Beplankung, spachteln, schleifen
29	Brandschutzschotts ELT/MSR (MW/STB/GK)
30	**Takt 07**
31	Stahltüren / Türzargen
32	Einbauteile Schlosser in/an Estrich
33	Einbauten Küchentechnik, TGA in/unter Estrich
34	Kühlzellen einbauen
35	Fußbodenheizung
36	Druckprüfung Fußbodenheizung
37	Freigabe Estricheinbau
38	**Takt 08**
39	Estrich
40	**Takt 09**
41	Funktionsheizen Estrich
42	Schachtverschlüsse
43	Rohrrahmentüren
44	Elementierte Trennwände
45	Fensterlaibungen innen
46	Schlosserleistungen (raumbildend)
47	Abdichtungen Fliesen Wand
48	Fliesen Wand Nassräume
49	**Takt 10**
50	Decken (Einbau, Spachteln, Schleifen)
51	Akustikdecke Holz
52	**Takt 11**
53	Akustikdecke Holz
54	Maler
55	Abdichtung Wand/Boden Küche
56	**Takt 12**
57	Beschichtungen, Sockel
58	Bodenbelag, Sockel
59	Fliesen Küche
60	Abdichtung Boden Nassräume
61	Fliesen Boden Nassräume
62	**Takt 13**
63	Heizflächen
64	Türblätter
65	Festeinbauten Tischler
66	Festeinbauten Küche
67	Schlosserleistungen fein (Abdeckungen, Geländer)
68	**Takt 14**
69	Endmontagen TGA
70	Endmontagen Kücheneinrichtungen
71	Verfugung
72	Restleistungen/Reinigungen

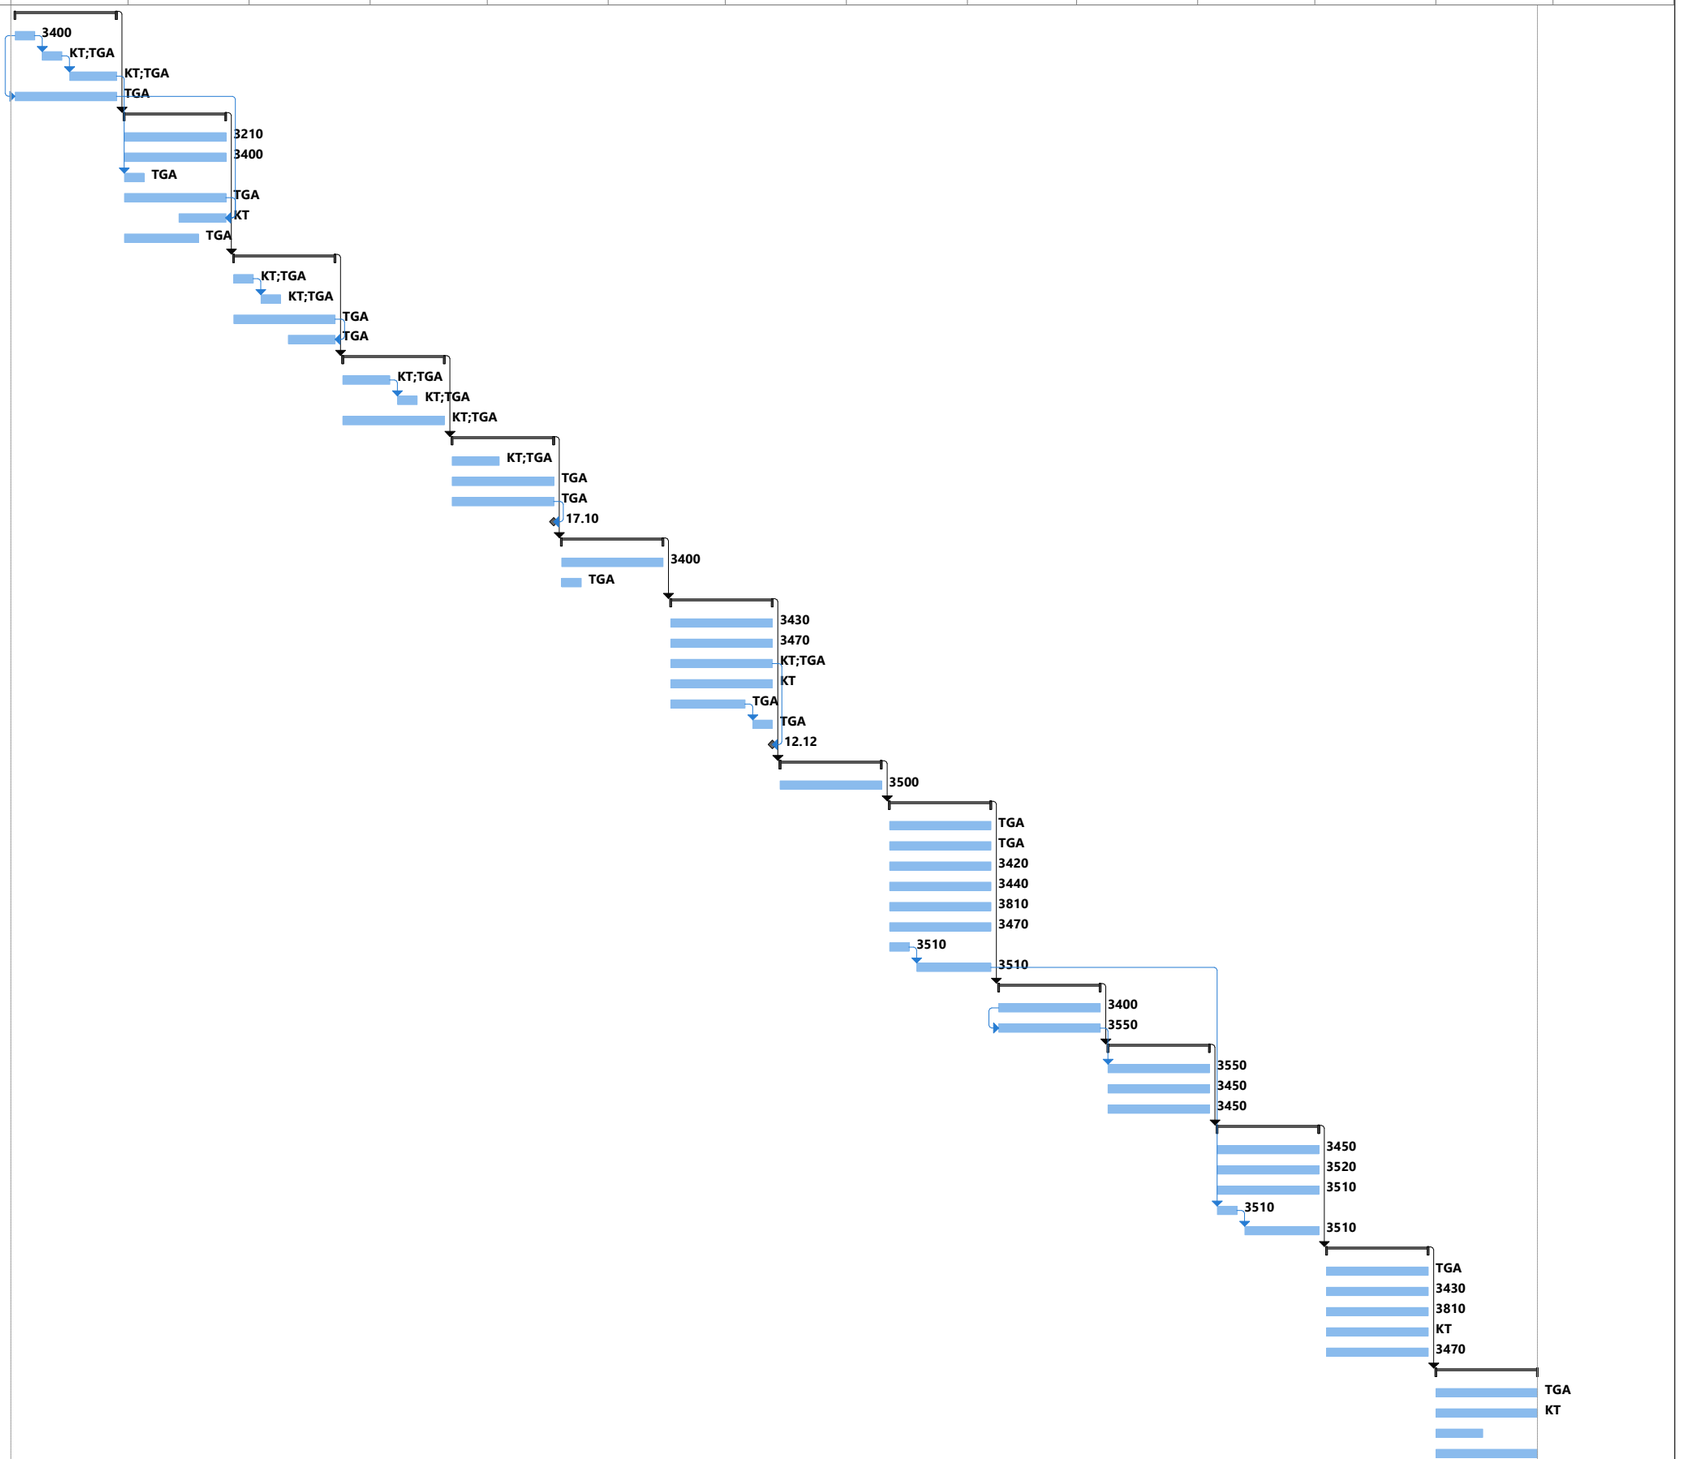

Projekt: Neubau Campus Dösn

Vorgang	Sammelvorgang	Inaktiver Meilenstein	Nur Dauer	Nur Anfang	Externer Meilenstein	Manueller Fortschritt
Unterbrechung	Projektsammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelrollup	Nur Ende	Stichtag	
Meilenstein	Inaktiver Vorgang	Manueller Vorgang	Manueller Sammelvorgang	Externe Vorgänge	In Arbeit	
