Bauablaufplan

Nr	Name	Anfang	Ende	Gewerk	Dauer(AT)	Dauer
1	**Bauabschnitt 01**	**Di, 15.07.25**	**Mi, 17.12.25**		**109 Tage**	**156 Tage**
1.1	Bestellung Schranken	Mo, 28.07.25	Fr, 19.09.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	40 Tage	54 Tage
1.2	Kabelsondierung ELT / FMIT TA01	Di, 15.07.25	Mi, 16.07.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	2 Tage	2 Tage
1.3	Kabelsondierung ELT / FMIT TA02	Do, 17.07.25	Fr, 18.07.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	2 Tage	2 Tage
1.4	Kabelsondierung ELT / FMIT TA00	Mo, 21.07.25	Mi, 23.07.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	3 Tage	3 Tage
1.5	Kabelsondierung ELT / FMIT TA08	Do, 24.07.25	Fr, 25.07.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	2 Tage	2 Tage
1.6	Kabelsondierung ELT / FMIT TA22	Mo, 28.07.25	Di, 29.07.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	2 Tage	2 Tage
1.7	Umbau Wache und Serverraum Parkhaus	Di, 23.09.25	Mi, 24.09.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	2 Tage	2 Tage
1.7.1	Einrichtung Server und Bedienplatz	Di, 23.09.25	Mi, 24.09.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	2 Tage	2 Tage
1.8	**Toranlage 01 - Hauptzufahrt Süd**	**Mo, 22.09.25**	**Do, 30.10.25**		**28 Tage**	**39 Tage**
1.8.1	Baubeginn TA01	Mo, 22.09.25	Mo, 22.09.25	Allgemein		
1.8.2	Baustelleneinrichtung	Mo, 22.09.25	Mo, 22.09.25	Allgemein	1 Tag	1 Tag
1.8.3	Umbau Unterverteilung Wache Haus 52	Di, 23.09.25	Do, 25.09.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	3 Tage	3 Tage
1.8.4	Demontage Säulen und Schranken	Fr, 26.09.25	Mo, 29.09.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	2 Tage	4 Tage
1.8.5	Bauphase 1	Di, 23.09.25	Fr, 10.10.25	Verkehrswegebau	13 Tage	18 Tage
1.8.5.1	*Rückbau Verkehrswege/-inseln*	*Di, 23.09.25*	*Di, 30.09.25*	*Verkehrswegebau*	*6 Tage*	*8 Tage*
1.8.5.2	*Herstellen/Verfüllen Leitungsgräben (Leerrohre)*	*Di, 30.09.25*	*Do, 02.10.25*	*Verkehrswegebau*	*3 Tage*	*3 Tage*
1.8.5.3	*Wiederherstellen Verkehrswege/-inseln*	*Do, 02.10.25*	*Fr, 10.10.25*	*Verkehrswegebau*	*6 Tage*	*9 Tage*
1.8.6	Bauphase 2	Mo, 13.10.25	Do, 23.10.25	Verkehrswegebau	9 Tage	11 Tage
1.8.6.1	*Rückbau Verkehrswege/-inseln*	*Mo, 13.10.25*	*Fr, 17.10.25*	*Verkehrswegebau*	*5 Tage*	*5 Tage*
1.8.6.2	*Herstellen/Verfüllen Leitungsgräben*	*Fr, 17.10.25*	*Mo, 20.10.25*	*Verkehrswegebau*	*2 Tage*	*4 Tage*
1.8.6.3	*Wiederherstellen Verkehrswege/-inseln*	*Mo, 20.10.25*	*Do, 23.10.25*	*Verkehrswegebau*	*4 Tage*	*4 Tage*
1.8.7	Außenverteiler errichten, Kabel ziehen	Di, 14.10.25	Mo, 20.10.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	5 Tage	7 Tage
1.8.8	Montage Säulen und Schranken	Fr, 24.10.25	Mo, 27.10.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	2 Tage	4 Tage
1.8.9	Umbau Kassenautomat	Di, 28.10.25	Mi, 29.10.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	2 Tage	2 Tage
1.8.10	Inbetriebnahme TA01	Do, 30.10.25	Do, 30.10.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	1 Tag	1 Tag
1.8.11	Baustellenräumung	Do, 30.10.25	Do, 30.10.25	Allgemein	1 Tag	1 Tag
1.8.12	Bauende TA01	Do, 30.10.25	Do, 30.10.25	Allgemein		
1.9	**Toranlage 02 - Hauptzufahrt Nord**	**Mo, 29.09.25**	**Do, 30.10.25**		**23 Tage**	**32 Tage**
1.9.1	Baubeginn TA02	Mo, 29.09.25	Mo, 29.09.25	Allgemein		
1.9.2	Baustelleneinrichtung	Mo, 29.09.25	Mo, 29.09.25	Allgemein	1 Tag	1 Tag
1.9.3	Umbau Unterverteilung Haus 30	Di, 30.09.25	Do, 02.10.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	3 Tage	3 Tage
1.9.4	Demontage Säulen und Schranken	Mo, 06.10.25	Di, 07.10.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	2 Tage	2 Tage
1.9.5	Bauphase 1	Mo, 06.10.25	Mi, 15.10.25	Verkehrswegebau	8 Tage	10 Tage
1.9.5.1	*Rückbau Verkehrswege/-inseln*	*Mo, 06.10.25*	*Do, 09.10.25*	*Verkehrswegebau*	*4 Tage*	*4 Tage*
1.9.5.2	*Herstellen/Verfüllen Leitungsgräben (Leerrohre)*	*Do, 09.10.25*	*Fr, 10.10.25*	*Verkehrswegebau*	*2 Tage*	*2 Tage*
1.9.5.3	*Wiederherstellen Verkehrswege/-inseln*	*Fr, 10.10.25*	*Mi, 15.10.25*	*Verkehrswegebau*	*4 Tage*	*6 Tage*
1.9.6	Bauphase 2	Do, 16.10.25	Do, 23.10.25	Verkehrswegebau	6 Tage	8 Tage
1.9.6.1	*Rückbau Verkehrswege/Inseln*	*Do, 16.10.25*	*Mo, 20.10.25*	*Verkehrswegebau*	*3 Tage*	*5 Tage*
1.9.6.2	*Wiederherstellen Verkehrswege/-inseln*	*Mo, 20.10.25*	*Do, 23.10.25*	*Verkehrswegebau*	*4 Tage*	*4 Tage*
1.9.7	Außenverteiler umbauen	Di, 14.10.25	Mo, 20.10.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	5 Tage	7 Tage
1.9.8	Montage Säulen und Schranken	Fr, 24.10.25	Mo, 27.10.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	2 Tage	4 Tage
1.9.9	Umbau Kassenautomat	Di, 28.10.25	Mi, 29.10.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	2 Tage	2 Tage
1.9.10	Inbetriebnahme TA02	Do, 30.10.25	Do, 30.10.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	1 Tag	1 Tag
1.9.11	Baustellenräumung	Do, 30.10.25	Do, 30.10.25	Allgemein	1 Tag	1 Tag
1.9.12	Bauende TA02	Do, 30.10.25	Do, 30.10.25	Allgemein		
1.10	**Toranlage 00 - Parkhaus**	**Mo, 06.10.25**	**Di, 02.12.25**		**40 Tage**	**58 Tage**
1.10.1	Baubeginn TA00	Mo, 06.10.25	Mo, 06.10.25	Allgemein		
1.10.2	Baustelleneinrichtung	Mo, 06.10.25	Mo, 06.10.25	Allgemein	1 Tag	1 Tag
1.10.3	Umbau Unterverteilung Haus 97	Mo, 06.10.25	Do, 09.10.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	4 Tage	4 Tage
1.10.4	Demontage Säulen und Schranken	Fr, 10.10.25	Mo, 13.10.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	2 Tage	4 Tage
1.10.5	**TA00.1 (Ein-/Ausfahrt Nord)**	**Do, 06.11.25**	**Di, 25.11.25**	**Verkehrswegebau**	**13 Tage**	**20 Tage**
1.10.5.1	*Rückbau Verkehrswege/-inseln*	*Do, 06.11.25*	*Fr, 21.11.25*	*Verkehrswegebau*	*5 Tage*	*7 Tage*
1.10.5.2	*Herstellen/Verfüllen Leitungsgräben (Leerrohre)*	*Di, 11.11.25*	*Mi, 12.11.25*	*Verkehrswegebau*	*2 Tage*	*2 Tage*
1.10.5.3	Wiederherstellen Verkehrswege/-inseln	Do, 13.11.25	Di, 25.11.25	Verkehrswegebau	6 Tage	8 Tage
1.10.6	**TA00.2 (Einfahrt West)**	**Mo, 20.10.25**	**Do, 30.10.25**	**Verkehrswegebau**	**9 Tage**	**11 Tage**
1.10.6.1	*Rückbau Verkehrswege/-inseln*	*Mo, 20.10.25*	*Mi, 22.10.25*	*Verkehrswegebau*	*3 Tage*	*3 Tage*
1.10.6.2	*Herstellen/Verfüllen Leitungsgräben (Leerrohre)*	*Do, 23.10.25*	*Fr, 24.10.25*	*Verkehrswegebau*	*2 Tage*	*2 Tage*
1.10.6.3	*Wiederherstellen Verkehrswege/-inseln*	*Mo, 27.10.25*	*Do, 30.10.25*	*Verkehrswegebau*	*4 Tage*	*4 Tage*
1.10.7	Außenverteiler errichten, Kabel ziehen	Mo, 03.11.25	Fr, 07.11.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	5 Tage	5 Tage
1.10.8	Montage Säulen und Schranken	Mo, 03.11.25	Do, 27.11.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	3 Tage	3 Tage
1.10.9	Umbau Kassenautomat	Fr, 28.11.25	Mo, 01.12.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	2 Tage	4 Tage
1.10.10	Inbetriebnahme TA00	Di, 02.12.25	Di, 02.12.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	1 Tag	1 Tag
1.10.11	Baustellenräumung	Di, 02.12.25	Di, 02.12.25	Allgemein	1 Tag	1 Tag
1.10.12	Bauende TA00	Di, 02.12.25	Di, 02.12.25	Allgemein		
1.11	**Toranlage 08 - Schubertstr.**	**Do, 20.11.25**	**Mi, 10.12.25**		**15 Tage**	**21 Tage**
1.11.1	Baubeginn TA08	Do, 20.11.25	Do, 20.11.25	Allgemein		
1.11.2	Baustelleneinrichtung	Do, 20.11.25	Do, 20.11.25	Allgemein	1 Tag	1 Tag
1.11.3	Umbau Unterverteilung Haus 42	Do, 20.11.25	Fr, 21.11.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	2 Tage	2 Tage
1.11.4	Demontage Säulen und Schranken	Mo, 24.11.25	Mo, 24.11.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	1 Tag	1 Tag
1.11.5	Rückbau Grünfläche	Mo, 01.12.25	Di, 02.12.25	Verkehrswegebau	2 Tage	2 Tage
1.11.6	Herstellen Pflasterfläche	Mi, 03.12.25	Fr, 05.12.25	Verkehrswegebau	3 Tage	3 Tage
1.11.7	Außenverteiler errichten, Kabel ziehen	Mi, 03.12.25	Fr, 05.12.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	3 Tage	3 Tage
1.11.8	Montage Säulen und Schranken	Mo, 08.12.25	Mo, 08.12.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	1 Tag	1 Tag
1.11.9	Umbau Kassenautomat	Di, 09.12.25	Di, 09.12.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	1 Tag	1 Tag
1.11.10	Inbetriebnahme TA08	Mi, 10.12.25	Mi, 10.12.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	1 Tag	1 Tag
1.11.11	Baustellenräumung	Mi, 10.12.25	Mi, 10.12.25	Allgemein	1 Tag	1 Tag
1.11.12	Bauende TA08	Mi, 10.12.25	Mi, 10.12.25	Allgemein		
1.12	**Toranlage 22 - Parkplatz Haus 10**	**Mo, 17.11.25**	**Mi, 17.12.25**		**22 Tage**	**31 Tage**
1.12.1	Baubeginn TA22	Mo, 17.11.25	Mo, 17.11.25	Allgemein		
1.12.2	Baustelleneinrichtung	Mo, 17.11.25	Mo, 17.11.25	Allgemein	1 Tag	1 Tag
1.12.3	Umbau Unterverteilung Haus 18	Di, 18.11.25	Do, 20.11.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	2 Tage	3 Tage
1.12.4	Demontage Säulen und Schranken	Fr, 21.11.25	Fr, 21.11.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	1 Tag	1 Tag
1.12.5	Rückbau Verkehrswege/-inseln	Mo, 24.11.25	Di, 25.11.25	Verkehrswegebau	2 Tage	2 Tage
1.12.6	Herstellen/Verfüllen Leitungsgräben (Leerrohre)	Mi, 26.11.25	Fr, 28.11.25	Verkehrswegebau	3 Tage	3 Tage
1.12.7	Wiederherstellen Verkehrswege/-inseln	Mo, 01.12.25	Fr, 12.12.25	Verkehrswegebau	10 Tage	12 Tage
1.12.8	Außenverteiler umbauen	Do, 11.12.25	Fr, 12.12.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	2 Tage	2 Tage
1.12.9	Montage Säulen und Schranken	Mo, 15.12.25	Mo, 15.12.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	1 Tag	1 Tag
1.12.10	Umbau Kassenautomat	Di, 16.12.25	Di, 16.12.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	1 Tag	1 Tag
1.12.11	Inbetriebnahme TA22	Mi, 17.12.25	Mi, 17.12.25	Elektrotechnik + Schrankenmontage	1 Tag	1 Tag
1.12.12	Baustellenräumung	Mi, 17.12.25	Mi, 17.12.25	Allgemein	1 Tag	1 Tag
1.12.13	Bauende TA22	Mi, 17.12.25	Mi, 17.12.25	Allgemein		

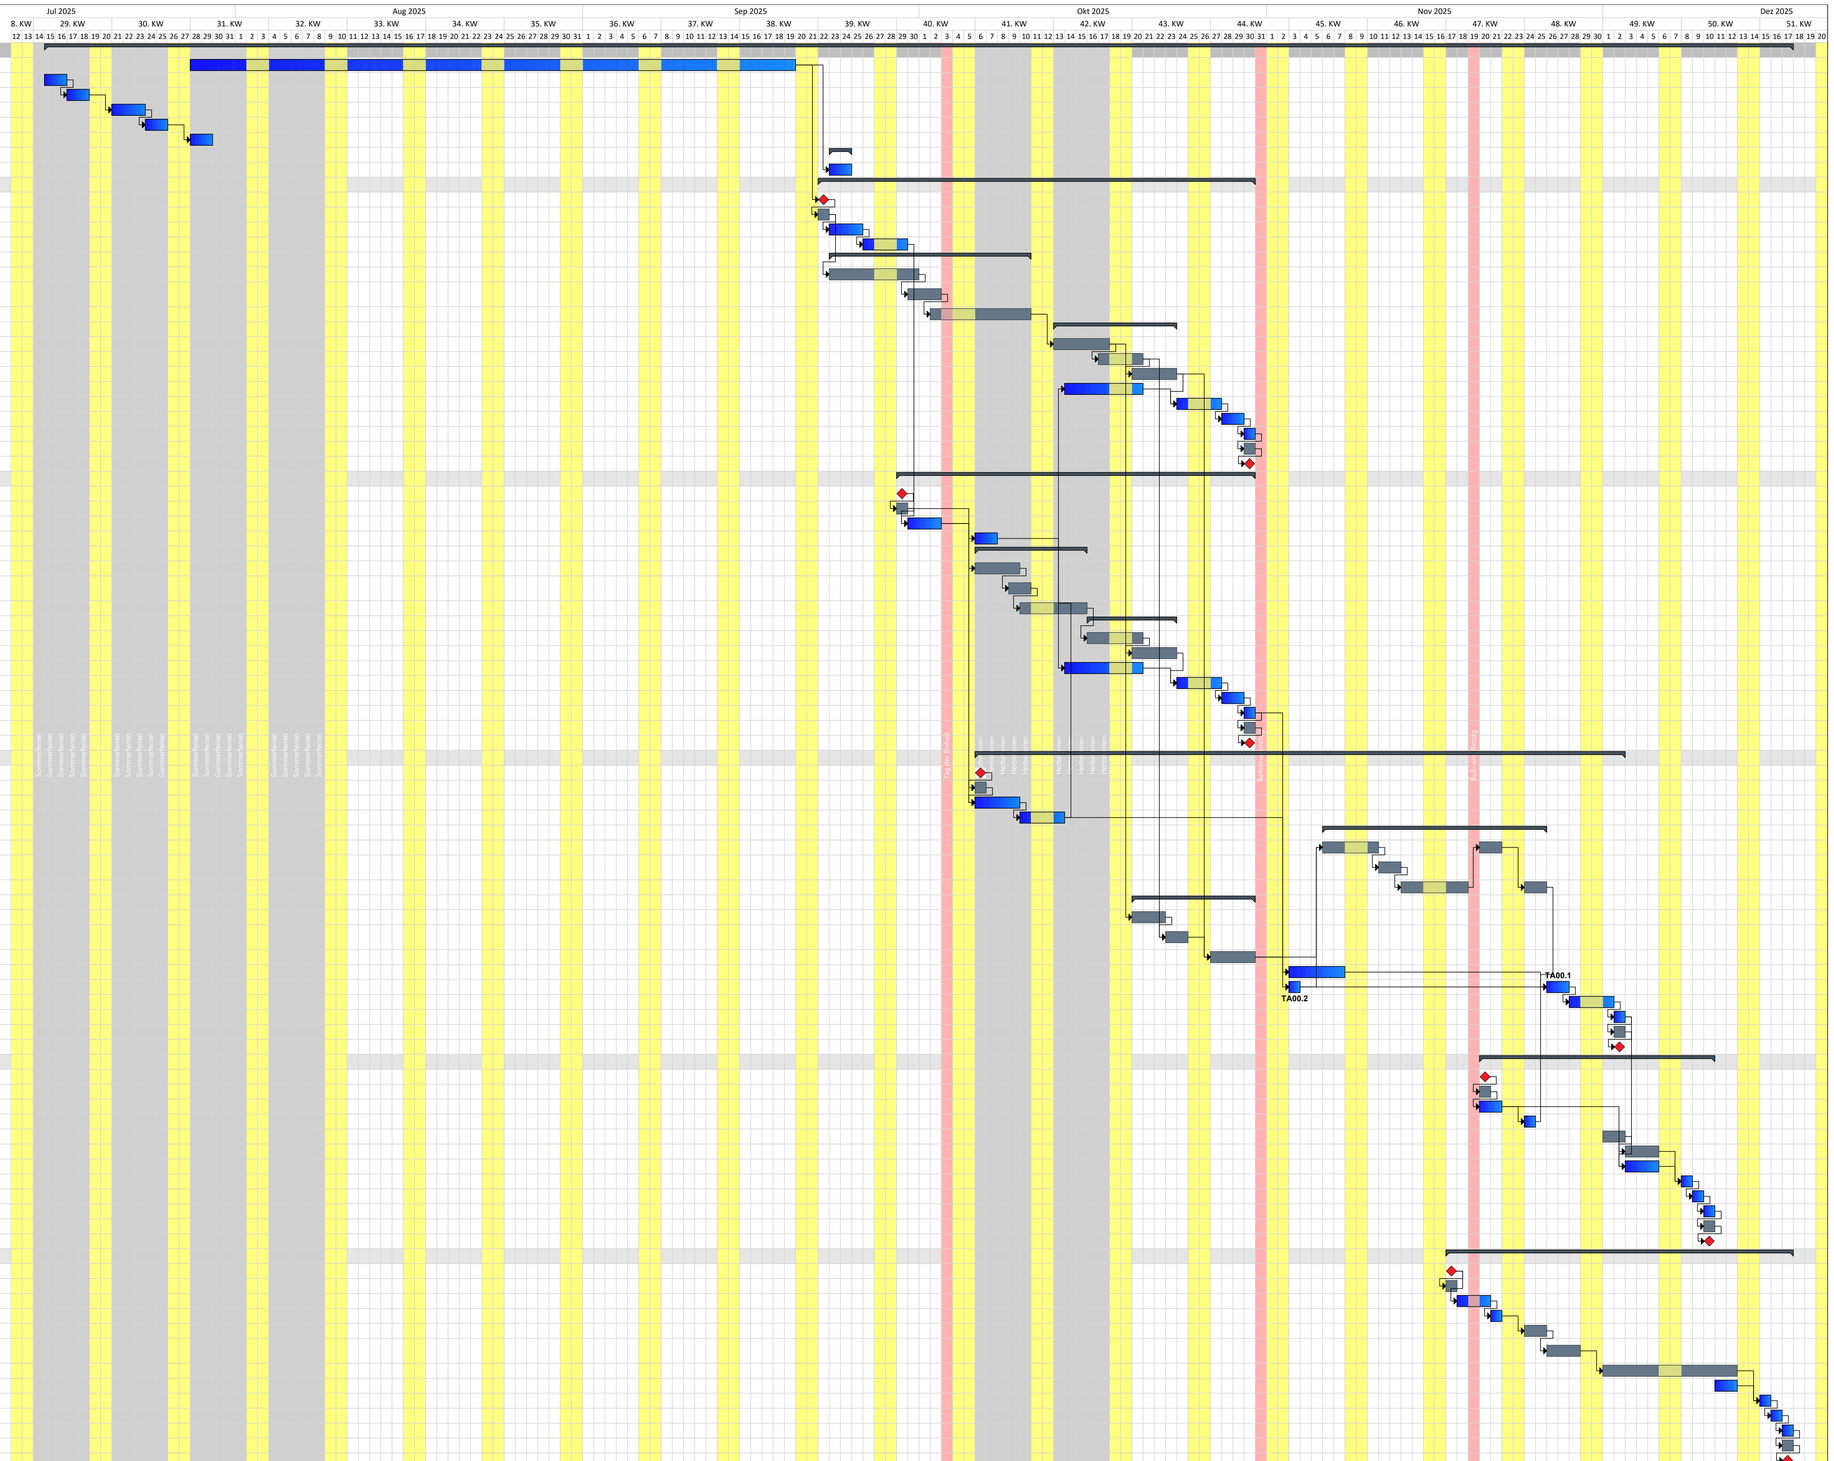

Legende	Farben	
Sammelvorgang	Elektrotechnik + Schrankenmontage	**Projekt:** Umbau Toranlagen 1. BA
Vorgang SOLL	Verkehrswegebau	**Bearbeiter:**
Meilenstein		**Datum:** 27.05.2025
Verknüpfung		
