Prowa Ingenieure Dresden GmbH
Zentrale Kläranlage Rodewitz
Ersatzneubau Faulbehälter und Peripherie
1. BA: Erneuerung Gasbehälter und Gasfackel

Ausführungsplanung
Anlage 4
Grobablaufplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
1	Baubeginn	0 Tage	Di 17.06.25	Di 17.06.25
2	Werkplanung	30 Tage	Di 17.06.25	Mo 28.07.25
3	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Di 17.06.25	Mo 23.06.25
4	Ausschachtung und Rohrleitungsverlegung	20 Tage	Di 24.06.25	Mo 21.07.25
5	Herstellung Fundamente	30 Tage	Di 15.07.25	Mo 25.08.25
6	Montage Gasbehälter & Einhausung	30 Tage	Di 26.08.25	Mo 06.10.25
7	Montage Gasfackel	10 Tage	Di 26.08.25	Mo 08.09.25
8	Montage Kiesfilter & Verdichter	20 Tage	Di 07.10.25	Mo 03.11.25
9	Aufbau Elektroversorgung	20 Tage	Di 07.10.25	Mo 03.11.25
10	Einrichtung Steuerung	10 Tage	Di 04.11.25	Mo 17.11.25
11	Inbetriebnahme	10 Tage	Di 18.11.25	Mo 01.12.25
12	Außenanlagen	10 Tage	Di 04.11.25	Mo 17.11.25
13	Baustellenabschluss	10 Tage	Di 18.11.25	Mo 01.12.25
14	Fertigstellung	0 Tage	Mo 01.12.25	Mo 01.12.25

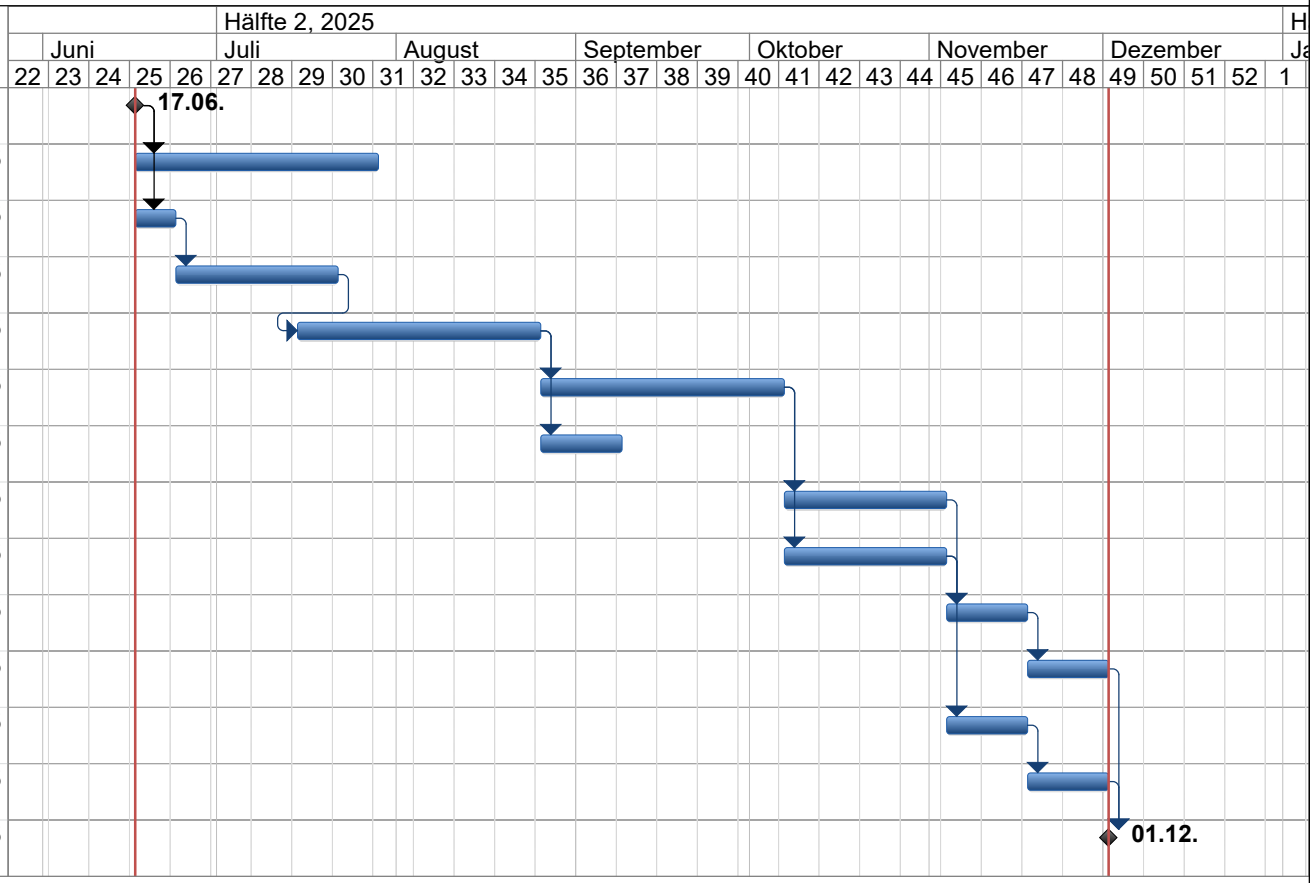

Projekt: Rodewitz BA1
Datum: Do 17.04.25

Vorgang — Meilenstein — Manueller Vorgang
