Baugrobablaufplan

Sanierung Fassade BSZ Annaberg-Buchholz - unter Vorbehalt Witterung -

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer
1	**Ausschreibungsverfahren**	**30 at**	**Mo, 07.07.25**	**Fr, 15.08.25**	**IBA / AG**
2	**Vergaben / Aufträge**	**1 at**	**Fr, 15.08.25**	**Fr, 15.08.25**	**IBA / AG**
3	**Bauvorbereitung**	**10 at**	**Mo, 18.08.25**	**Fr, 29.08.25**	**IBA**
4	**Los 1 - Bauarbeiten**	**30 at**	**Mo, 01.09.25**	**Fr, 10.10.25**	**Fa.**
5	Rückbau / Abbruch	10 at	Mo, 01.09.25	Fr, 12.09.25	
6	Sockel	10 at	Mo, 15.09.25	Fr, 26.09.25	
7	Traufsteifen / Asphalt	10 at	Mo, 29.09.25	Fr, 10.10.25	
8	Maurer / Putz	10 at	Mo, 29.09.25	Fr, 10.10.25	
9	**Los 2 - Gerüst**	**30 at**	**Mo, 13.10.25**	**Fr, 21.11.25**	**Fa.**
10	aufstellen	5 at	Mo, 13.10.25	Fr, 17.10.25	
11	vorhalten	20 at	Mo, 20.10.25	Fr, 14.11.25	
12	Abbau	5 at	Mo, 17.11.25	Fr, 21.11.25	
13	**Los 3 - Malerarbeiten**	**25 at**	**Mo, 20.10.25**	**Fr, 21.11.25**	**Fa.**
14	Fassade	25 at	Mo, 20.10.25	Fr, 21.11.25	
15					

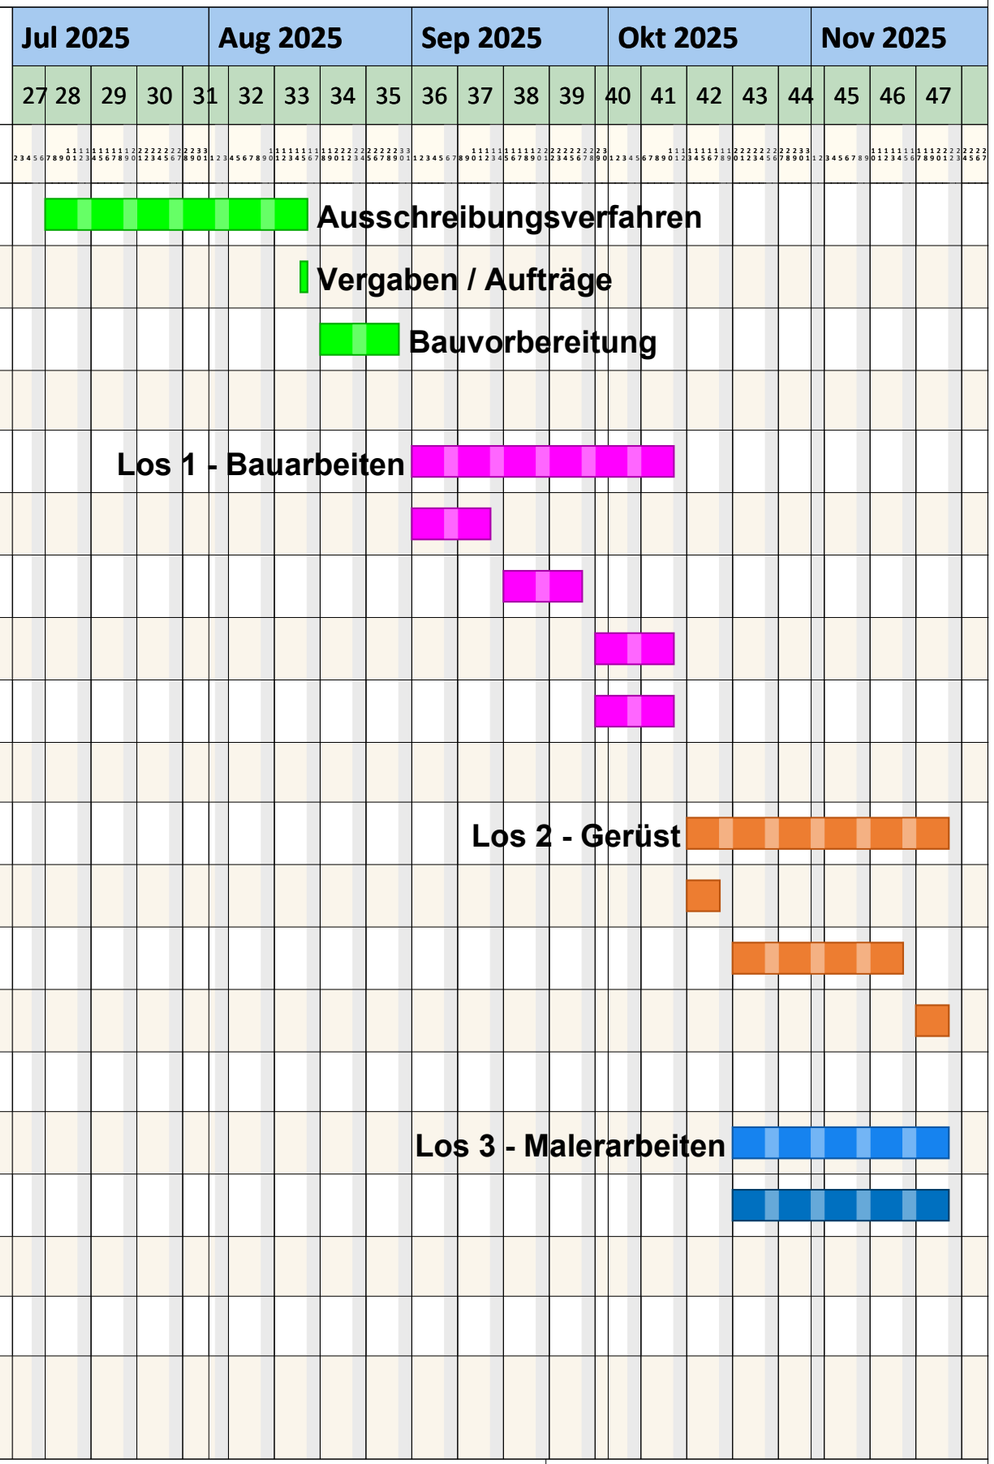

Projektzeitrahmen von Mo, 30.06.25 bis So, 30.11.25
Kalender: Sachsen (eingebettet)
Druckdatum: 15.07.2025 08:09
Filter:

erstellt mit pro-Plan 2025 (pro-Plan 2025) Serien Nr.: PPL25-D1A93C8700B4 Lizenz für Ingenieurbüro Hoch- und Tiefbau GmbH Annaberg, Seh
