

## Leistungsverzeichnis

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
<b>Los 1</b>	<p>Örtliche Bauüberwachung Verkehrsanlagen sowie Ingenieurbauwerke Versorgungsanl.</p> <p>Los 1 - Objektüberwachung (Bauüberwachung) für Freianlagen sowie Örtliche Bauüberwachung für Baustelleneinrichtung sowie Verkehrsführung während der Bauzeit und Verkehrsanlage Straße und Gleis (Straßenbahn) sowie Ingenieurbauwerke Versorgungsanlagen Tief- und Rohrbau</p> <p><b>CPV-Code:</b> 71200000-0</p>	<p><b>Menge:</b> 1 pauschal</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 pauschal</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>


## Wertungsschema

Im folgenden werden die Zuschlagskriterien für das Los 1 sowie deren Wichtung mitgeteilt.

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
<b>1</b>	<b>Projektorganisation</b>	<input type="text"/>	<b>40 %</b>
1.1	<p><b>Vorstellung zum Projektteam</b></p> <p><b>Fragetext:</b> Vorstellung zum Projektteam hinsichtlich - Darstellung Projektteam (für die Grund- und Besonderen Leistungen) - Vertretungsregelungen für Urlaub, Krankheit und vor dem Hintergrund der Nacht- und Schichtarbeit - Präsenz/Erreichbarkeit mit Bereitschafts- und Telefonliste</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.1 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>	<input type="text"/>	25 %
1.2	<b>Vorstellung zum Personaleinsatz</b>	<input type="text"/>	37,5 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p><b>Fragetext:</b> Vorstellung zum Personaleinsatz hinsichtlich - zeitlicher Personaleinsatzplan mit Zuordnung zu den einzelnen Leistungsbildern unter Berücksichtigung der Nacht- und Schichtarbeit</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.1 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 100px; width: 100%;"></div>	
1.3	<p><b>Darstellung der Koordination und Kommunikation</b></p> <p><b>Fragetext:</b> Darstellung der Koordination und Kommunikation - innerhalb des Projektteams - Zusammenarbeit mit anderen am Bau Beteiligten (BOL, Planer, Behörden, andere BÜ, Bauunternehmen, SiGeKo, ...) inkl. Darstellung der Entscheidungshierarchie</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.1 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 100px; width: 100%;"></div>	18,75 %
1.4	<p><b>Vorstellung der Struktur der Projektabwicklung</b></p> <p><b>Fragetext:</b> Vorstellung der Struktur der Projektabwicklung hinsichtlich - Arbeitsabläufen, Schriftverkehr und Dokumentation im Bauprozess</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.1 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 100px; width: 100%;"></div>	18,75 %
2	<b>Projektanalyse</b>		30 %
2.1	<p><b>Erfassen der Aufgaben- und Problemstellung und der Anforderungen an den Bau</b></p> <p><b>Fragetext:</b> Erfassen der Aufgaben- und</p>	<div style="background-color: yellow; height: 100px; width: 100%;"></div>	25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Problemstellung und der Anforderungen an den Bau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komplexität des Vorhabens (mehrere Bauabschnitte, Bauablauf)</li> <li>- Verkehrsführung während der Bauzeit</li> </ul> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.1 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>		
2.2	<p><b>Betrachtung des Ablaufs</b></p> <p><b>Fragetext:</b></p> <p>Betrachtung des Ablaufs hinsichtlich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- erhöhter Aufmerksamkeit bezüglich des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes</li> <li>- gewerkeübergreifender Zusammenarbeit und Nutzung von gemeinsamen Anlagen</li> <li>- kurzfristiger Anpassung von technologischen Bauabläufen</li> </ul> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.1 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 100%; width: 100%;"></div>	41,66 %
2.3	<p><b>Maßnahmen zur Terminverfolgung</b></p> <p><b>Fragetext:</b></p> <p>Maßnahmen zur Terminverfolgung und Umsetzung sowie Einhaltung der Terminvorgaben</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.1 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 100%; width: 100%;"></div>	33,34 %
3	<p><b>Vergütung</b></p>	<div style="border: 1px solid black; height: 100%; width: 100%;"></div>	30 %
3.1	<p><b>Preis</b></p> <p>Bewertet wird das Gesamthonorar aus allen "Grundleistungen"/Leistungen gemäß § 3 Absatz 1 HOAI) nachfolgend als "Honorar für Grundleistungen" bezeichnet, allen Besonderen Leistungen (alle Leistungen gemäß § 3 Absatz 2 HOAI) und der Summe aller Nebenkosten (§ 14 HOAI). Bei der Wertung wird ggf. § 60 VgV herangezogen.</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 100%; width: 100%;"></div>	83,33 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Die Inhalte sind der Anlage 2.1 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.		
3.2	<p><b>Stundensätze</b> Bewertet werden die Stundensätze, welche im § 6 Absatz 3 des Vertragsentwurfes vereinbart werden sollen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) für den örtlichen Bauüberwacher/ stellv. örtlichen Bauüberwacher</li> <li>2) für den Objektüberwacher (Bauüberwacher) Freianlagen</li> <li>3) für Mitarbeiter (Diplomingenieur, Master)</li> <li>4) für techn./wissenschaftl. Mitarbeiter (z.B. Bachelor, Techniker)</li> <li>5) für techn. Zeichner u. sonstige Mitarbeiter</li> </ol> <p>Bei der Wertung wird ggf. § 60 VgV herangezogen.</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.1 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>		16,67 %





Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
<b>Los 2</b>	<p>Örtliche Bauüberwachung Ingenieurbauwerk Brücke (B00015) sowie Bahntechnik</p> <p>Los 2 - Örtliche Bauüberwachung Ingenieurbauwerk Brücke (B00015) sowie Rückbau Rohrbrücke und Örtliche Bauüberwachung für Bahntechnik</p> <p><b>CPV-Code:</b> 71200000-0</p>	<p><b>Menge:</b> 1 pauschal</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 pauschal</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

## Wertungsschema

Im folgenden werden die Zuschlagskriterien für das Los 2 sowie deren Wichtung mitgeteilt.

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
<b>1</b>	<b>Projektorganisation</b>	<input type="text"/>	<b>40 %</b>
1.1	<p><b>Vorstellung zum Projektteam</b></p> <p><b>Fragetext:</b> Vorstellung zum Projektteam hinsichtlich - Darstellung Projektteam (für die Besonderen Leistungen) - Vertretungsregelungen für Urlaub, Krankheit und vor dem Hintergrund der Nacht- und Schichtarbeit - Präsenz/Erreichbarkeit mit Bereitschafts- und Telefonliste</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.2 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>	<input type="text"/>	25 %
1.2	<p><b>Vorstellung zum Personaleinsatz</b></p> <p><b>Fragetext:</b> Vorstellung zum Personaleinsatz hinsichtlich - zeitlicher Personaleinsatzplan mit Zuordnung zu den einzelnen Leistungsbildern unter Berücksichtigung der Nacht- und Schichtarbeit</p>	<input type="text"/>	37,5 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Die Inhalte sind der Anlage 2.2 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.		
1.3	<p><b>Darstellung der Koordination und Kommunikation</b></p> <p><b>Fragetext:</b> Darstellung der Koordination und Kommunikation - innerhalb des Projektteams - Zusammenarbeit mit anderen am Bau Beteiligten (BOL, Planer, Behörden, andere BÜ, Bauunternehmen, SiGeKo, ...) inkl. Darstellung der Entscheidungshierarchie</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.2 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	18,75 %
1.4	<p><b>Vorstellung der Struktur der Projektabwicklung</b></p> <p><b>Fragetext:</b> Vorstellung der Struktur der Projektabwicklung hinsichtlich - Arbeitsabläufen, Schriftverkehr und Dokumentation im Bauprozess</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.2 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	18,75 %
2	<b>Projektanalyse</b>	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></div>	30 %
2.1	<p><b>Erfassen der Aufgaben- und Problemstellung und der Anforderungen an den Bau</b></p> <p><b>Fragetext:</b> Erfassen der Aufgaben- und Problemstellung und der Anforderungen an den Bau - Herstellung Brückenbauwerk unter Beachtung der besonderen Anforderungen des laufenden Bahnbetriebs, - Bauablauf Neubau B0015 maßgeblich für Gesamtbauablauf</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.2 -</p>	<div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.		
2.2	<p><b>Betrachtung des Ablaufs</b></p> <p><b>Fragetext:</b></p> <p>Betrachtung des Ablaufs hinsichtlich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- erhöhter Aufmerksamkeit bezüglich des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes</li> <li>- gewerkeübergreifender Zusammenarbeit und Nutzung von gemeinsamen Anlagen</li> <li>- kurzfristiger Anpassung von technologischen Bauabläufen</li> </ul> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.2 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>		41,66 %
2.3	<p><b>Maßnahmen zur Terminverfolgung</b></p> <p><b>Fragetext:</b></p> <p>Maßnahmen zur Terminverfolgung und Umsetzung sowie Einhaltung der Terminvorgaben</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.2 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>		33,34 %
3	<b>Vergütung</b>		30 %
3.1	<p><b>Preis</b></p> <p>Bewertet wird das Gesamthonorar aus allen Besonderen Leistungen (alle Leistungen gemäß § 3 Absatz 2 HOAI) und der Summe aller Nebenkosten (§ 14 HOAI). Bei der Wertung wird ggf. § 60 VgV herangezogen.</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.2 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>		83,33 %
3.2	<p><b>Stundensätze</b></p> <p>Bewertet werden die Stundensätze, welche im § 6 Absatz 3 des Vertragsentwurfes vereinbart werden sollen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) für den örtlichen Bauüberwacher/ stellv. örtlichen Bauüberwacher</li> <li>2) für den Objektüberwacher</li> </ul>		16,67 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>(Bauüberwacher) Technische Ausrüstung</p> <p>3) für Mitarbeiter (Diplomingenieur, Master)</p> <p>4) für techn./wissenschaftl. Mitarbeiter (z.B. Bachelor, Techniker)</p> <p>5) für techn. Zeichner u. sonstige Mitarbeiter</p> <p>Bei der Wertung wird ggf. § 60 VgV herangezogen.</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.2 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
<b>Los 3</b>	Örtliche Bauüberwachung Ingenieurbauwerke Sonstige Bauwerke  Los 3 - Örtliche Bauüberwachung Ingenieurbauwerke Sonstige Bauwerke  <b>CPV-Code:</b> 71200000-0	<b>Menge:</b> 1 pauschal  <b>Preiseinheit:</b> 1 pauschal  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

## Wertungsschema

Im folgenden werden die Zuschlagskriterien für das Los 3 sowie deren Wichtung mitgeteilt.

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
<b>1</b>	<b>Projektorganisation</b>	<input type="text"/>	<b>40 %</b>
1.1	<b>Vorstellung zum Projektteam</b>  <b>Fragetext:</b> Vorstellung zum Projektteam hinsichtlich - Darstellung Projektteam (für die Besonderen Leistungen) - Vertretungsregelungen für Urlaub, Krankheit und vor dem Hintergrund der Nacht- und Schichtarbeit - Präsenz/Erreichbarkeit mit Bereitschafts- und Telefonliste  Die Inhalte sind der Anlage 2.3 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	25 %
1.2	<b>Vorstellung zum Personaleinsatz</b>  <b>Fragetext:</b> Vorstellung zum Personaleinsatz hinsichtlich - zeitlicher Personaleinsatzplan mit Zuordnung zu den einzelnen Leistungsbildern unter Berücksichtigung der Nacht- und Schichtarbeit  Die Inhalte sind der Anlage 2.3 - Bewertungsmatrix der	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	37,5 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Zuschlagskriterien zu entnehmen.		
1.3	<p><b>Darstellung der Koordination und Kommunikation</b></p> <p><b>Fragetext:</b></p> <p>Darstellung der Koordination und Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- innerhalb des Projektteams</li> <li>- Zusammenarbeit mit anderen am Bau Beteiligten (BOL, Planer, Behörden, andere BÜ, Bauunternehmen, SiGeKo, ...) inkl. Darstellung der Entscheidungshierarchie</li> </ul> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.3 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div>	18,75 %
1.4	<p><b>Vorstellung der Struktur der Projektabwicklung</b></p> <p><b>Fragetext:</b></p> <p>Vorstellung der Struktur der Projektabwicklung hinsichtlich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeitsabläufen, Schriftverkehr und Dokumentation im Bauprozess</li> </ul> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.3 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div>	18,75 %
<b>2</b>	<b>Projektanalyse</b>		<b>30 %</b>
2.1	<p><b>Erfassen der Aufgaben- und Problemstellung und der Anforderungen an den Bau</b></p> <p><b>Fragetext:</b></p> <p>Erfassen der Aufgaben- und Problemstellung und der Anforderungen an den Bau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komplexität des Vorhabens (mehrere Bauabschnitte, alle Brückenbauwerke gleichzeitig, Bauablauf der angrenzenden Ingenieurbauwerke in Abhängigkeit von Neubau DB Brücke)</li> <li>- Verkehrsführung während der Bauzeit</li> </ul> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.3 - Bewertungsmatrix der</p>	<div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div>	25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Zuschlagskriterien zu entnehmen.		
2.2	<p><b>Betrachtung des Ablaufs</b></p> <p><b>Fragetext:</b></p> <p>Betrachtung des Ablaufs hinsichtlich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- erhöhter Aufmerksamkeit bezüglich des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes</li> <li>- gewerkeübergreifender Zusammenarbeit und Nutzung von gemeinsamen Anlagen</li> <li>- kurzfristiger Anpassung von technologischen Bauabläufen</li> </ul> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.3 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>		41,66 %
2.3	<p><b>Maßnahmen zur Terminverfolgung</b></p> <p><b>Fragetext:</b></p> <p>Maßnahmen zur Terminverfolgung und Umsetzung sowie Einhaltung der Terminvorgaben</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.3 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>		33,34 %
3	<b>Vergütung</b>		<b>30 %</b>
3.1	<p><b>Preis</b></p> <p>Bewertet wird das Gesamthonorar aus allen Besonderen Leistungen (alle Leistungen gemäß § 3 Absatz 2 HOAI) und der Summe aller Nebenkosten (§ 14 HOAI). Bei der Wertung wird ggf. § 60 VgV herangezogen.</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.3 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>		83,33 %
3.2	<p><b>Stundensätze</b></p> <p>Bewertet werden die Stundensätze, welche im § 6 Absatz 3 des Vertragsentwurfes vereinbart werden sollen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) für den örtlichen Bauüberwacher/ stellv. örtlichen Bauüberwacher</li> <li>2) für Mitarbeiter (Diplomingenieur, Master)</li> </ol>		16,67 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>3) für techn./wissenschaftl. Mitarbeiter (z.B. Bachelor, Techniker) 4) für techn. Zeichner u. sonstige Mitarbeiter</p> <p>Bei der Wertung wird ggf. § 60 VgV herangezogen.</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.3 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
<b>Los 4</b>	Objektüberwachung (Bauüberwachung) Technische Ausrüstung  Los 4 - Objektüberwachung (Bauüberwachung) Technische Ausrüstung  <b>CPV-Code:</b> 71200000-0	<b>Menge:</b> 1 pauschal  <b>Preiseinheit:</b> 1 pauschal  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

## Wertungsschema

Im folgenden werden die Zuschlagskriterien für das Los 4 sowie deren Wichtung mitgeteilt.

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
<b>1</b>	<b>Projektorganisation</b>	<input type="text"/>	<b>40 %</b>
1.1	<b>Vorstellung zum Projektteam</b>  <b>Fragetext:</b> Vorstellung zum Projektteam hinsichtlich - Darstellung Projektteam (für die Grund- und Besonderen Leistungen) - Vertretungsregelungen für Urlaub, Krankheit und vor dem Hintergrund der Nacht- und Schichtarbeit - Präsenz/Erreichbarkeit mit Bereitschafts- und Telefonliste  Die Inhalte sind der Anlage 2.4 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	18,75 %
1.2	<b>Vorstellung zum Personaleinsatz</b>  <b>Fragetext:</b> Vorstellung zum Personaleinsatz hinsichtlich - zeitlicher Personaleinsatzplan mit Zuordnung zu den einzelnen Leistungsbildern unter Berücksichtigung der Nacht- und Schichtarbeit  Die Inhalte sind der Anlage 2.4 - Bewertungsmatrix der	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	31,25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Zuschlagskriterien zu entnehmen.		
1.3	<p><b>Darstellung der Koordination und Kommunikation</b></p> <p><b>Fragetext:</b> Darstellung der Koordination und Kommunikation - innerhalb des Projektteams - Zusammenarbeit mit anderen am Bau Beteiligten (BOL, Planer, Behörden, andere BÜ, Bauunternehmen, SiGeKo, ...) inkl. Darstellung der Entscheidungshierarchie</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.4 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	31,25 %
1.4	<p><b>Vorstellung der Struktur der Projektabwicklung</b></p> <p><b>Fragetext:</b> Vorstellung der Struktur der Projektabwicklung hinsichtlich - Arbeitsabläufen, Schriftverkehr und Dokumentation im Bauprozess</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.4 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	18,75 %
<b>2</b>	<b>Projektanalyse</b>	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 30px;"></div>	<b>30 %</b>
2.1	<p><b>Erfassen der Aufgaben- und Problemstellung und der Anforderungen an den Bau</b></p> <p><b>Fragetext:</b> Erfassen der Aufgaben- und Problemstellung und der Anforderungen an den Bau - Komplexität des Vorhabens (mehrere Bauabschnitte) - Fahrleitungsanlage - Verkehrsführung während der Bauzeit</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.4 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	33,33 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
2.2	<p><b>Betrachtung des Ablaufs</b></p> <p><b>Fragetext:</b></p> <p>Betrachtung des Ablaufs hinsichtlich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- erhöhter Aufmerksamkeit bezüglich des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes</li> <li>- gewerkeübergreifender Zusammenarbeit und Nutzung von gemeinsamen Anlagen</li> <li>- kurzfristiger Anpassung von technologischen Bauabläufen</li> </ul> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.4 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	33,33 %
2.3	<p><b>Maßnahmen zur Terminverfolgung</b></p> <p><b>Fragetext:</b></p> <p>Maßnahmen zur Terminverfolgung und Umsetzung sowie Einhaltung der Terminvorgaben</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.4 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	33,34 %
3	<p><b>Vergütung</b></p>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	30 %
3.1	<p><b>Preis</b></p> <p>Bewertet wird das Gesamthonorar aus allen "Grundleistungen"/Leistungen gemäß § 3 Absatz 1 HOAI) nachfolgend als "Honorar für Grundleistungen" bezeichnet, allen Besonderen Leistungen (alle Leistungen gemäß § 3 Absatz 2 HOAI) und der Summe aller Nebenkosten (§ 14 HOAI). Bei der Wertung wird ggf. § 60 VgV herangezogen.</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.4 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 205px; width: 100%;"></div>	83,33 %
3.2	<p><b>Stundensätze</b></p> <p>Bewertet werden die Stundensätze, welche im § 6 Absatz 3 des Vertragsentwurfes vereinbart werden sollen:</p> <p>1) für den Objektüberwacher (Bauüberwacher) Technische</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 90px; width: 100%;"></div>	16,67 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Ausrüstung 2) für Mitarbeiter (Diplomingenieur, Master) 3) für techn./wissenschaftl. Mitarbeiter (z.B. Bachelor, Techniker) 4) für techn. Zeichner u. sonstige Mitarbeiter</p> <p>Bei der Wertung wird ggf. § 60 VgV herangezogen.</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.4 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>		

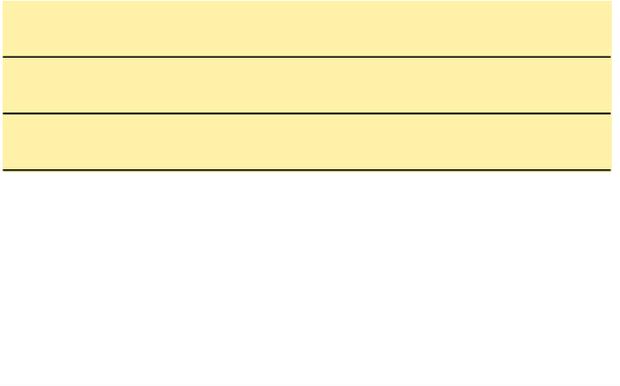


Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
<b>Los 5</b>	Koordination Kampfmittelfreiheit sowie Koordination des unterirdischen Bauraums  Los 5 - Koordination Kampfmittelfreiheit sowie Koordination des unterirdischen Bauraums  <b>CPV-Code:</b> 71200000-0	<b>Menge:</b> 1 pauschal  <b>Preiseinheit:</b> 1 pauschal  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

## Wertungsschema

Im folgenden werden die Zuschlagskriterien für das Los 5 sowie deren Wichtung mitgeteilt.

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
<b>1</b>	<b>Projektorganisation</b>	<input type="text"/>	<b>40 %</b>
1.1	<b>Vorstellung zum Projektteam</b>  <b>Fragetext:</b> Vorstellung zum Projektteam hinsichtlich - Darstellung Projektteam (für die Besonderen Leistungen) - Vertretungsregelungen für Urlaub, Krankheit - Präsenz/Erreichbarkeit mit Bereitschafts- und Telefonliste  Die Inhalte sind der Anlage 2.5 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	25 %
1.2	<b>Vorstellung zum Personaleinsatz</b>  <b>Fragetext:</b> Vorstellung zum Personaleinsatz hinsichtlich - zeitlicher Personaleinsatzplan mit Zuordnung zu den einzelnen Leistungsbildern unter Berücksichtigung der Nacht- und Schichtarbeit  Die Inhalte sind der Anlage 2.5 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	37,5 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1.3	<p><b>Darstellung der Koordination und Kommunikation</b></p> <p><b>Fragetext:</b></p> <p>Darstellung der Koordination und Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- innerhalb des Projektteams</li> <li>- Zusammenarbeit mit anderen am Bau Beteiligten (BOL, Planer, Behörden, andere BÜ, Bauunternehmen, SiGeKo, ...) inkl. Darstellung der Entscheidungshierarchie</li> </ul> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.5 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	18,75 %
1.4	<p><b>Vorstellung der Struktur der Projektabwicklung</b></p> <p><b>Fragetext:</b></p> <p>Vorstellung der Struktur der Projektabwicklung hinsichtlich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeitsabläufen, Schriftverkehr und Dokumentation im Bauprozess</li> </ul> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.5 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	18,75 %
2	<b>Projektanalyse</b>		30 %
2.1	<p><b>Erfassen der Aufgaben- und Problemstellung und der Anforderungen an Koord.</b></p> <p><b>Fragetext:</b></p> <p>Erfassen der Aufgaben- und Problemstellung und der Anforderungen an die Koordinierungsaufgaben hinsichtlich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- erforderliche Sondierungsaufgaben in Abhängigkeit des Bauablaufplanes</li> <li>- Umgang mit Kampfmittelfunden und Auswirkung auf die Bauzeit</li> <li>- Komplexität des Vorhabens hinsichtlich des unterirdischen Bauraums</li> <li>- unbekannte Medien und</li> <li>- eingeschränkter Platzbedarf</li> </ul> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.5 -</p>	<div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	50 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.		
2.2	<p><b>Betrachtung des Ablaufs</b></p> <p><b>Fragetext:</b></p> <p>Betrachtung des Ablaufs hinsichtlich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation Terminverfolgung/ Einhaltung,</li> <li>- Umgang mit gestörtem Bauablauf,</li> <li>- Maßnahmen zur Dokumentation</li> </ul> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.5 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>		50 %
3	<b>Vergütung</b>		30 %
3.1	<p><b>Preis</b></p> <p>Bewertet wird das Gesamthonorar aus allen Besonderen Leistungen (alle Leistungen gemäß § 3 Absatz 2 HOAI) und der Summe aller Nebenkosten (§ 14 HOAI). Bei der Wertung wird ggf. § 60 VgV herangezogen.</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.5 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>		83,33 %
3.2	<p><b>Stundensätze</b></p> <p>Bewertet werden die Stundensätze, welche im § 6 Absatz 3 des Vertragsentwurfes vereinbart werden sollen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) für den Koordinator Kampfmittelfreiheit</li> <li>2) für den Koordinator unterirdischer Bauraum</li> <li>3) für Mitarbeiter (Diplomingenieur, Master)</li> <li>4) für techn./wissenschaftl. Mitarbeiter (z.B. Bachelor, Techniker)</li> <li>5) für techn. Zeichner u. sonstige Mitarbeiter</li> </ol> <p>Bei der Wertung wird ggf. § 60 VgV herangezogen.</p> <p>Die Inhalte sind der Anlage 2.5 - Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien zu entnehmen.</p>		16,67 %

## Angebot

Los	Kurzbezeichnung	Nettosumme (EUR)	Bruttosumme (EUR)
1	Örtliche Bauüberwachung Verkehrsanlagen sowie Ingenieurbauwerke Versorgungsanl.		
2	Örtliche Bauüberwachung Ingenieurbauwerk Brücke (B00015) sowie Bahntechnik		
3	Örtliche Bauüberwachung Ingenieurbauwerke Sonstige Bauwerke		
4	Objektüberwachung (Bauüberwachung) Technische Ausrüstung		
5	Koordination Kampfmittelfreiheit sowie Koordination des unterirdischen Bauraums		

<b>Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.</b>	<b>Gesamtangebotssumme ohne USt. (EUR):</b>	<input type="text"/>
	<b>Gesamtangebotssumme inkl. USt. (EUR):</b>	<input type="text"/>
